
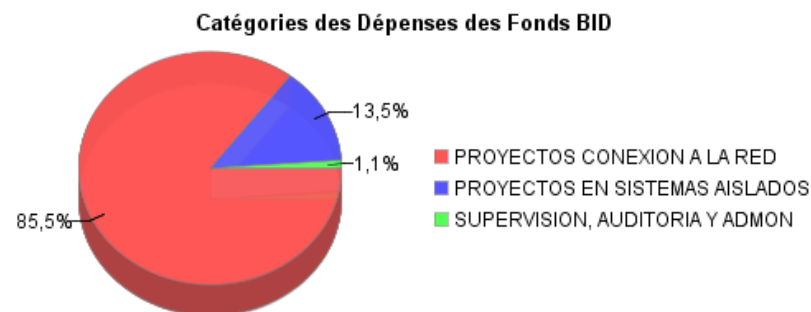
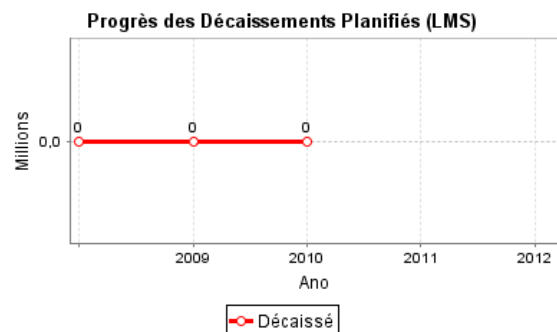



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION		
Secteur:	ENERGY-RURAL ELECTRIFICATION		
Numéro(s) de Prêt(s):	2033/OC-GU	Montant Courant Approuvé: 55.000.000,00	Initial BID: 55.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	Courant BID: 55.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	Pari Passu:
Opération(s) Connexe(s):	GU-P1043, GU-T1120	Solde: 55.000.000,00	Cofinancement/Pays: 150.000,00
Sous-Type de l'Opération:	PFM - Multi-Phase Lending Project		Estimation Initiale: 55.150.000,00
			Période d'Amortissement (mois): 234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Apr 14, 2011 Validé par le Représentant: Apr 14, 2011

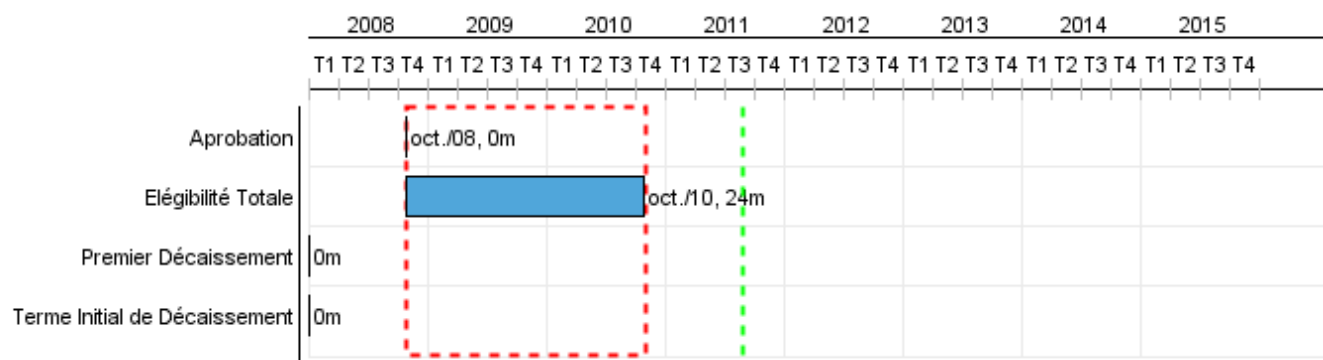

Progrès Cumulé à 2010

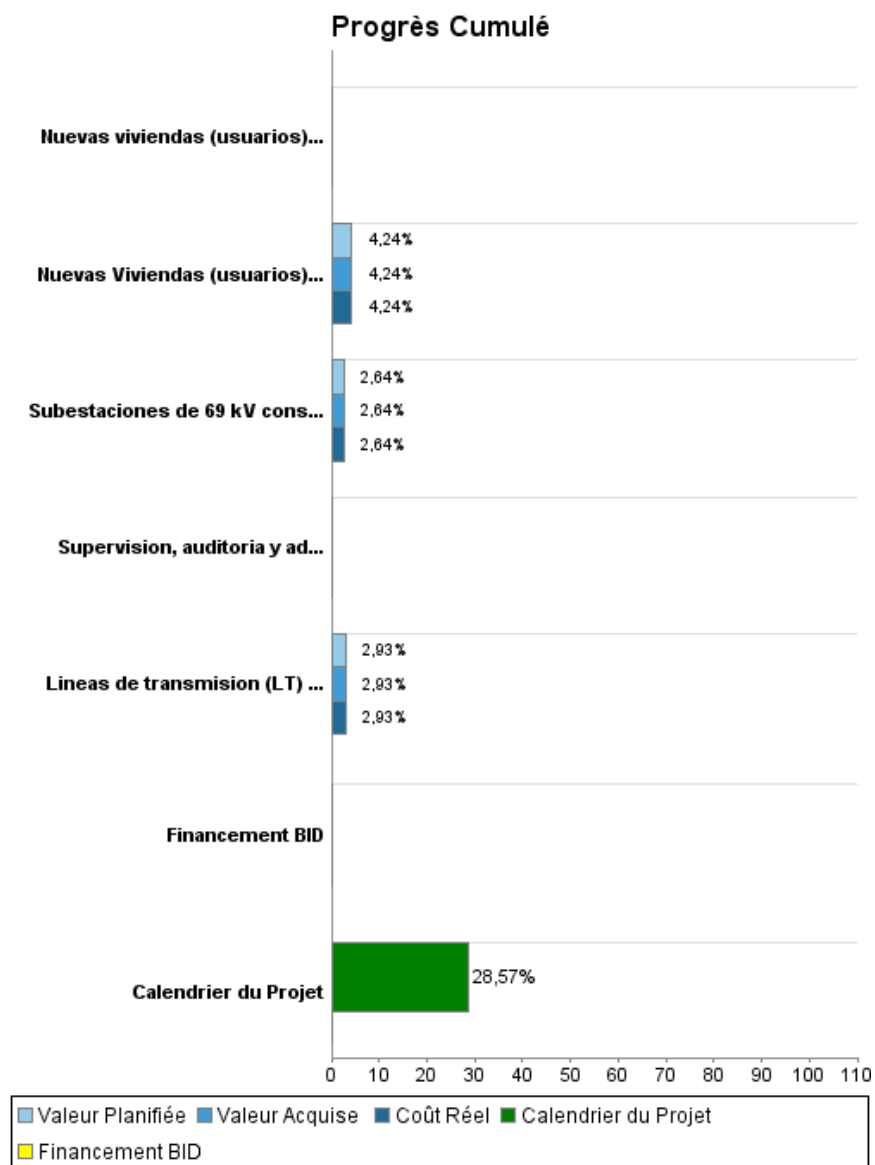

Résultats

Résultat:	Cobertura del servicio eléctrico en las comunidades rurales ampliada
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2015	Fin du Projet
Cobertura de electrificación rural a nivel nacional	Porcentaje	82,60	2007	P A		85,90
Cobertura de electrificación en los municipios más pobres priorizados.	Porcentaje	66,10	2007	P A		73,90

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente 1 - Electrificación rural mediante conexión a la red eléctrica.									
Nuevas Viviendas (usuarios) electrificadas mediante conexión a la red nacional	Kilómetros		125,00		29.152,00	991.727,00	991.727,00		23.400.000,00
Lineas de transmisión (LT) del PER, construidas	Kilómetros				175,00	451.202,00	451.202,00		15.400.000,00
Subestaciones de 69 kV construidas	Kilómetros				6,00	216.349,00	216.349,00		8.200.000,00
Componente 2 - Electrificación rural en sistemas aislados.									
Nuevas viviendas (usuarios) electrificadas en zonas aisladas	viviendas				5.000,00				7.400.000,00
Componente 3 - Apoyo a la administración del Programa y supervisión.									
Supervision, auditoria y administracion	n.a								750.000,00
TOTAL						1.659.278,00	1.659.278,00		55.150.000,00
