

Relatório Resumido

Dados Gerais

Executor:	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Sector:	ENERGY-NEW POWER DISTRIBUTION & TRANSMISSION PROJECTS
Número da Operação:	2016/BL-HO
Estágio:	Approved
Tipo Operação:	INV - Investimento
Operação Relacionada:	HO-P1010, HO-T1095, HO-L1039
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation

Fundos Disponíveis (US\$)

Atual:	28.550.000,00
Desembolsado:	23.201.467,27
% Desembolsado:	81,27
Saldo:	5.348.532,73

Custo Total e Fonte

Original BID:	28.550.000,00
Corrente BID:	28.550.000,00
Pari-passu:	91,00
Cofinanciamento/País:	2.760.000,00
Original Estimado:	31.310.000,00
Período de Amortização (meses):	282

Categoria do impacto social




Categoria do impacto social:

Reformulação


B () Os objetivos do projeto foram reformulados?

Validação

Validado pelo Chefe de Divisão: 09-abr-2013
Validado pelo Representante do País: 16-abr-2013

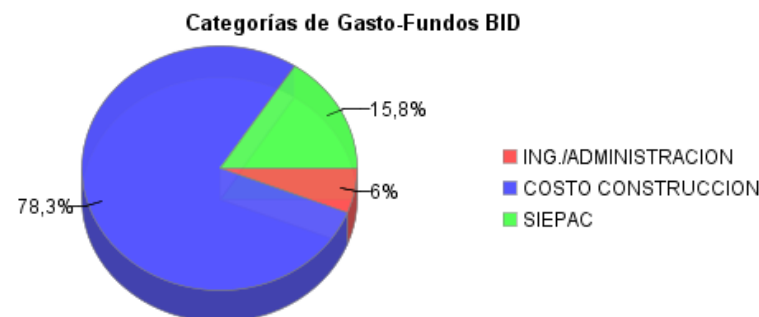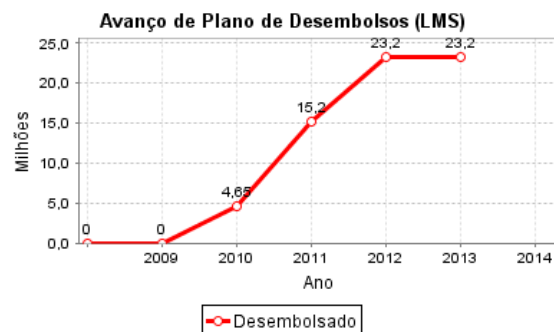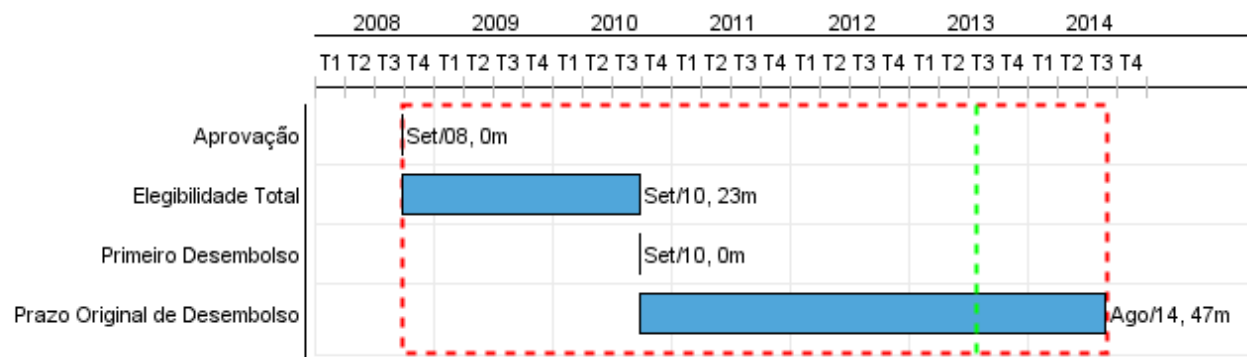

Progresso Acumulado até 2012

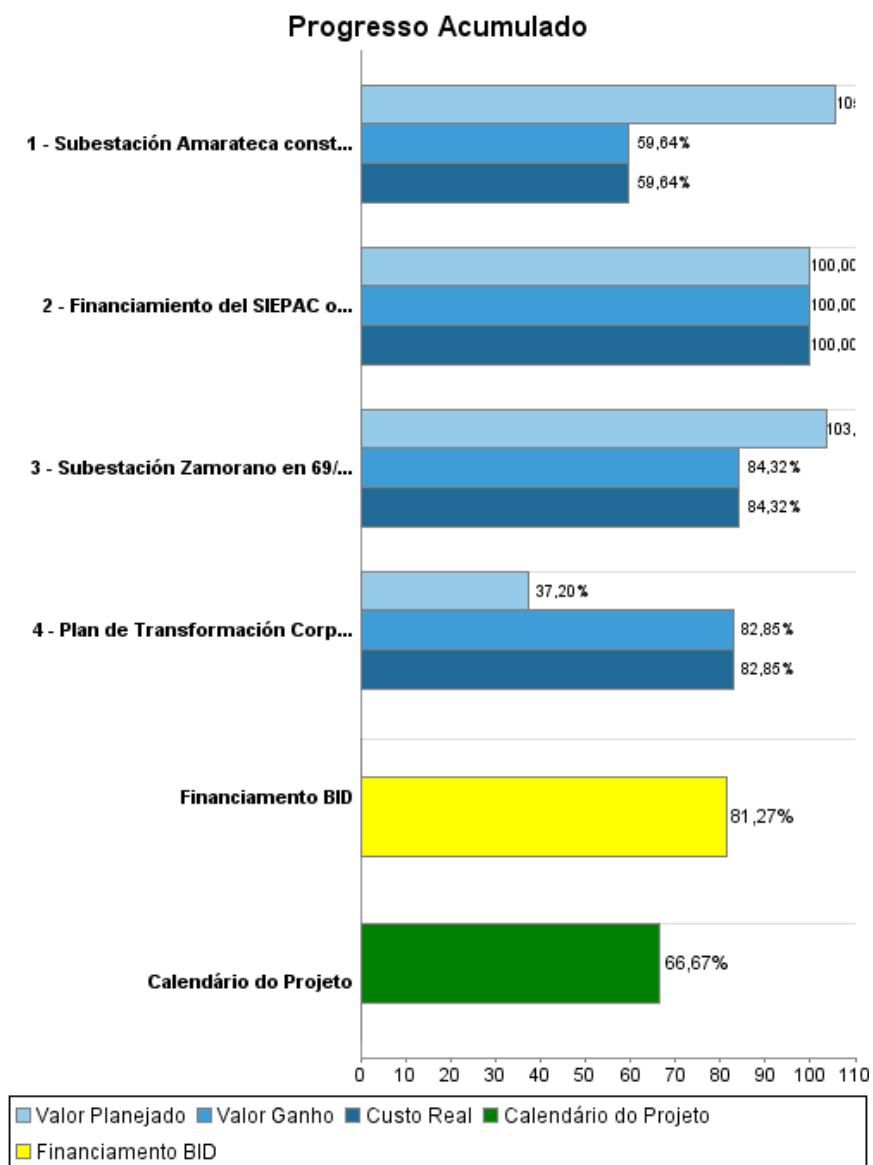

Resultados

Resultado:	Incremento de la energía servida en las zonas de influencia de los proyectos
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Electricidad suministrada al nivel de 138 kv por los refuerzos en Amarateca	MW		2007	P A	132,10
Electricidad suministrada al nivel de 69 kv por la Subestación del Zamorano	MW	6,40	2007	P A	8,40

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente 1. Inversiones en la red de transmisión eléctrica.									
Subestación Amarateca construida y en operación	Subestación				1,00	6.290.474,18	7.249.800,88		20.346.000,00
Subestación Zamorano en 69/34.5 kV con 30 MVA adicionales ampliada y en operación	Subestación				1,00	660.000,00	804.322,22		1.250.500,00
Asesoría, supervisión de obras y Regencia Ambiental del Proyecto realizadas	N/A					400.000,00	195.998,48		646.000,00
Componente 2. Inversiones en la transformación corporativa de la ENEE.									
Plan de Transformación Corporativa de la ENEE implementado	Plan				1,00	150.000,00	621.400,49		750.000,00
Financiamiento del SIEPAC otorgado	Transferencia				1,00				4.500.000,00
Gestión del Programa									
Gestión del Programa	N/A					500.000,00	84.320,56		3.858.000,00
TOTAL						8.000.474,18	8.955.842,63		31.350.500,00
