

Relatório Resumido

Dados Gerais

Executor:	MINISTERIO DE VIVIENDA
Sector:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-HOUSING
Número da Operação:	2072/OC-PN
Estágio:	Approved
Tipo Operação:	INV - Investimento
Operação Relacionada:	
Subtipo de Operação:	GOM - Global of Multiple Works Operation

Fundos Disponíveis (US\$)

Atual:	12.079.500,00
Desembolsado:	8.099.967,23
% Desembolsado:	67,06
Saldo:	3.979.532,77

Custo Total e Fonte

Original BID:	30.000.000,00
Corrente BID:	12.079.500,00
Pari-passu:	95,00
Cofinanciamento/País:	1.500.000,00
Original Estimado:	31.500.000,00
Período de Amortização (meses):	246

Categoria do impacto social




Categoria do impacto social:

Reformulação


B () Os objetivos do projeto foram reformulados?

Validação

Validado pelo Chefe de Divisão: 05-abr-2013
Validado pelo Representante do País: 11-abr-2013

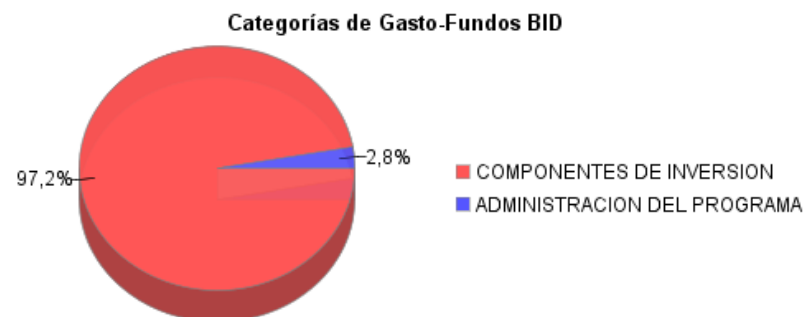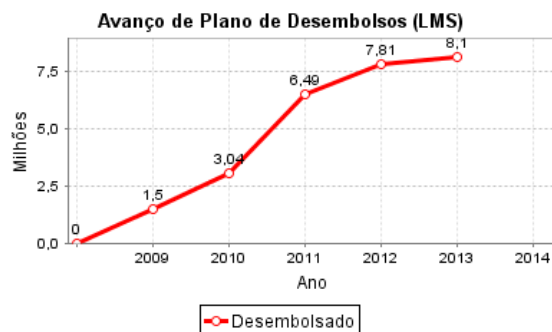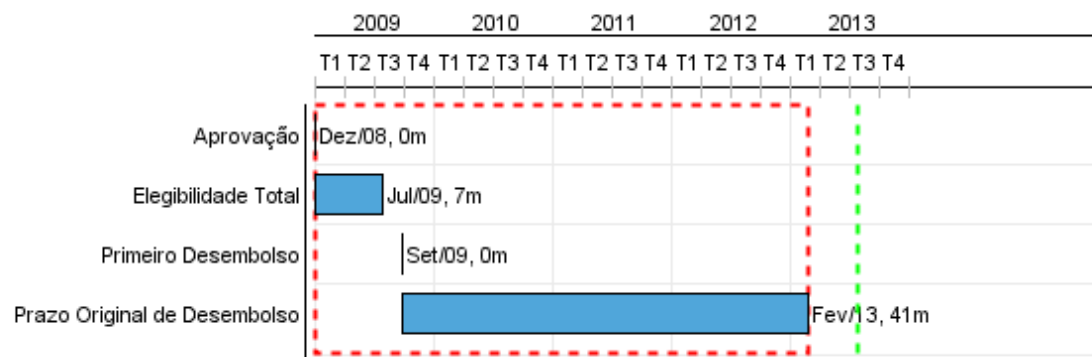

Progresso Acumulado até 2012

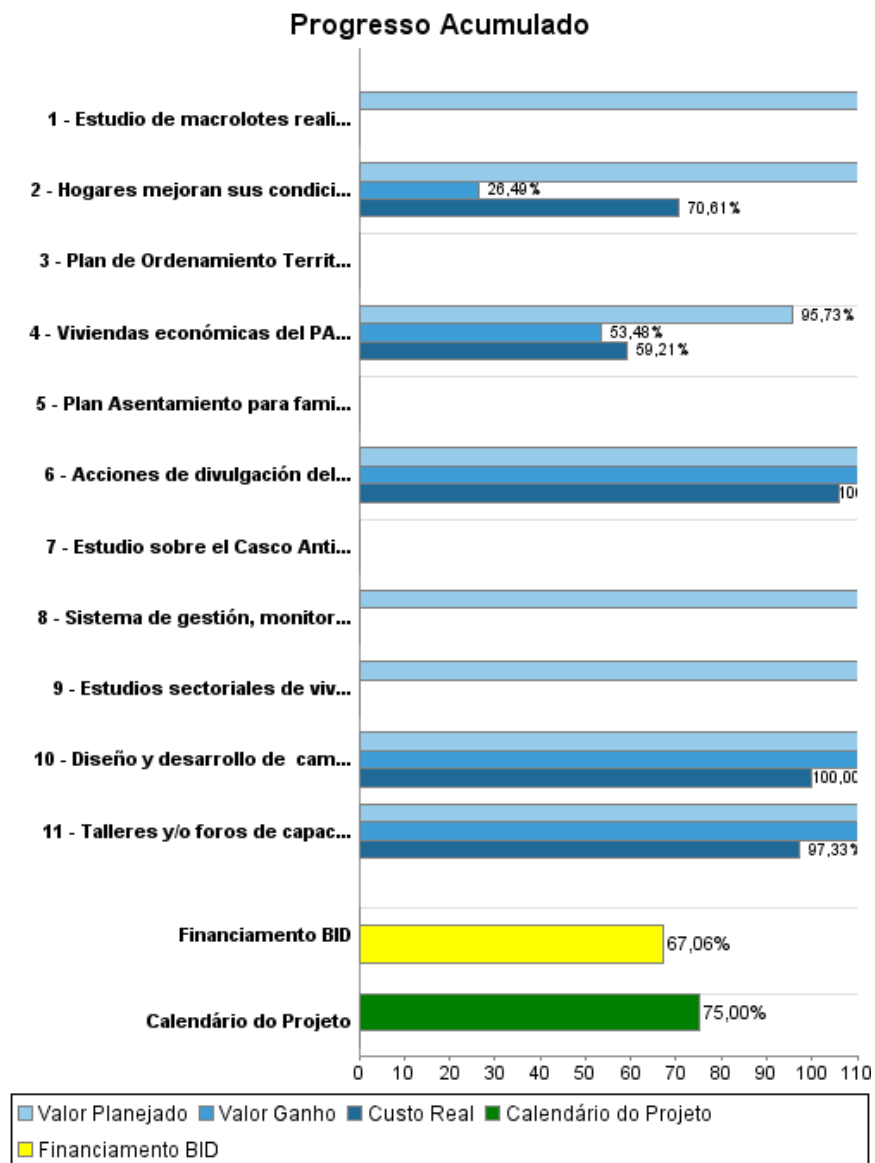

Resultados

Resultado:	Condiciones habitacionales de las familias de menores ingresos mejorada
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	Final do Projeto
Población residiendo en asentamientos informales reducida.	%	100,00	2005	P	98,10	98,10
				A		
Demanda no atendida por vivienda social para familias en extrema pobreza reducida	%	100,00	2005	P	99,20	99,20
				A		

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente I. Mejoramiento de Barrios - PROMEBA									
Hogares mejoran sus condiciones de vivienda.	Hogares				668,00	1.800.000,00	160.000,00		1.113.630,00
Componente II. Viviendas sociales - PARVIS									
Viviendas económicas del PARVIS entregadas.	Hogares	136,00	51,00		592,00	2.821.000,00	1.556.000,00		10.630.530,00
Componente III. Rehabilitación del Casco Antiguo - eliminado por la reestructuración del proyecto (agosto 2010)									
Estudio sobre el Casco Antiguo.	Estudio								
Componente IV. Apoyo a la gestión y fortalecimiento institucional									
Talleres y/o foros de capacitación sobre vivienda y urbanismo realizados	capacitaciones		1,00		2,00		300,00		15.000,00
Sistema de gestión, monitoreo y evaluación implantado y evaluaciones realizadas	Sistema	1,00			1,00	20.000,00			151.000,00
Estudio de macrolotes realizado.	Estudio	1,00			1,00	70.000,00			70.000,00
Estudios sectoriales de vivienda y desarrollo urbano realizados.	Estudio				1,00				60.000,00
Diseño y desarrollo de campaña de mercadeo social del Programa aprobada.	campaña				1,00				34.000,00
Acciones de divulgación del Programa (campañas anuales) realizadas.	campaña	1,00	1,00		2,00	10.000,00	5.000,00		5.000,00
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Pacora y San Martín aprobado.	POT								
Plan Asentamiento para familias de Las Garzas de Pacora diseñado y aprobado.	Plan								
Costos de administración, imprevistos y otros del Programa.	N/A					286.000,00	286.000,00		1.500.000,00
TOTAL						5.007.000,00	2.007.300,00		13.579.160,00
