

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Secteur: MULTISECTOR CREDIT & PREINVESTMENT-MULTISECTOR CREDIT PROGRAMS
Numéro(s) de Prêt(s): 1493/SF-HA;2384/GR-HA
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s): HA-T1060, HA-X1008
Sous-Type de l'Opération: GOM - Global of Multiple Works Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 72.999.999,30
Montant Décaissé à ce Jour: 57.026.275,57
% Décaissé: 78,12
Solde: 15.973.723,73

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 94.526.657,29
Courant BID: 72.999.999,30
Pari Passu: 98,82
Cofinancement/Pays: 7.800.000,00
Estimation Initiale: 102.326.657,29
Période d'Amortissement (mois): 354

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Reformulation

Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B




() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division:


Apr 6, 2011

Validé par le Représentant:

Apr 27, 2011

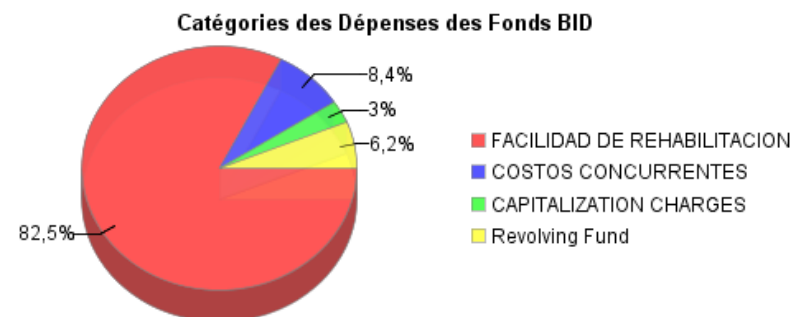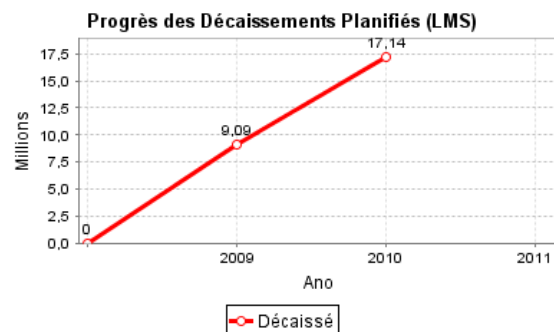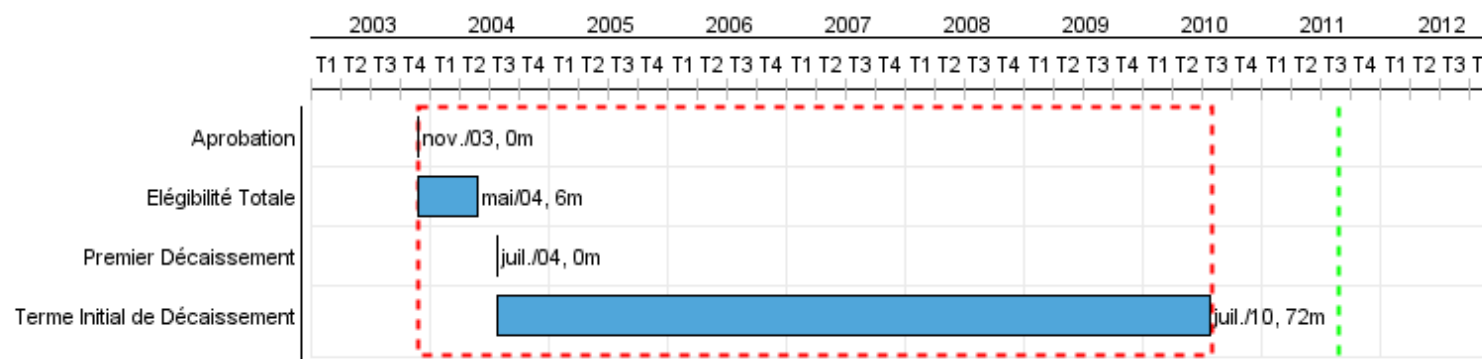

Progrès Cumulé à 2010

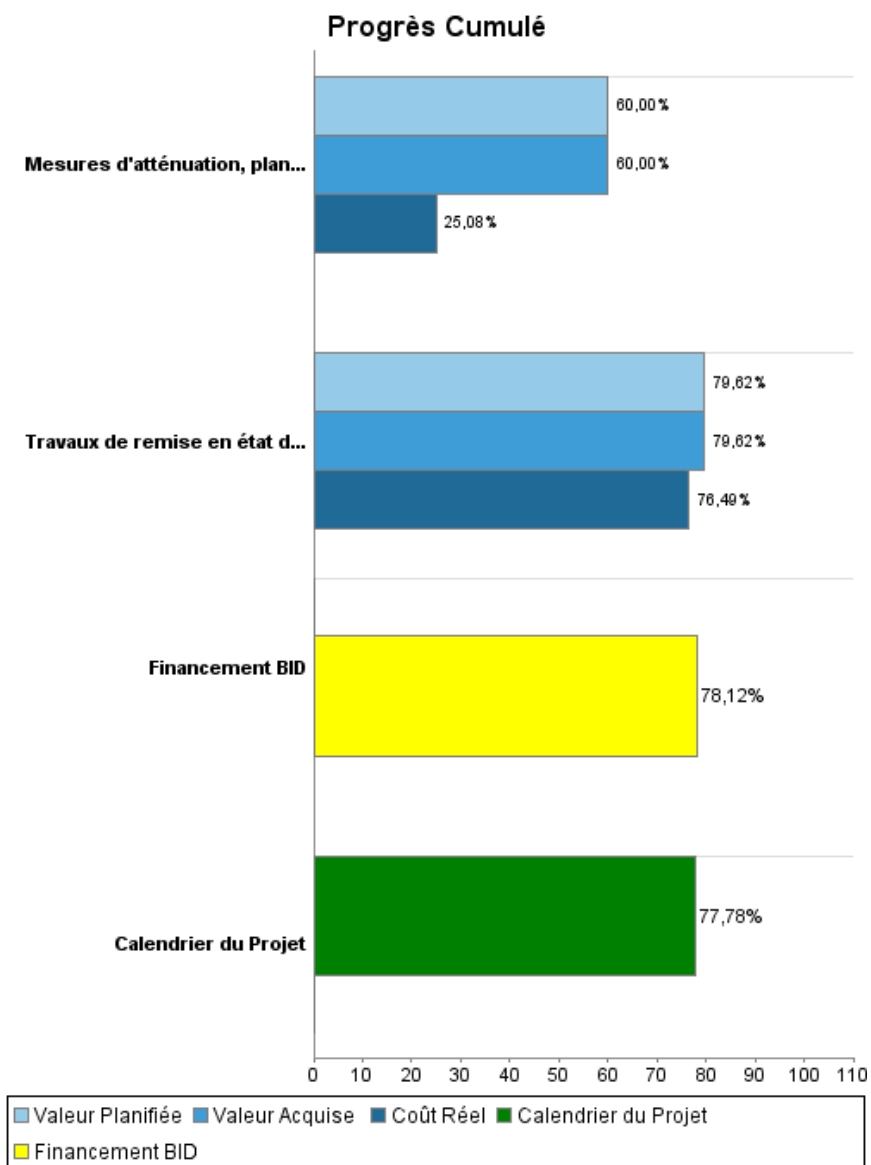

Résultats

Résultat:	Les infrastructures économiques de base sont réhabilitées, gérées et entretenues de manière efficiente et durable
Suposições:	Le pays dispose de ressources nationales et internationales pour l'investissement et l'entretien de l'infrastructure économique de base

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2010	Fin du Projet
Les projets sont entretenus convenablement après leur réception finale	Nombre de projets terminés et entretenus		2005	P	15,00	20,00	44,00
				A	10,00	25,00	
Les usagers, les résidents et les bénéficiaires sont impliqués dans la gestion et l'entretien des projets par des mécanismes de participation	Nombre de projets dotés de mécanismes participatifs		2005	P		10,00	15,00
				A		10,00	
Les bénéficiaires, les résidents et les usagers sont satisfaits des ouvrages réhabilités	% de personnes satisfaites		2005	P	80,00	80,00	80,00
				A	60,00	80,00	

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Mécanisme de remise en état de l'infrastructure économique de base									
Travaux de remise en état de routes, de ponts, de drainage, de bâtiments, de ports et d'environnement	Nombre de projets réalisés	15,00	15,00		45,00	21.404.000,00	6.536.872,00		54.000.000,00
Mesures d'atténuation, plans d'entretien et études de préinvestissement	Études réalisées	10,00	10,00		60,00	600.000,00	491.500,00		5.500.000,00
Administration, finances et imprévus									
TOTAL						22.004.000,00	7.028.372,00		59.500.000,00
