

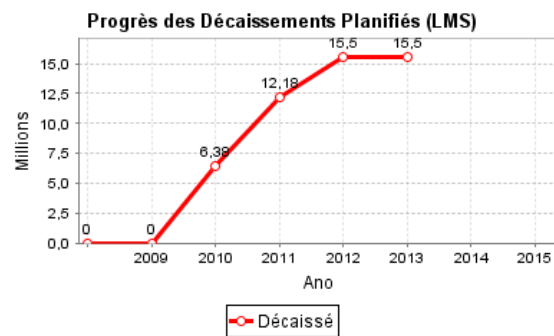



## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ		
Secteur:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-HOUSING		
Numéro(s) de Prêt(s):	2082/BL-BO	Montant Courant Approuvé:	30.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	15.496.945,24
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	51,66
Opération(s) Connexe(s):	BO-P1012, BO-T1093, BO-T1133	Solde:	14.503.054,76
Sous-Type de l'Opération:	PFM - Multi-Phase Lending Project		
		Initial BID:	30.000.000,00
		Courant BID:	30.000.000,00
		Pari Passu:	83,00
		Cofinancement/Pays:	6.000.000,00
		Estimation Initiale:	36.000.000,00
		Période d'Amortissement (mois):	282

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 09-abr-2013 Validé par le Représentant: 10-abr-2013

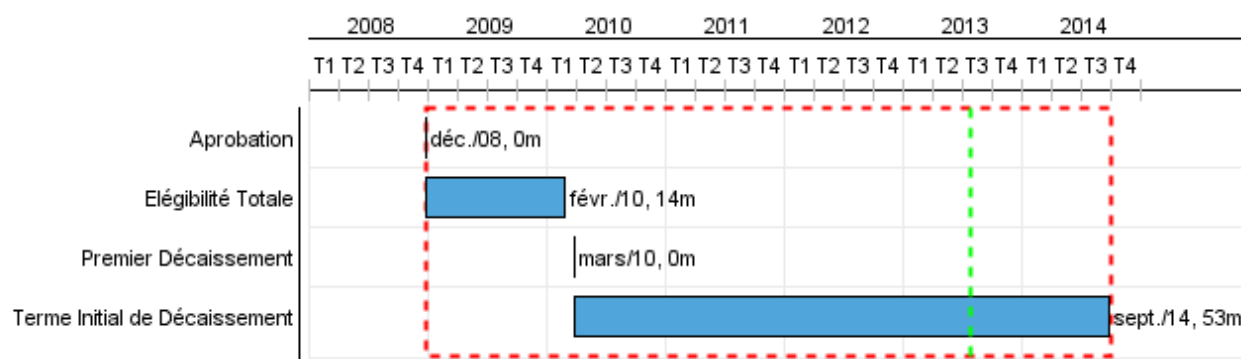

## Progrès Cumulé à 2012

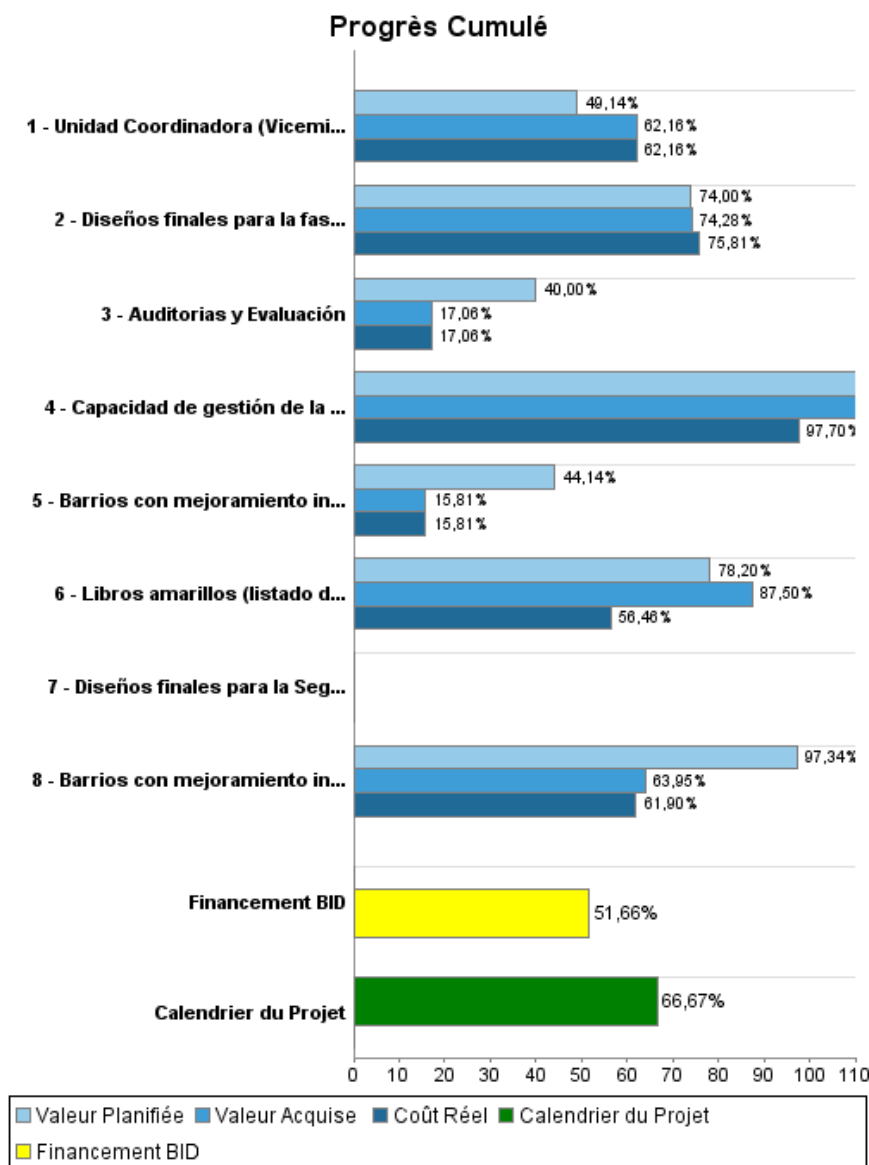

## Résultats

<b>Résultat:</b>	Calidad de vida de los habitantes de los barrios intervenidos mejorada
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	Fin du Projet
Hogares con sistemas de suministro de agua mejorado	Hogar		2009	P	950,00	6.749,00
				A	601,00	
Hogares con sistemas sanitarios mejorado	Hogar		2009	P	900,00	7.200,00
				A	916,00	
Infraestructura social construida utilizada por la comunidad al menos una vez a la semana	Infraestructura		2009	P	5,00	31,00
				A	5,00	
Hogares con accesibilidad mejorada	Hogar		2009	P	1.200,00	7.749,00
				A	1.416,00	

<b>Résultat:</b>	Familias del Municipio de La Paz con seguridad jurídica de viviendas mejorada
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	Fin du Projet
Beneficiarios con folio real entregado	Folios Reales		2009	P	269,00	359,00
				A	272,00	
Beneficiarios con registro catastral entregado	Certificado de Catastro		2009	P	392,00	751,00
				A	511,00	

## Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Componente I. Mejoramiento de Barrios para el Municipio de La Paz</b>									
Barrios con mejoramiento integral ejecutado	Barrio	7,00	3,00		20,00	3.000.000,00	1.441.603,26		12.923.850,00
Libros amarillos (listado de las obras en cada a barrio) difundidos	Libro	429,00			1.829,00	6.150,00			26.150,00
Capacidad de gestión de la Unidad Ejecutora fortalecida	Unidad Ejecutora				1,00		3.795,00		50.000,00
<b>Componente II. Mejoramiento de Barrios en otros Municipios</b>									
Barrios con mejoramiento integral ejecutado	Barrio		3,00		19,00	2.000.000,00	2.706.654,00		22.279.650,00
Diseños finales para la Segunda Fase elaborados	Diseño								
Unidad Coordinadora (Viceministerio)	n/a					30.000,00	62.044,93		170.000,00
Auditorias y Evaluación	n/a					10.000,00	19.216,62		200.000,00
Diseños finales para la fase I elaborados	Diseño	7,00	11,00		14,00	150.000,00	241.095,00		350.350,00
<b>TOTAL</b>						<b>5.196.150,00</b>	<b>4.474.408,81</b>		<b>36.000.000,00</b>
