
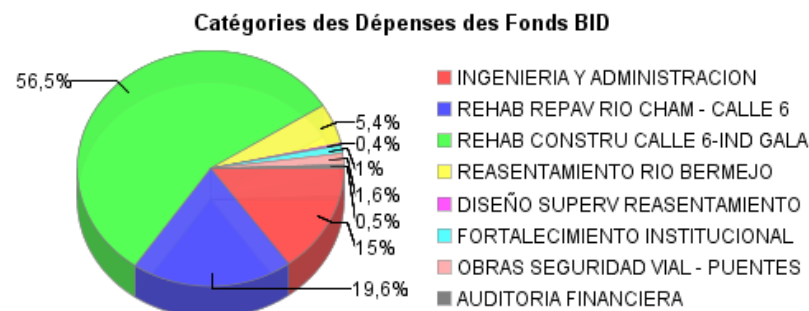
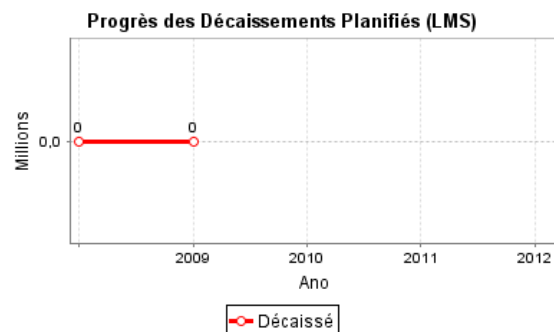



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORT EY VIVIENDA				
Secteur:	TRANSPORTATION-ROAD PROGRAMS				
Numéro(s) de Prêt(s):	2017/BL-HO	Montant Courant Approuvé:	20.000.000,00	Initial BID:	20.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	268.520,00	Courant BID:	20.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	1,34	Pari Passu:	100,00
Opération(s) Connexe(s):	HO-P1010	Solde:	19.731.480,00	Cofinancement/Pays:	2.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	22.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	278

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Mar 28, 2011 Validé par le Représentant: Apr 15, 2011

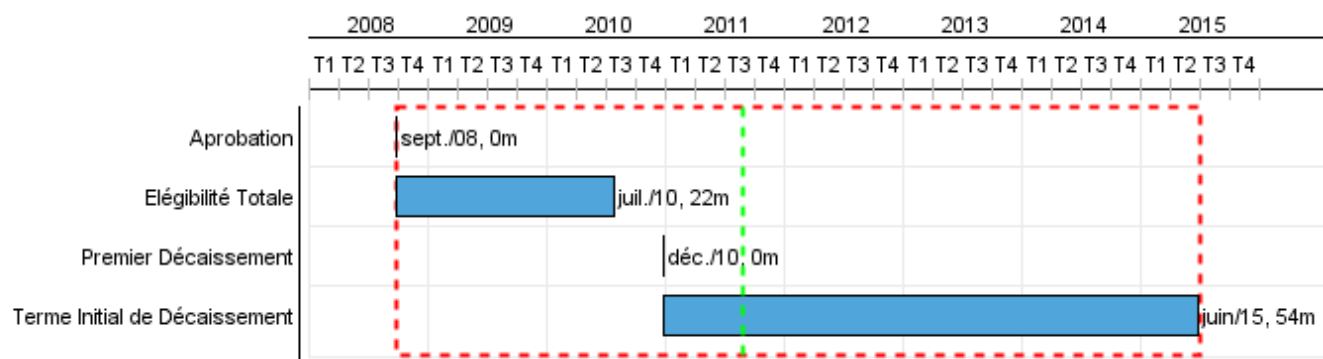

Progrès Cumulé à 2010

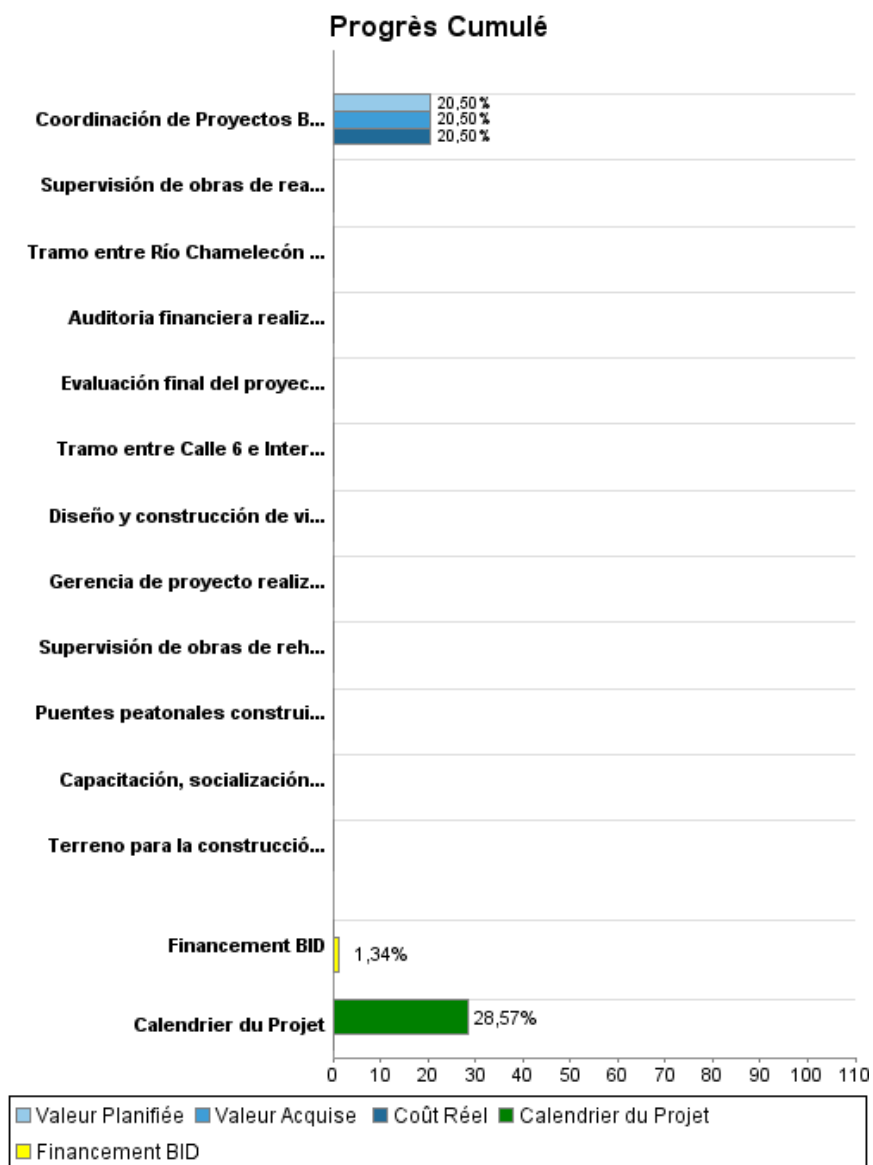

Résultats

Résultat: Condiciones de transitabilidad en el segundo Anillo de la ciudad de San Pedro Sula mejoradas.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	Fin du Projet
Relación volumen/capacidad del segundo Anillo Tramo III Calle 6 a Gala.	V/C en 2 horas de mayor congestionamiento	0,85	2008	P A		0,40

Résultat: Accidentalidad en el Segundo Anillo de San Pedro Sula reducida.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	Fin du Projet
Numero de accidentes.	Accidentes	130,00	2008	P A		90,00
Número de personas lesionadas.	Personas Lesionadas	30,00	2008	P A		25,00

Résultat: Calidad de vida de familias reasentadas mejorada.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	Fin du Projet
Cambio de tenencia de ocupación precaria a tenencia en propiedad.	Familias		2008	P A	142,00	142,00
Número de familias que perciben menos de un salario mínimo (\$75-mes).	Familias	25,00	2008	P A	5,00	5,00
Indice de enfermedades gastrointestinales y dérmicas en la población infantil.	Porcentaje	30,00	2008	P A	10,00	10,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Rehabilitación y Repavimentación tramo entre Río Chamelecón y la Intersección de la Calle 6.									
Tramo entre Río Chamelecón y la Intersección de la Calle 6 rehabilitado y repavimentado.	Kilómetros				12,90				4.900.000,00
Rehabilitación y Construcción tramo entre Calle 6 e Intersección Gala.									
Tramo entre Calle 6 e Intersección Gala rehabilitado y construido .	Kilómetros				5,50				11.300.000,00
Reasentamiento.									
Supervisión de obras de reasentamiento para familias ubicadas en bordo de Río Bermejo realizada.	Viviendas				142,00				115.000,00
Terreno para la construcción de obras de reasentamiento de familias ubicadas en bordo del Río Bermejo disponible.	Terreno				1,00				529.240,00
Diseño y construcción de viviendas y otras obras (servicios públicos básicos y equipamiento comunitario) para reasentamiento de familias, realizada.	Viviendas				142,00				855.760,00
Fortalecimiento Institucional									
Capacitación, socialización y organización de los afectados por reasentamiento realizadas e implementadas.	Familias				142,00				200.000,00
Ingeniería y Administración.									
Gerencia de proyecto realizada por empresa consultora.	Gerencia				1,00				1.400.000,00
Coordinación de Proyectos BID realizada.	Coordinación				1,00	20.500,00	20.500,00		100.000,00
Supervisión de obras de rehabilitación y ampliación de los tramos Río Chamelecon - 6ta . calle y 6ta. calle - Intersección Gala realizada.	Kilometro				18,40				2.000.000,00
Obras de Seguridad Vial									
Puentes peatonales construidos.	Puentes				10,00				320.000,00
Monitoreo y evaluación.									
Evaluación final del proyecto realizada	Evaluación				1,00				180.000,00
Auditoría Financiera									
Auditoría financiera realizada.	Auditoria				5,00				100.000,00
TOTAL						20.500,00	20.500,00		22.000.000,00
