

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE): MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
Sector: EDUCATION-PRIMARY EDUCATION
Número(s) de Préstamo: 2100/OC-JA
Etapas: Approved
Tipo de Operación: INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):
Subtipo de Operación: SUP - Financiamiento Suplementario

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual: 14.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha: 10.110.853,87
% Desembolsado: 72,22
Saldo: 3.889.146,13

Costo total y Fuente

BID Original: 14.000.000,00
Actual BID: 14.000.000,00
Pari-passu: 100,00
Co-financiamiento/País:
Estimado Original: 14.000.000,00
Período de Amortización (meses): 270

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno

Reformulación

() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División: 08-abr-2013
Validado por Representante de País: 15-abr-2013

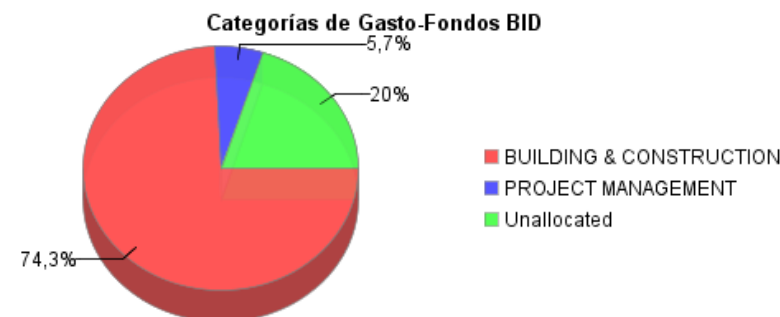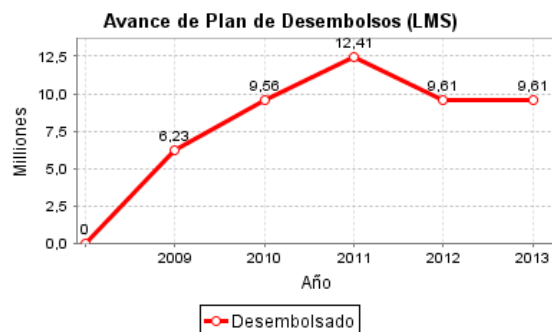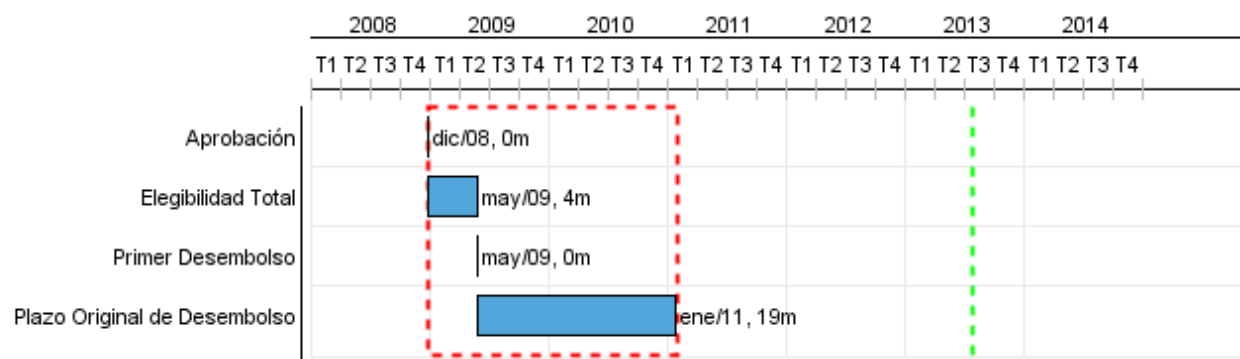

Progreso Acumulado al 2012

Progreso Acumulado



Resultados

Resultado: Occupancy rate reduced in benefited schools

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Occupancy rate in benefited schools	Ratio	186,00	2003	P		130,00		100,00	100,00	100,00
				A		106,00				
Students benefited by education projects	Students		2008	P	1.260,00	1.155,00		1.155,00	1.155,00	3.570,00
				A	1.260,00	1.155,00				

Resultado: Benefited schools maintained in good condition

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Maintenance plans delivered	Maintenance plans		2008	P	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
				A	4,00	4,00	5,00	5,00		

Resultado: Schools de-shifted in 3 miles radius from new PESP schools

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
de-shifted schools	Schools		2008	P	1,00	4,00		4,00		4,00
				A						

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP
Civil works					
New schools built (Hellshire; Mansfield)	Schools	1,00			2,00
Schools partially replaced (Red Hills)	Schools	1,00	0,50		1,00
Existing schools expanded (Chester castle; Lucea Primary)	Schools				2,00
Schools fully replaced (Fruitfull Vale; Sheffield)	Schools				2,00
Project management	N/A				
Unallocated					
Unallocated funds	N/A				
