
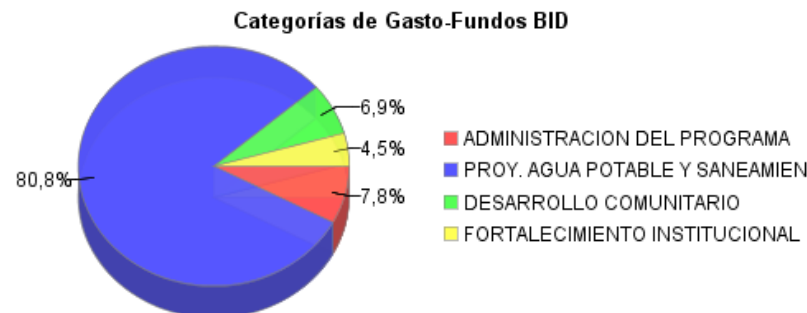
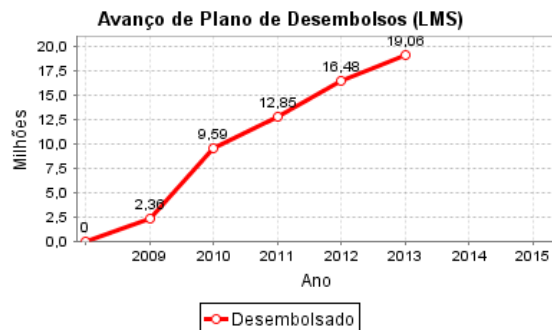



Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor:	FND NAC.DE INVER. PRODUCTIVA Y SOCIAL		
Sector:	WATER AND SANITATION		
Número da Operação:	1927/BL-BO	Atual:	21.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	18.047.632,80
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	85,94
Operação Relacionada:		Saldo:	2.952.367,20
Subtipo de Operação:	GOM - Global of Multiple Works Operation		
		Original BID:	21.000.000,00
		Corrente BID:	21.000.000,00
		Pari-passu:	86,00
		Cofinanciamento/País:	3.500.000,00
		Original Estimado:	24.500.000,00
		Período de Amortização (meses):	276

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 13-sep-2013 Validado pelo Representante do País: 25-sep-2013

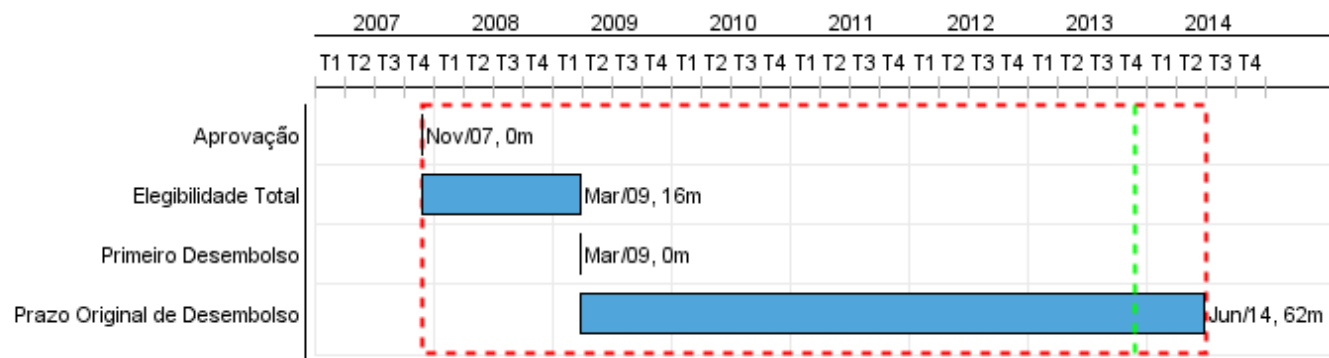

Progresso Acumulado até 2013

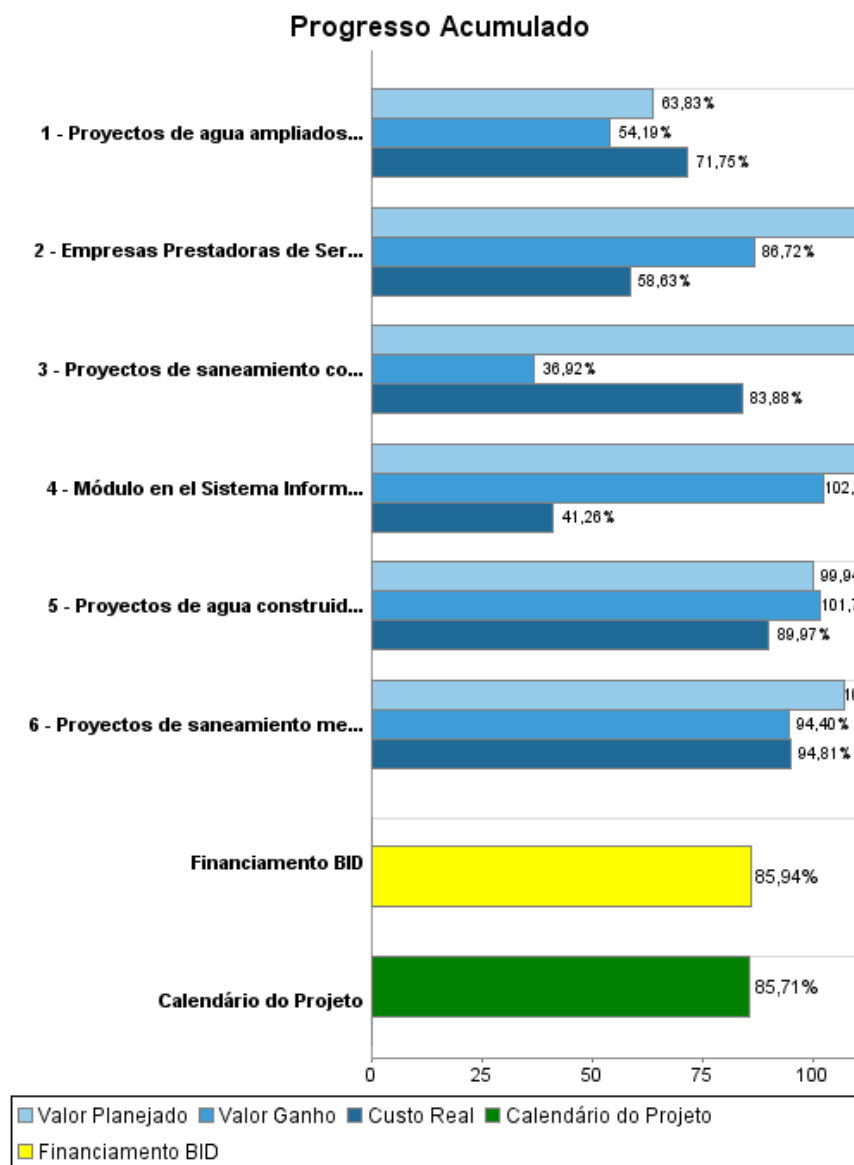

Resultados

Resultado:	Calidad de vida de los beneficiarios mejorada
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	Final do Projeto
Hogares con suministro de agua mejorado	Hogares	2.068,00	2010	P			4.899,00	9.127,00
				A	2.160,00			
Hogares con suministro de agua nuevo	Hogares	3.450,00	2008	P				6.380,00
				A	3.634,00			
Hogares con conexiones sanitarias mejoradas	Hogares		2008	P			3.280,00	4.751,00
				A	1.471,00			
Hogares con conexiones sanitarias nuevas	Hogares		2010	P				1.993,00
				A	5.129,00			
Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Hogares		2008	P				7.376,00
				A				

Resultado:	Sostenibilidad del servicio de agua potable y alcantarillado mejorada
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	Final do Projeto
Empresas con equilibrio financiero	Empresas		2010	P	14,00		18,00	34,00
				A	16,00			

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Proyectos de agua potable y saneamiento básico									
Proyectos de agua construidos hasta el final del programa	Proyectos	4,00	2,00		18,00	822.057,00	491.783,00		6.802.370,16
Proyectos de agua ampliados hasta el final del programa (incluye mejoramiento)	Proyectos	2,00			14,00	879.967,00	366.591,00		3.151.723,45
Proyectos de saneamiento construidos hasta el final del programa	Proyectos	3,00			22,00	3.759.424,45	3.498.131,83		8.582.825,45
Proyectos de saneamiento mejorados hasta el final del programa	Proyectos				3,00	519.233,42	807.705,14		1.427.978,93
Desarrollo Comunitario									
Empresas Prestadoras de Servicios de Agua y Alcantarillado EPSAS con estado financiero	Empresas		1,00		39,00	262.702,42	143.596,11		1.941.347,00
Fortalecimiento institucional									
Módulo en el Sistema Informático de administración de proyectos implementado	Módulo				1,00	133.791,62	62.682,22		949.223,00
Administración, evaluación, seguimiento y auditorías	N/A					333.101,08	222.725,83		1.644.532,00
TOTAL						6.710.276,99	5.593.215,13		24.499.999,99
