
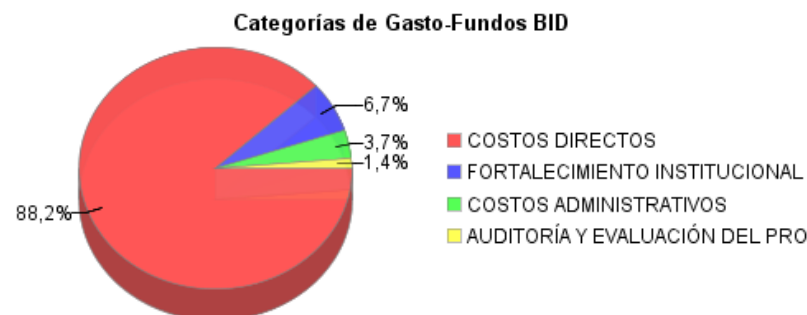
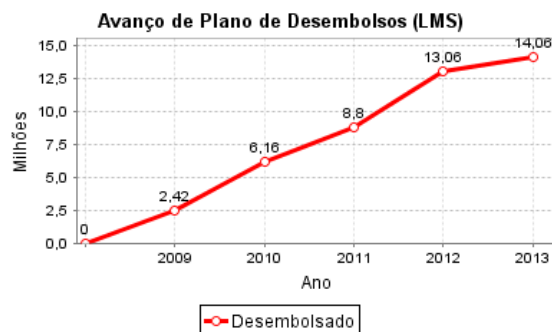



Relatório Resumido

| Dados Gerais | | Fundos Disponíveis (US\$) | Custo Total e Fonte |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Executor: | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION | | |
| Sector: | TRANSPORT | | |
| Número da Operação: | 2079/OC-CO | Atual: | 14.185.000,00 |
| Estágio: | Approved | Desembolsado: | 14.055.798,44 |
| Tipo Operação: | INV - Investimento | % Desembolsado: | 99,09 |
| Operação Relacionada: | CO-T1139 | Saldo: | 129.201,56 |
| Subtipo de Operação: | ESP - Specific Investment Operation | | |
| | | Original BID: | 14.185.000,00 |
| | | Corrente BID: | 14.185.000,00 |
| | | Pari-passu: | 100,00 |
| | | Cofinanciamento/País: | |
| | | Original Estimado: | 14.185.000,00 |
| | | Período de Amortização (meses): | 234 |

| Categoria do impacto social | Reformulação | Validação |
|------------------------------|--------------|--|
| Categoria do impacto social: | Nenhum | () Os objetivos do projeto foram reformulados? |
| | | Validado pelo Chefe de Divisão: 25-sep-2013 |
| | | Validado pelo Representante do País: 26-sep-2013 |

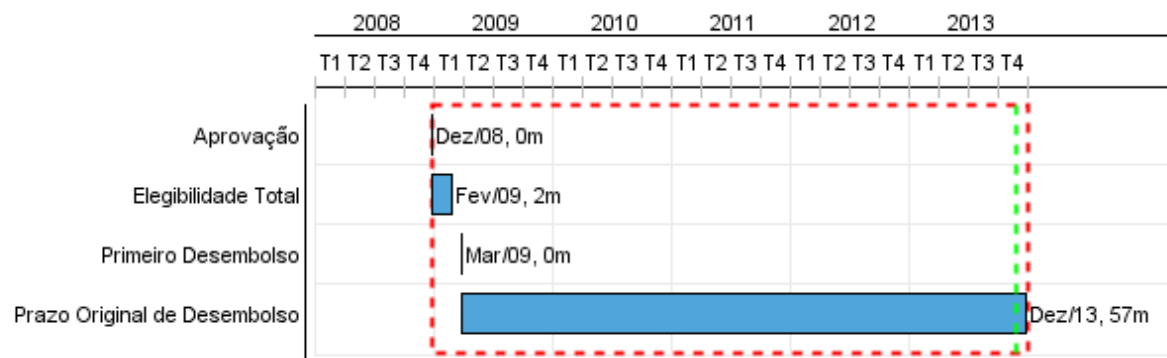

Progresso Acumulado até 2013

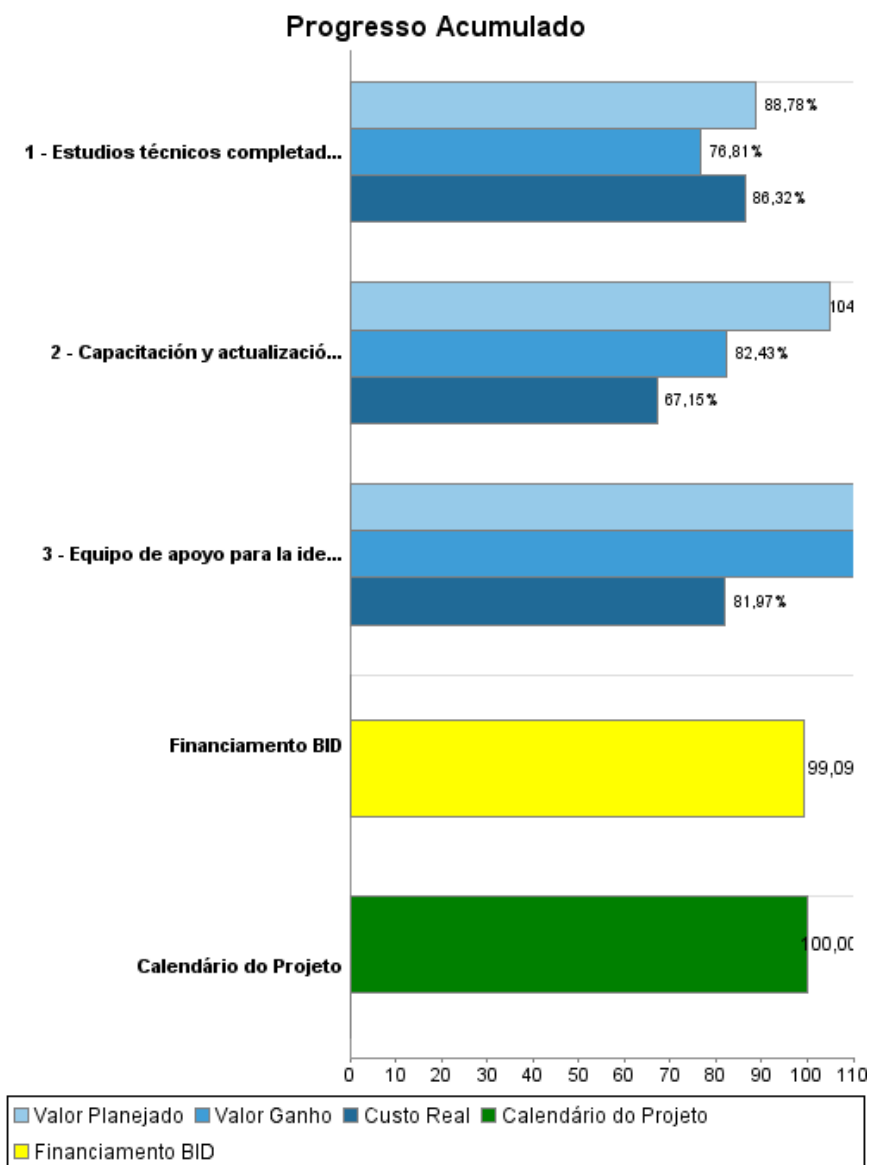

Resultados

Resultado: Condiciones de regulación para la participación privada en infraestructura mejorada. (Con la aprobación de normas, marcos de regulación y/o estructuras institucionales).

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Final do Projeto |
|--|----------------|------------|----------------|---|------|------|------|------|------|------------------|
| Número de marcos regulatorios y normas específicas para la participación del sector privado aprobados en diversos sectores . | números | | | P | | | | | | 5,00 |
| | | | | A | 1,00 | | 3,00 | 1,00 | | |

Resultado: Proyectos con participación privada incrementados.

Observações: Proyectos de participación privada estructurados exitosamente por el Programa en el marco de los planes de desarrollo de los sectores de infraestructura.

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Final do Projeto |
|---|----------------|------------|----------------|---|------|------|------|------|------|------------------|
| Número de proyectos con participación privada estructurados por el Programa en diversos sectores. | números | | | P | | | | | 1,00 | 5,00 |
| | | | | A | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | |

Resultado: Proyectos de movilidad municipal incrementados.

Observações: Planes de Movilidad que prevén la participación privada, adoptados en cada uno de los municipios atendidos.

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Final do Projeto |
|--|----------------|------------|----------------|---|------|------|------|------|------|------------------|
| Número de planes de movilidad adoptados en ciudades intermedias. | números | | | P | | | | | | 4,00 |
| | | | | A | | 1,00 | 3,00 | 2,00 | | |

Resultado: Participación de entidades y beneficiarios incrementada.

Observações: Respecto a la fase II del Programa.

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Final do Projeto |
|--|----------------|------------|----------------|---|-------|-------|------|------|------|------------------|
| Número de sectores involucrados en el Programa | número | 4,00 | 2008 | P | | | | | | 8,00 |
| | | | | A | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | | |
| Número de entidades sub-nacionales beneficiarias del Programa. | número | 15,00 | 2008 | P | | | | | | 27,00 |
| | | | | A | 15,00 | 23,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| Número de entidades y ministerios beneficiarios del Programa | número | 9,00 | 2008 | P | | | | | 1,00 | 30,00 |
| | | | | A | 9,00 | 29,00 | | 1,00 | | |

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

| Descrição | Unidade de medida | Físico | | | | Financeiro | | | |
|--|------------------------|-----------|-------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | Planejado | Atual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planejado | Atual | Custos Acumulados | Custos FDP |
| Estudios Técnicos (Incluye Componentes de Desarrollo Institucional y Proyectos específicos de la Matriz de Resultados). | | | | | | | | | |
| Estudios técnicos completados y aprobados. | estudios | 5,00 | 1,00 | | 56,00 | 1.313.000,00 | 113.530,00 | | 10.195.555,32 |
| Identificación, Interventoría y seguimiento del proyecto | | | | | | | | | |
| Equipo de apoyo para la identificación, interventoría y seguimiento de proyectos operando. | Equipo operando | 1,00 | 1,00 | | 5,00 | 852.000,00 | 186.800,00 | | 2.311.129,74 |
| Fortalecimiento Institucional | | | | | | | | | |
| Capacitación y actualización en materia técnica ejecutada. | capacitación realizada | 1,00 | | | 3,00 | 281.000,00 | 16.400,00 | | 953.784,78 |
| Administración | | | | | | | | | |
| . | N/A | | | | | 138.000,00 | 173.100,00 | | 531.707,05 |
| Auditoría y Evaluación del Programa | | | | | | | | | |
| . | N/A | | | | | 82.000,00 | 18.700,00 | | 192.823,11 |
| Imprevistos | | | | | | | | | |
| Imprevisto | N/A | | | | | 50.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.716.000,00 | 508.530,00 | | 14.185.000,00 |
