
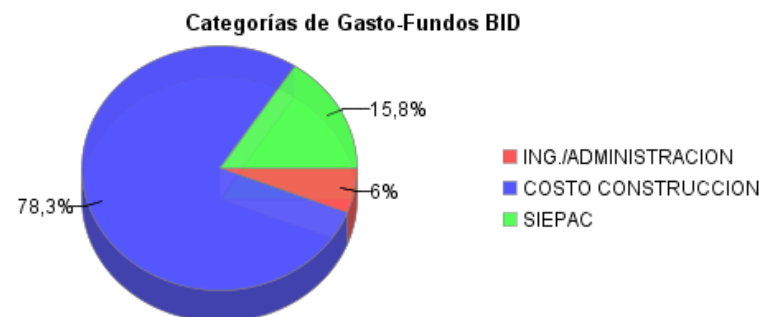
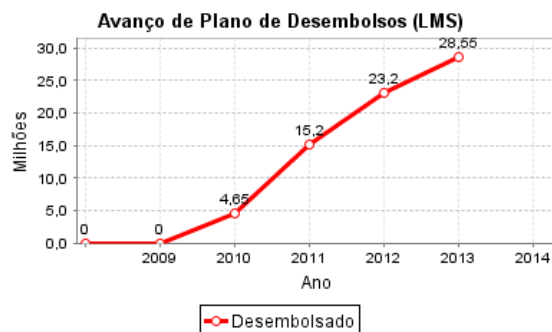



## Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA		
Sector: ENERGY-NEW POWER DISTRIBUTION & TRANSMISSION PROJECTS		
Número da Operação: 2016/BL-HO	Atual: 28.550.000,00	Original BID: 28.550.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 28.550.000,00	Corrente BID: 28.550.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 100,00	Pari-passu: 91,00
Operação Relacionada: HO-P1010, HO-T1095, HO-L1039	Saldo:	Cofinanciamento/País: 2.760.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 31.310.000,00
		Período de Amortização (meses): 282

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 07-oct-2013 Validado pelo Representante do País: 08-oct-2013

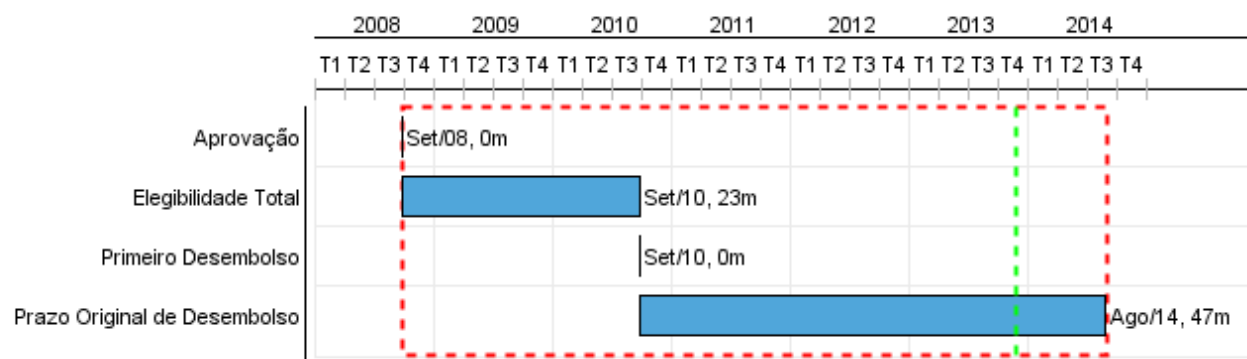

## Progresso Acumulado até 2013

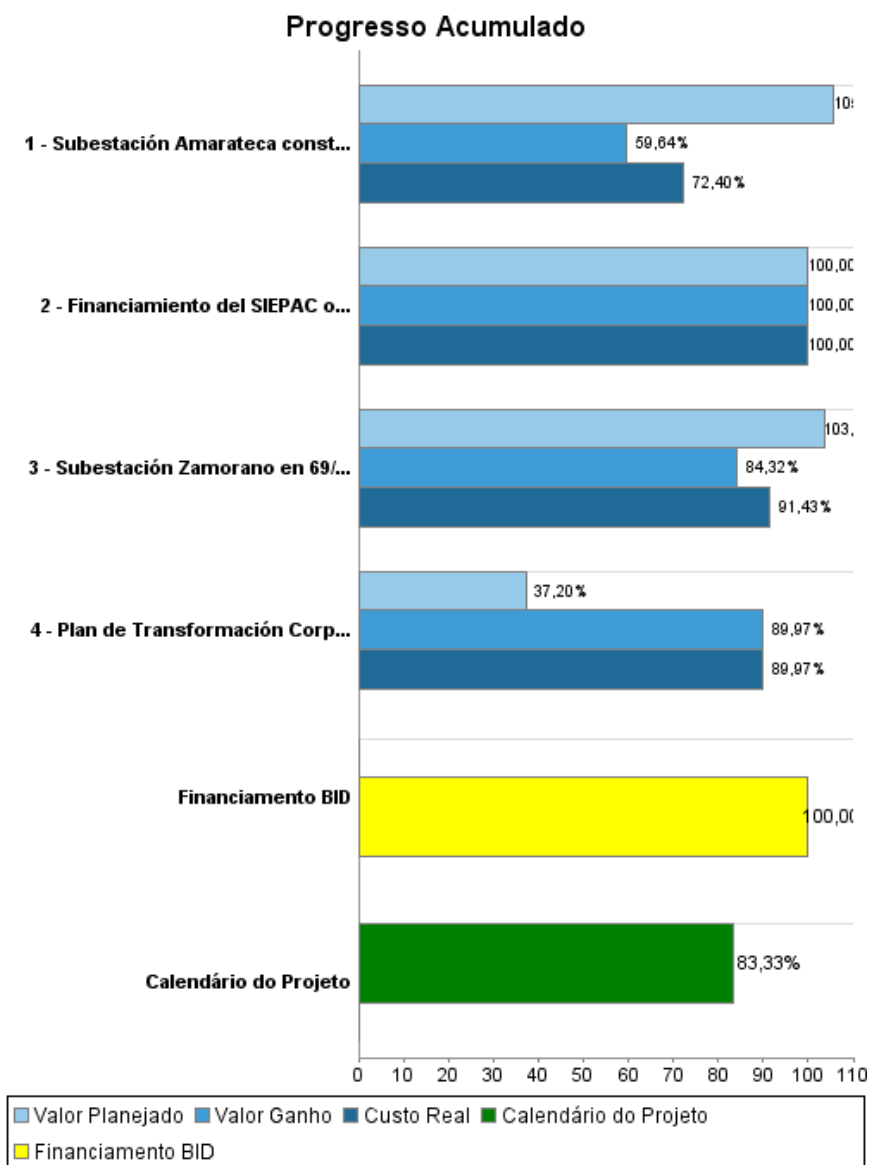

## Resultados

<b>Resultado:</b>	Incremento de la energía servida en las zonas de influencia de los proyectos
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Electricidad suministrada al nivel de 138 kv por los refuerzos en Amarateca	MW		2007	P A	132,10
Electricidad suministrada al nivel de 69 kv por la Subestación del Zamorano	MW	6,40	2007	P A	8,40

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Componente 1. Inversiones en la red de transmisión eléctrica.</b>									
Subestación Amarateca construida y en operación	Subestación	1,00			1,00	8.212.000,00	2.595.273,37		20.346.000,00
Subestación Zamorano en 69/34.5 kV con 30 MVA adicionales ampliada y en operación	Subestación	1,00			1,00	196.000,00	88.923,28		1.250.500,00
Asesoría, supervisión de obras y Regencia Ambiental del Proyecto realizadas	N/A					355.000,00	109.656,64		646.000,00
<b>Componente 2. Inversiones en la transformación corporativa de la ENEE.</b>									
Plan de Transformación Corporativa de la ENEE implementado	Plan				1,00	129.000,00	53.340,19		750.000,00
Financiamiento del SIEPAC otorgado	Transferencia				1,00				4.500.000,00
<b>Gestión del Programa</b>									
Gestión del Programa	N/A					3.000.000,00	262.255,02		3.858.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>11.892.000,00</b>	<b>3.109.448,50</b>		<b>31.350.500,00</b>
