
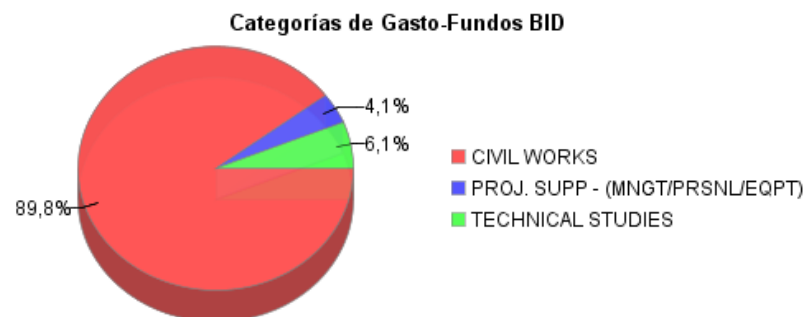
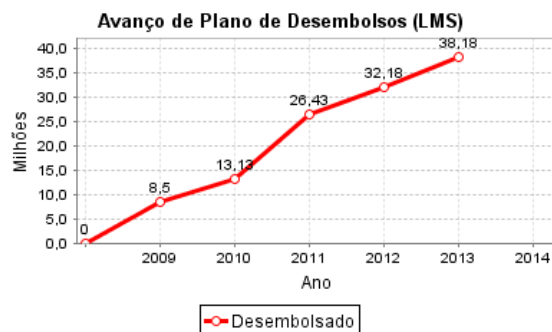



Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor:	NATIONAL WORKS AGENCY MTW		
Sector:	TRANSPORT		
Número da Operação:	2026/OC-JA	Atual:	50.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	38.176.025,70
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	76,35
Operação Relacionada:		Saldo:	11.823.974,30
Subtipo de Operação:	GOM - Global of Multiple Works Operation		
		Original BID:	50.000.000,00
		Corrente BID:	50.000.000,00
		Pari-passu:	100,00
		Cofinanciamento/País:	
		Original Estimado:	50.000.000,00
		Período de Amortização (meses):	234

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 02-oct-2013 Validado pelo Representante do País: 08-oct-2013

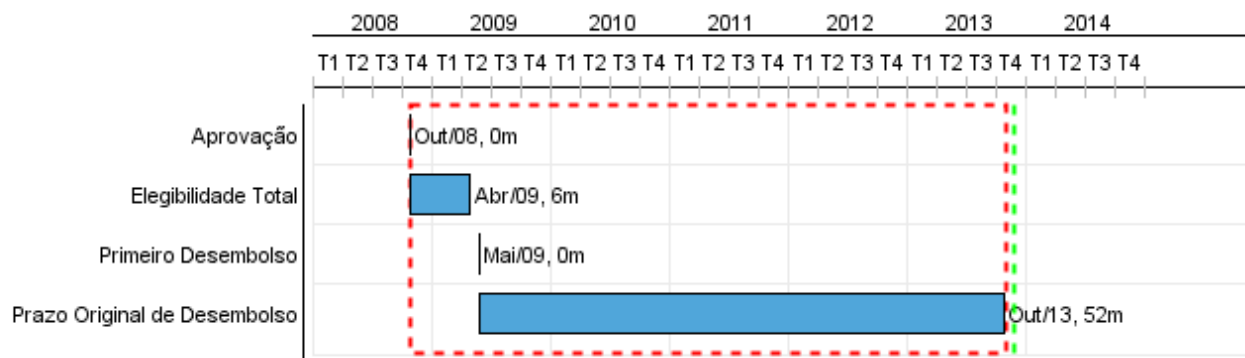

Progresso Acumulado até 2013

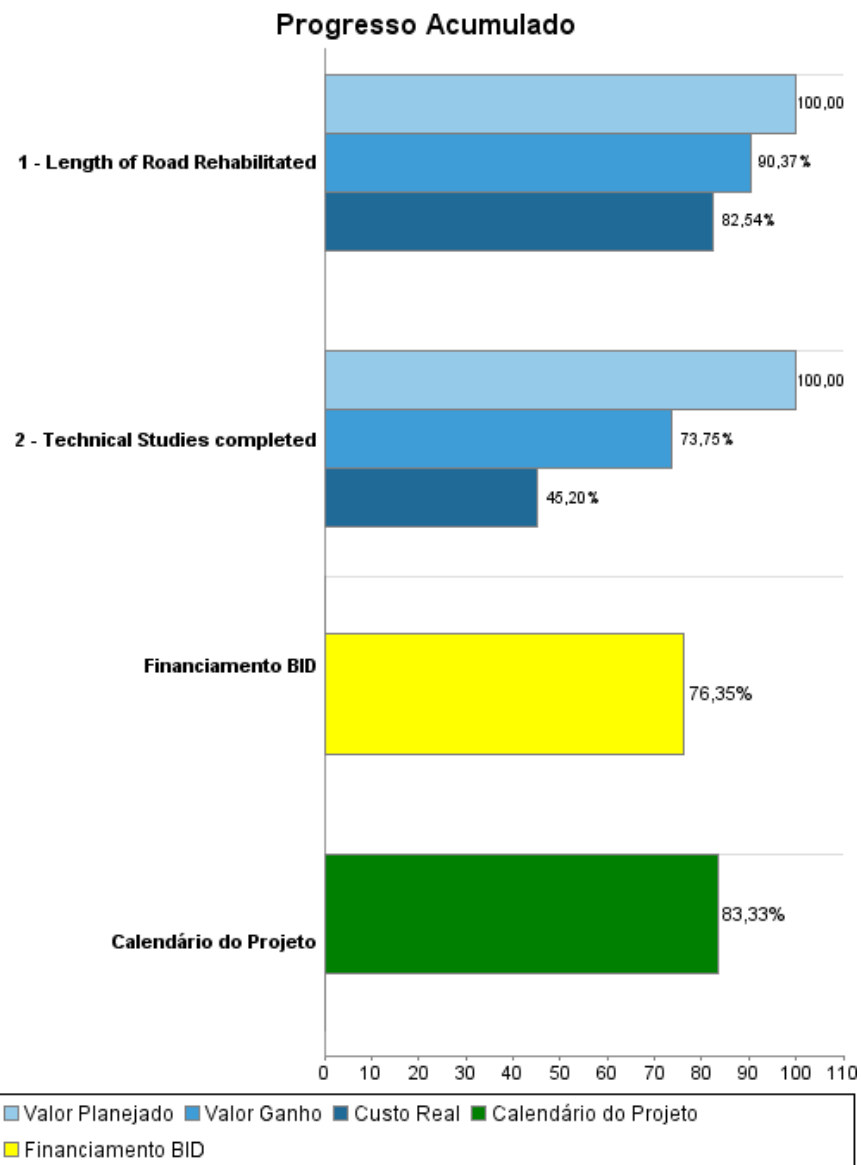

Resultados

Resultado:	Investment projects for Drainage works across Jamaica and also for Expansion of the main road network along Jamaica's southern coast identified.
Suposições:	Final recommendations of the Drainage study and the South Coast Highway project will be accepted by the Government of Jamaica.
Observações:	The completion of the drainage study is particularly important to define projects that would control runoff to protect the road investments in light of the increased frequency of hurricane events in Jamaica and also to inform Bank initiatives in light of the Bank's GCI-9 targets on climate change

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	Final do Projeto
Percentage completion of Feasibility Study for Southern Link Road Completed	Percentage		2008	P			10,00	90,00	100,00	100,00
				A	2,00	4,00	10,00	90,00		
Percentage completion of Drainage Master Plan study	Percent		2008	P			10,00	90,00	100,00	100,00
				A	2,00	4,00	10,00	90,00		

Resultado:	Operating road network conditions improved
Suposições:	No natural disasters will further impair the road network once the road has been rehabilitated and rendered safe.
Observações:	The frequency of hurricanes and attendant flooding which impact Jamaica's road network have been increasing due to the reported effects of climate change.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	Final do Projeto
Average Vehicle Operating Cost	Base	100,00	2008	P	100,00	99,00	93,00	87,00	78,00	75,00
				A	100,00	100,00	93,00	87,00		
Accidents due to bad roads	Base	100,00	2008	P	100,00	95,00	90,00	95,00	60,00	50,00
				A	100,00	100,00	90,00	90,00		

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
1. Civil Works									
Length of Road Rehabilitated	Kilometers	10,30	5,68		50,00	9.450.000,00	5.209.428,90		44.000.000,00
2 Project Implementation Support (US\$2 million)									
Project Implementation Support	N/A					486.187,00	130.010,30		2.000.000,00
3 Technical Studies (US\$ 4 million).									
Technical Studies completed	Studies	1,00	0,30		2,00	1.500.000,00	439.607,00		4.000.000,00
TOTAL						11.436.187,00	5.779.046,20		50.000.000,00
