

Relatório Resumido

Dados Gerais

Executor:	MINISTERIO DE VIVIENDA
Sector:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-HOUSING
Número da Operação:	2072/OC-PN
Estágio:	Approved
Tipo Operação:	INV - Investimento
Operação Relacionada:	
Subtipo de Operação:	GOM - Global of Multiple Works Operation

Fundos Disponíveis (US\$)

Atual:	12.079.500,00
Desembolsado:	8.941.650,11
% Desembolsado:	74,02
Saldo:	3.137.849,89

Custo Total e Fonte

Original BID:	30.000.000,00
Corrente BID:	12.079.500,00
Pari-passu:	95,00
Cofinanciamento/País:	1.500.000,00
Original Estimado:	31.500.000,00
Período de Amortização (meses):	246

Categoria do impacto social




Categoria do impacto social:

Reformulação


B () Os objetivos do projeto foram reformulados?

Validação

Validado pelo Chefe de Divisão: 25-sep-2013
Validado pelo Representante do País: 09-oct-2013

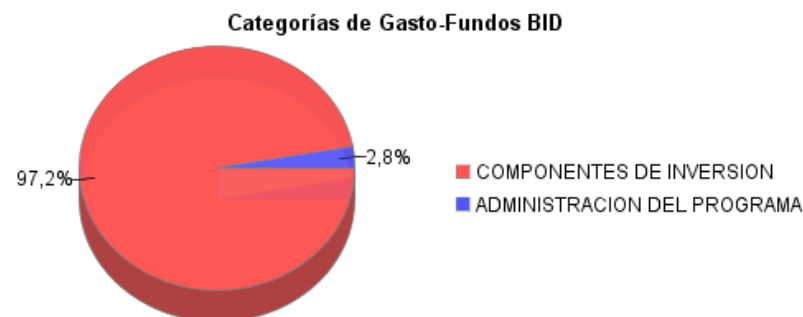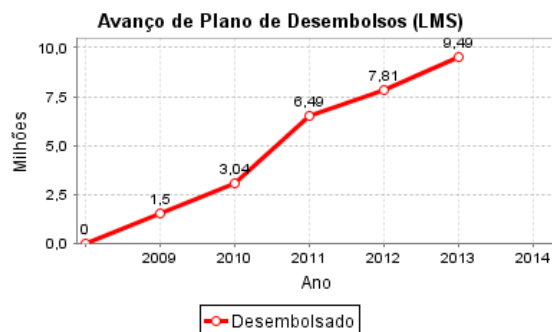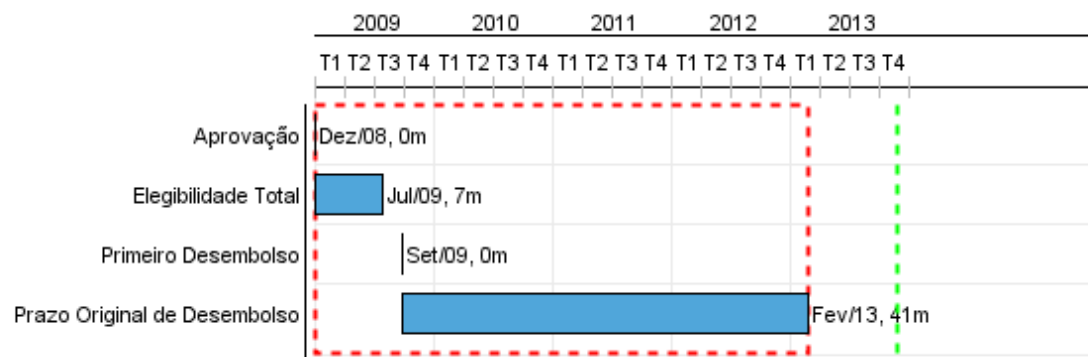

Progresso Acumulado até 2013

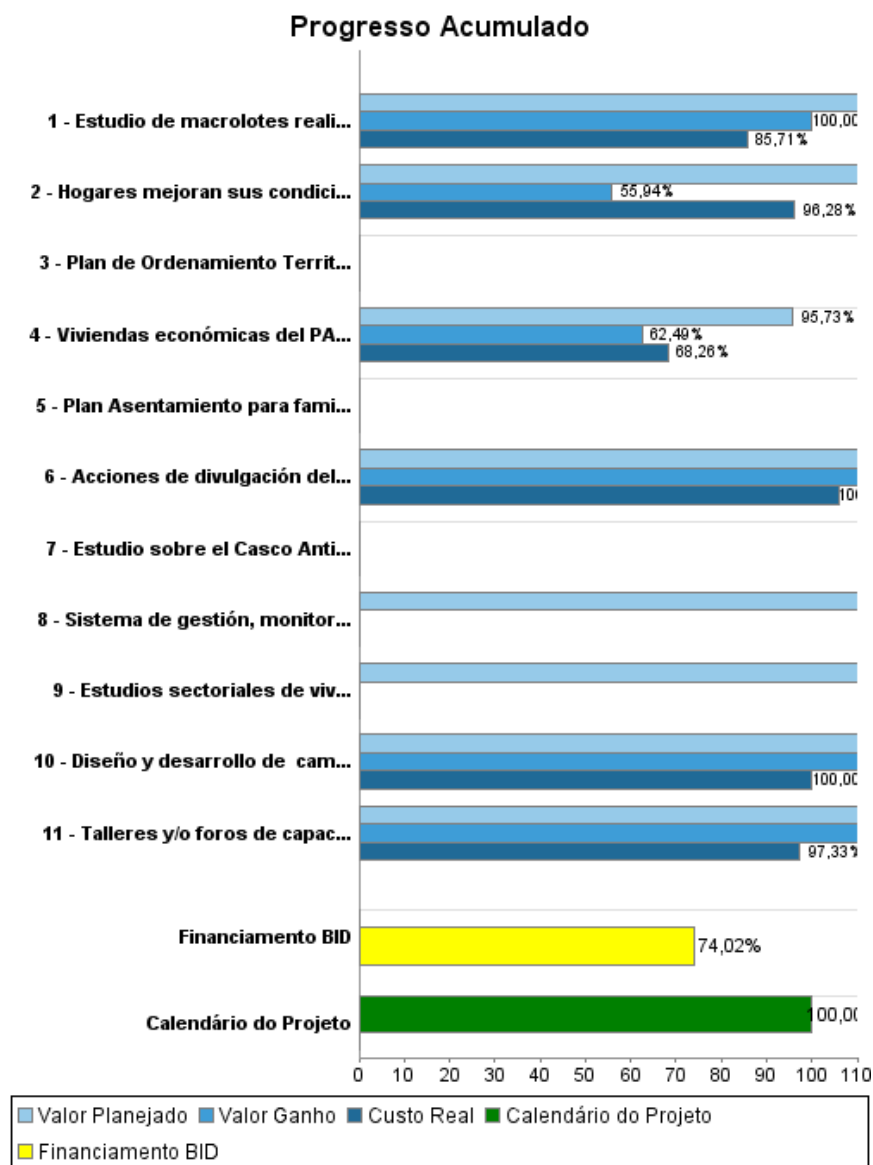

Resultados

Resultado:	Condiciones habitacionales de las familias de menores ingresos mejorada
-------------------	-------------------------------------------------------------------------

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	Final do Projeto
Población residiendo en asentamientos informales reducida.	%	100,00	2005	P	98,19	98,19
				A		
Demanda no atendida por vivienda social para familias en extrema pobreza reducida	%	100,00	2005	P	99,06	99,06
				A	99,29	

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente I. Mejoramiento de Barrios - PROMEBA									
Hogares mejoran sus condiciones de vivienda.	Hogares	668,00	668,00		668,00	327.975,01	285.900,00		1.113.630,00
Componente II. Viviendas sociales - PARVIS									
Viviendas económicas del PARVIS entregadas.	Hogares	85,00	52,00		735,00	1.565.000,00	962.300,00		10.630.530,00
Componente III. Rehabilitación del Casco Antiguo - eliminado por la reestructuración del proyecto (agosto 2010)									
Estudio sobre el Casco Antiguo.	Estudio								
Componente IV. Apoyo a la gestión y fortalecimiento institucional									
Talleres y/o foros de capacitación sobre vivienda y urbanismo realizados	capacitaciones				2,00				15.000,00
Sistema de gestión, monitoreo y evaluación implantado y evaluaciones realizadas	Sistema	1,00			1,00	151.000,00			151.000,00
Estudio de macrolotes realizado.	Estudio	1,00	1,00		1,00	70.000,00	60.000,00		70.000,00
Estudios sectoriales de vivienda y desarrollo urbano realizados.	Estudio	1,00			1,00	60.000,00			60.000,00
Diseño y desarrollo de campaña de mercadeo social del Programa aprobada.	campana				1,00				34.000,00
Acciones de divulgación del Programa (campañas anuales) realizadas.	campana				2,00				5.000,00
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Pacora y San Martin aprobado.	POT								
Plan Asentamiento para familias de Las Garzas de Pacora diseñado y aprobado.	Plan								
Costos de administración, imprevistos y otros del Programa.	N/A					287.000,00	179.700,00		1.500.000,00
TOTAL						2.460.975,01	1.487.900,00		13.579.160,00
