

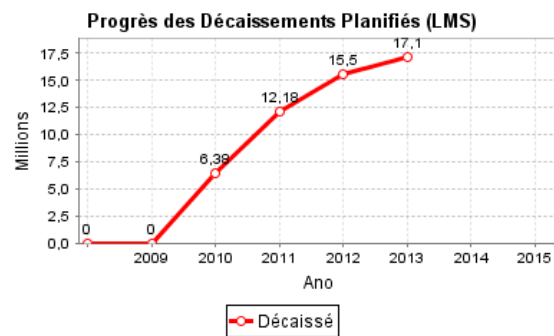



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ				
Secteur:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING				
Numéro(s) de Prêt(s):	2082/BL-BO	Montant Courant Approuvé:	30.000.000,00	Initial BID:	30.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	15.796.945,24	Courant BID:	30.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	52,66	Pari Passu:	83,00
Opération(s) Connexe(s):	BO-P1012, BO-T1093, BO-T1133	Solde:	14.203.054,76	Cofinancement/Pays:	6.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	PFM - Multi-Phase Lending Project			Estimation Initiale:	36.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	282

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 23-sep-2013 Validé par le Représentant: 25-sep-2013

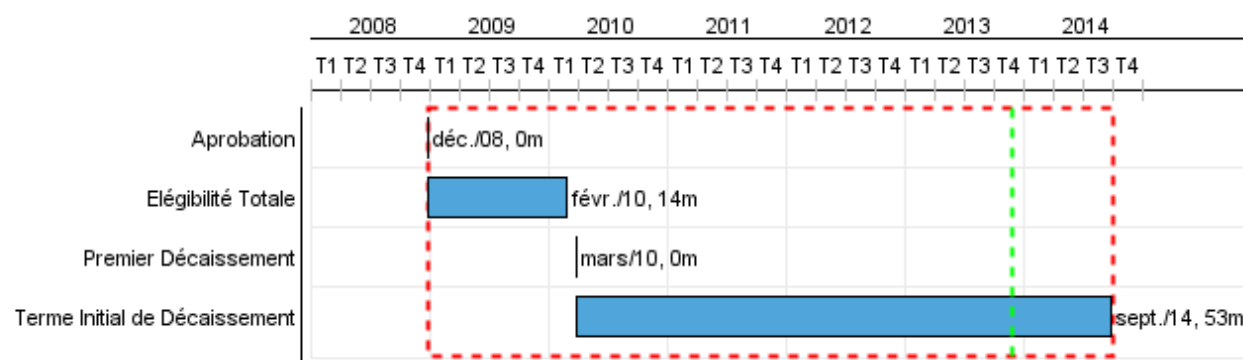

Progrès Cumulé à 2013

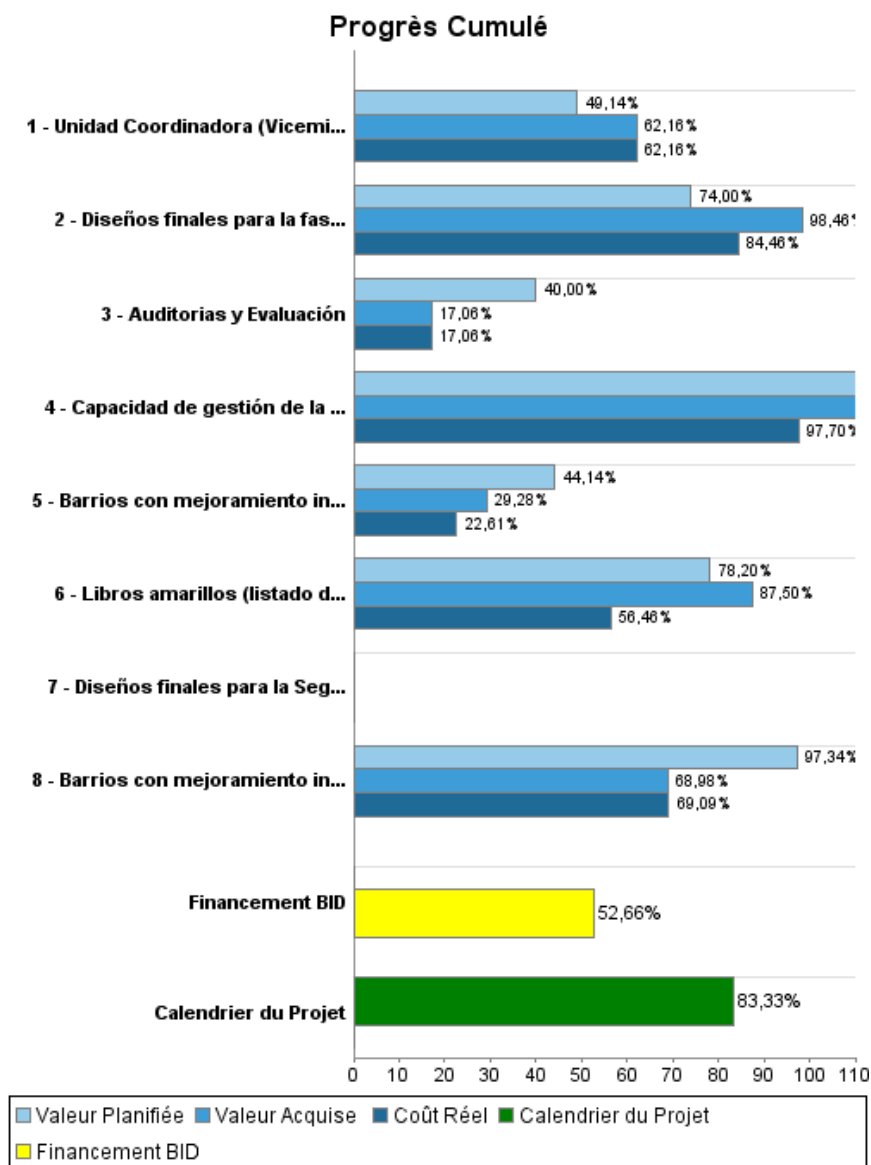

Résultats

Résultat:	Calidad de vida de los habitantes de los barrios intervenidos mejorada
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	Fin du Projet
Hogares con sistemas de suministro de agua mejorado	Hogar		2009	P	950,00	6.749,00
				A	601,00	
Hogares con sistemas sanitarios mejorado	Hogar		2009	P	900,00	7.200,00
				A	916,00	
Infraestructura social construida utilizada por la comunidad al menos una vez a la semana	Infraestructura		2009	P	5,00	31,00
				A	5,00	
Hogares con accesibilidad mejorada	Hogar		2009	P	1.200,00	7.749,00
				A	1.416,00	

Résultat:	Familias del Municipio de La Paz con seguridad jurídica de viviendas mejorada
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	Fin du Projet
Beneficiarios con folio real entregado	Folios Reales		2009	P	269,00	359,00
				A	272,00	
Beneficiarios con registro catastral entregado	Certificado de Catastro		2009	P	392,00	751,00
				A	511,00	

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente I. Mejoramiento de Barrios para el Municipio de La Paz									
Barrios con mejoramiento integral ejecutado	Barrio	4,00	1,00		20,00	2.600.000,00	929.283,00		12.923.850,00
Libros amarillos (listado de las obras en cada a barrio) difundidos	Libro				1.829,00				26.150,00
Capacidad de gestión de la Unidad Ejecutora fortalecida	Unidad Ejecutora				1,00				50.000,00
Componente II. Mejoramiento de Barrios en otros Municipios									
Barrios con mejoramiento integral ejecutado	Barrio	2,00	2,00		19,00	3.000.000,00	1.515.095,00		22.279.650,00
Diseños finales para la Segunda Fase elaborados	Diseño								
Unidad Coordinadora (Viceministerio)	n/a					33.537,90			170.000,00
Auditorias y Evaluación	n/a					20.000,00			200.000,00
Diseños finales para la fase I elaborados	Diseño	3,00	3,00		14,00	84.744,00	30.291,00		350.350,00
TOTAL						5.738.281,90	2.474.669,00		36.000.000,00
