
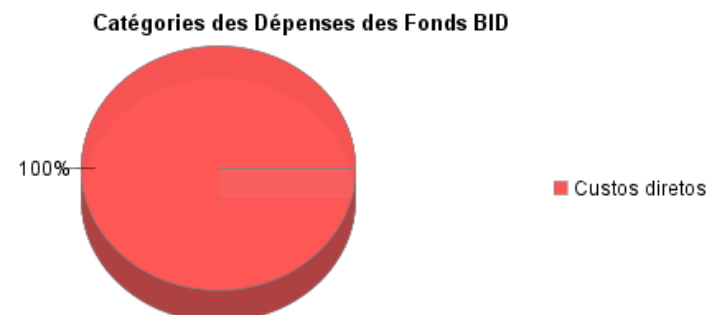
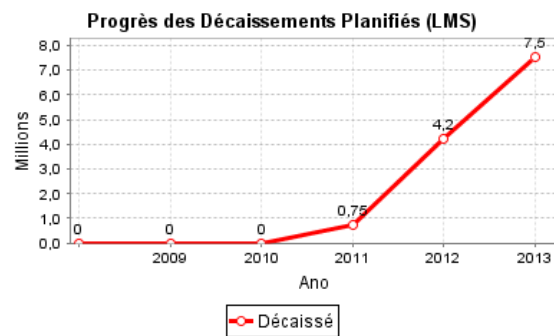



## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA				
Secteur:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING				
Numéro(s) de Prêt(s):	2054/OC-BR	Montant Courant Approuvé:	7.500.000,00	Initial BID:	7.500.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	7.500.000,00	Courant BID:	7.500.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	100,00	Pari Passu:	50,00
Opération(s) Connexe(s):	BR-L1043, BR-T1225	Solde:		Cofinancement/Pays:	7.500.000,00
Sous-Type de l'Opération:	GCR - Global Credit Operation			Estimation Initiale:	15.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B ( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 23-sep-2013 Validé par le Représentant: 25-sep-2013

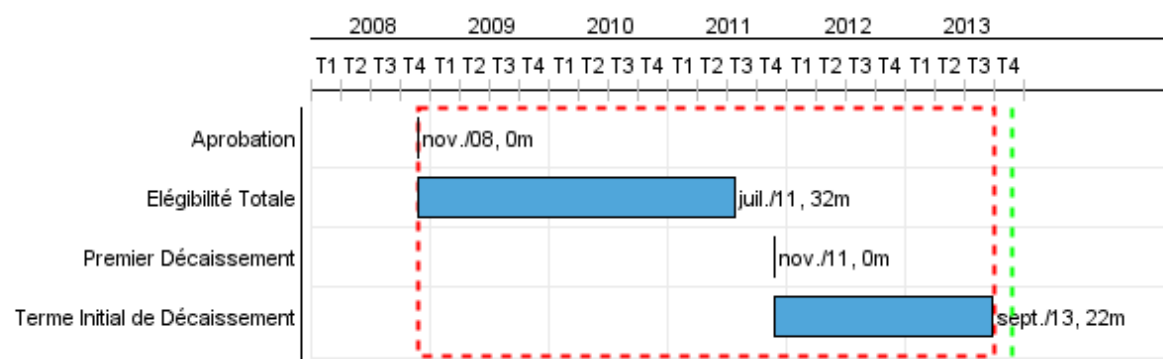

## Progrès Cumulé à 2013

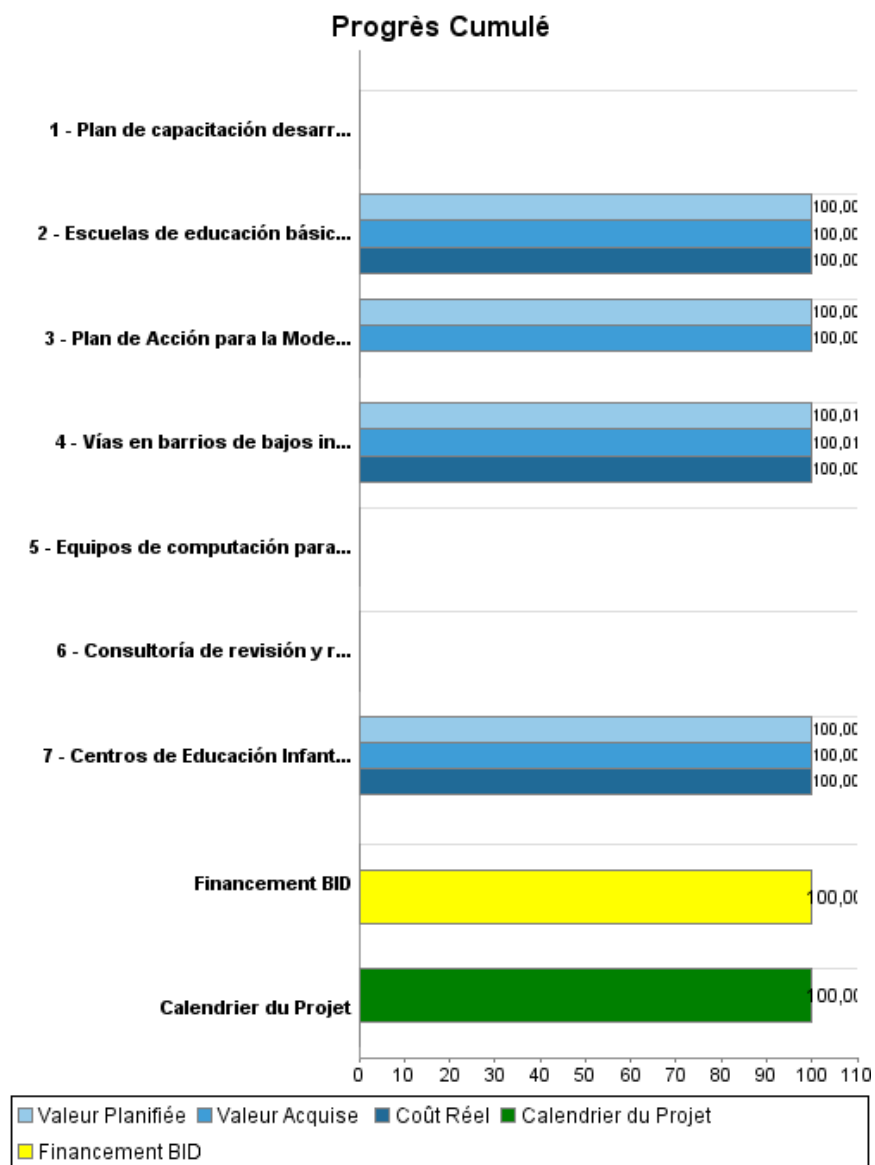

## Résultats

<b>Résultat:</b>	Mobilidad del municipio de Ponta Grossa mejorada
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Tiempo de viaje de autobuses que circulan en los tramos pavimentados	Minutos/viaje	40,00	2007	P A	38,00

<b>Résultat:</b>	Red de infraestructura escolar basica (tanto educación fundamental como educación infantil) mejorada
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Alumnos de educación básica beneficiados con las mejoras de infraestructura escolar	Estudiantes		2007	P A	10.420,00
Vagas de educação infantil	Estudiantes	3.285,00	2007	P A	3.876,00

<b>Résultat:</b>	Eficiencia de la gestión municipal de Ponta Grossa mejorada
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Tiempo medio de los procesos de licitación de la Prefeitura	Dias	65,00	2007	P A	45,00
Media de procesos de licitación de la Prefeitura realizados por año	Procesos por año	840,00	2007	P A	798,00

## Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Educación</b>									
Escuelas de educación básica remodeladas	Escuela				26,00				5.330.000,00
Centros de Educación Infantil (CEMEIs) remodelados	Escuela				5,00				1.065.000,00
<b>Mobilidad y Transporte</b>									
Vías en barrios de bajos ingresos pavimentadas	kilometer	3,90	3,90		12,30	2.133.000,00	3.412.500,00		7.612.500,00
<b>Fortalecimiento Institucional</b>									
Consultoría de revisión y racionalización de procesos y procedimientos de la PMPG realizada	relatorio		1,00		1,00				105.000,00
Equipos de computación para a unidad ejecutora adquiridos	equipamentos		1,00		1,00				157.000,00
Plan de Acción para la Modernización del Catastro Inmobiliario elaborado	Plan				1,00				210.000,00
Plan de capacitación desarrollado	Plan				1,00				52.500,00
<b>Otros</b>									
Administración del programa	N/A					100.000,00	462.000,00		462.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>2.233.000,00</b>	<b>3.874.500,00</b>		<b>14.994.000,00</b>
