

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): Estado de Amazonas
Secteur: WATER AND SANITATION
Numéro(s) de Prêt(s): 2006/OC-BR
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s): BR-L1005, BR-L1297
Sous-Type de l'Opération: PFM - Multi-Phase Lending Project

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 154.000.000,00
Montant Décaissé à ce Jour: 150.673.403,61
% Décaissé: 97,84
Solde: 3.326.596,39

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 154.000.000,00
Courant BID: 154.000.000,00
Pari Passu: 70,00
Cofinancement/Pays: 66.000.000,00
Estimation Initiale: 220.000.000,00
Période d'Amortissement (mois): 234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet




Reformulation

Validation


Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division: 09-oct-2013

Validé par le Représentant: 09-oct-2013

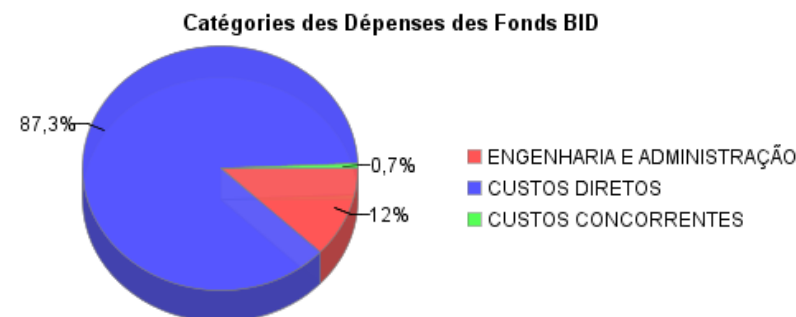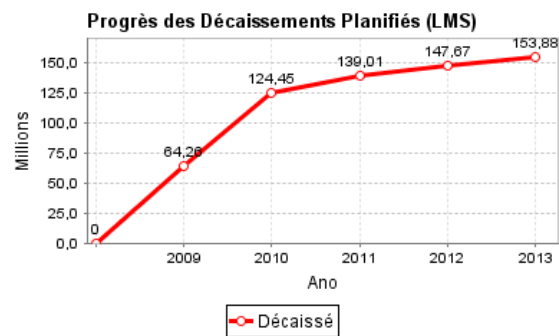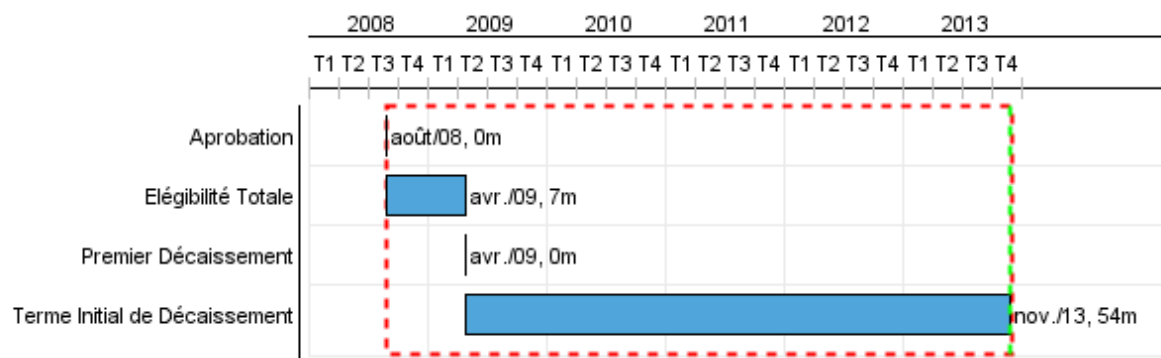

Progrès Cumulé à 2013

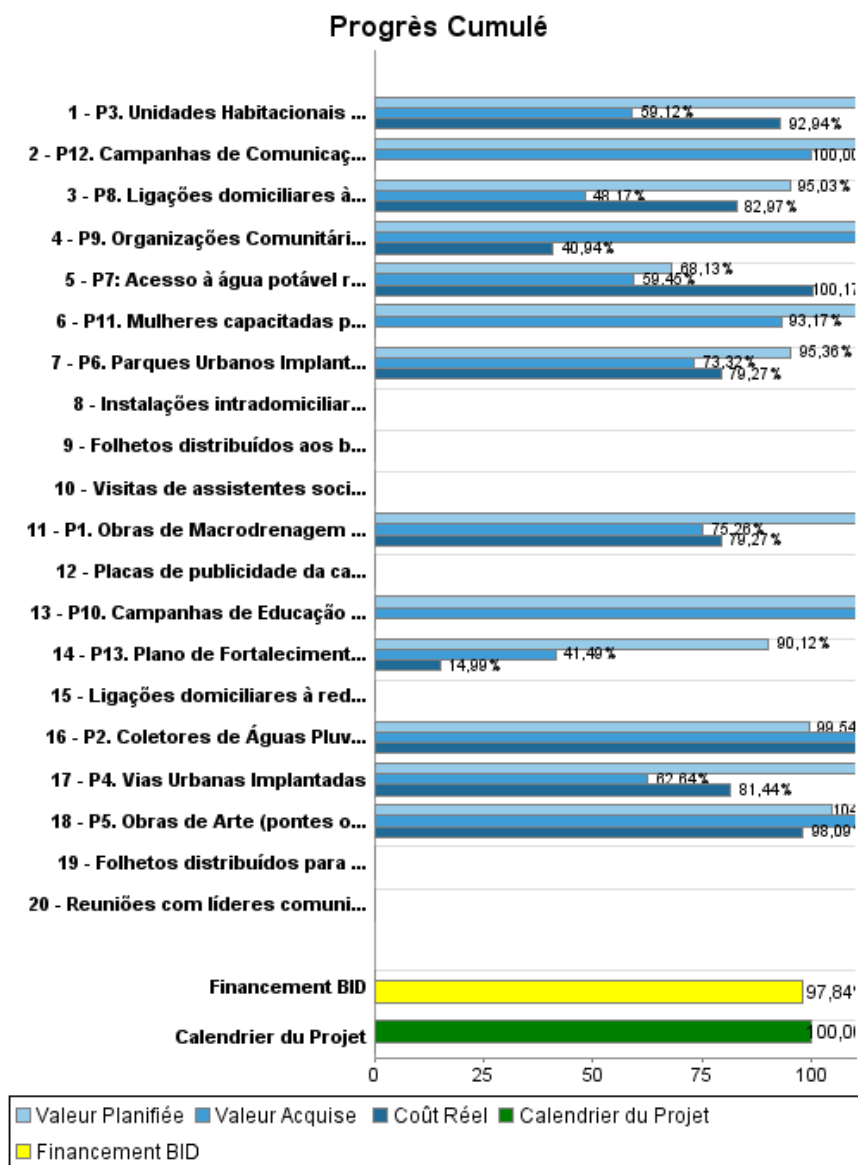

Résultats

Résultat:	Problemas socioambientais dos habitantes das bacias hidrográficas dos igarapés São Raimundo e Educandos (cidade de Manaus-AM) solucionados.
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	Fin du Projet
Coliformes termotolerantes	NMP/100ml	2.400,00	2006	P	1.000,00	1.000,00
				A	21.000.000,00	
Oxigênio dissolvido nas águas (OD).	mgO2/L	3,10	2006	P	4,20	4,20
				A	0,63	
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5).	mgO2/L	240,00	2006	P	20,00	20,00
				A	30,00	
Nitrogênio amoniacal.	mgN/L	13,00	2009	P	10,00	10,00
				A	25,20	
Demanda Química de Oxigênio (DQO).	mgO2/L	152,30	2006	P	75,00	75,00
				A	110,00	
Pessoas afetadas por inundações	pessoas	17.995,00	2006	P		
				A	13.065,00	
Casas localizadas em assentamentos precários na cidade de Manaus	casas	3.599,00	2006	P	80.500,00	2.613,00
				A	2.613,00	

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
COMPONENTE 1: Melhoria Ambiental, Urbanística e Habitacional									
P1. Obras de Macrodrenagem executadas (Canais de Água reabilitados e Galerias de Macrodrenagem construídas)	metro	1.132,90			4.901,19	9.065.520,00			27.077.920,00
P2. Coletores de Águas Pluviais construídos.	metro	2.327,47	3.054,27		9.804,00	823.580,00	1.770.990,00		3.070.350,00
P3. Unidades Habitacionais Construídas	unidade habitacional	196,00	88,00		704,00	17.800.040,00	5.539.540,00		40.518.540,00
P4. Vias Urbanas Implantadas	metro	6.521,21	5.706,80		15.000,00	9.020.040,00	520.980,00		24.007.840,00
P5. Obras de Arte (pontes ou viadutos) construídas.	obras de arte		0,20		7,00	4.888.770,00	3.799.320,00		21.160.630,00
P6. Parques Urbanos Implantados	hectare	4,20			39,85	3.692.500,00			25.131.530,00
P7: Acesso à água potável regularizado	moradia	194,00			1.340,00				886.670,00
P8. Ligações domiciliares à rede pública de esgoto instaladas	Domicílios	505,25	110,00		1.340,00	12.250.000,00	1.971.220,00		53.287.530,00
COMPONENTE 2: Sustentabilidade Social e Institucional									
P9. Organizações Comunitárias criadas	organização	4,00			34,00	30.000,00			50.000,00
P10. Campanhas de Educação Sanitária e Ambiental realizadas	campanha	44,00	25,00		174,00	200.000,00			200.000,00
P11. Mulheres capacitadas para inserção no mercado de trabalho	Indivíduos	115,00	83,00		150,00	50.000,00			50.000,00
P12. Campanhas de Comunicação Social realizadas	campanha	2,00			4,00	200.000,00			200.000,00
P13. Plano de Fortalecimento Institucional implantado	plano	1,00	1,00		1,00	1.135.200,00			4.284.000,00
COMPONENTE 3: OUTROS									
Outros Custos (unidade executora, gerenciamento, supervisão de obras, estudos e projetos, auditoria, avaliação e monitoramento)	N/A					12.794.980,00	3.898.010,00		20.075.000,00
COMPONENTE 4: Conexões à rede (Fundo Espanhol)									
Instalações intradomiciliares construídas	instalação	1.100,00				1.473.000,00			
Ligações domiciliares à rede pública de esgoto instaladas	Hogares	1.100,00				164.000,00			
COMPONENTE 5: Viabilidade social (Fundo Espanhol)									
Folhetos distribuídos para a população de Manaus	folhetos	8.000,00				377.000,00			
Placas de publicidade da campanha de sensibilização confeccionadas	placa	9,00				129.000,00			

RAPPORT DE SUIVI

BR-L1164 - Social and Environmental Program for the Manaus' Igarapés - PROSAMIM II
2013 1º período con cierre al (31-oct.-2013)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 04/10/2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Folhetos distribuídos aos beneficiários da doação	folheto	29.000,00				10.000,00			
Reuniões com líderes comunitários realizadas	reunião	13,00				4.000,00			
Visitas de assistentes sociais realizadas	visita	1.189,00				6.000,00			
COMPONENTE 6: OUTROS (Fundo Espanhol)									
Outros custos (inspeção e supervisão de obras, auditoria, avaliação, acompanhamento)	N/A					100.000,00			
TOTAL						74.213.630,00	17.500.060,00		220.000.010,00
