
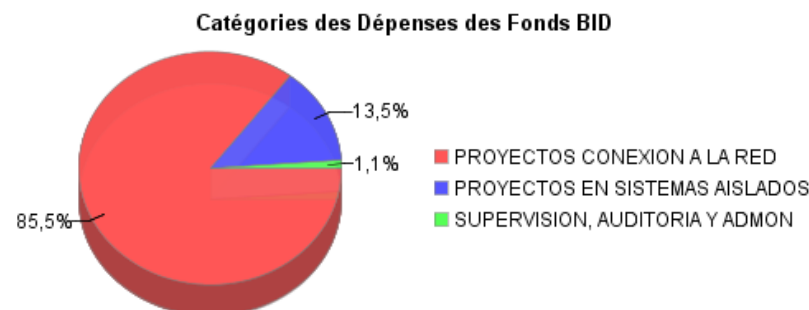
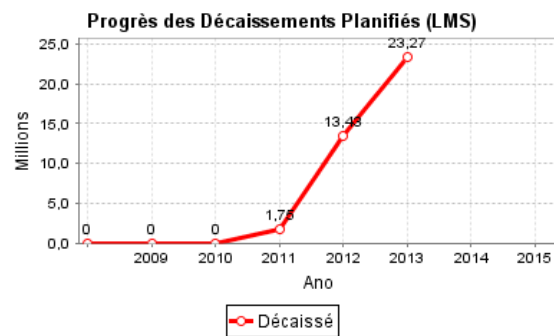



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION				
Secteur:	ENERGY-RURAL ELECTRIFICATION				
Numéro(s) de Prêt(s):	2033/OC-GU	Montant Courant Approuvé:	55.000.000,00	Initial BID:	55.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	20.306.869,11	Courant BID:	55.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	36,92	Pari Passu:	100,00
Opération(s) Connexe(s):	GU-P1043, GU-T1120	Solde:	34.693.130,89	Cofinancement/Pays:	150.000,00
Sous-Type de l'Opération:	PFM - Multi-Phase Lending Project			Estimation Initiale:	55.150.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 09-oct-2013 Validé par le Représentant: 09-oct-2013

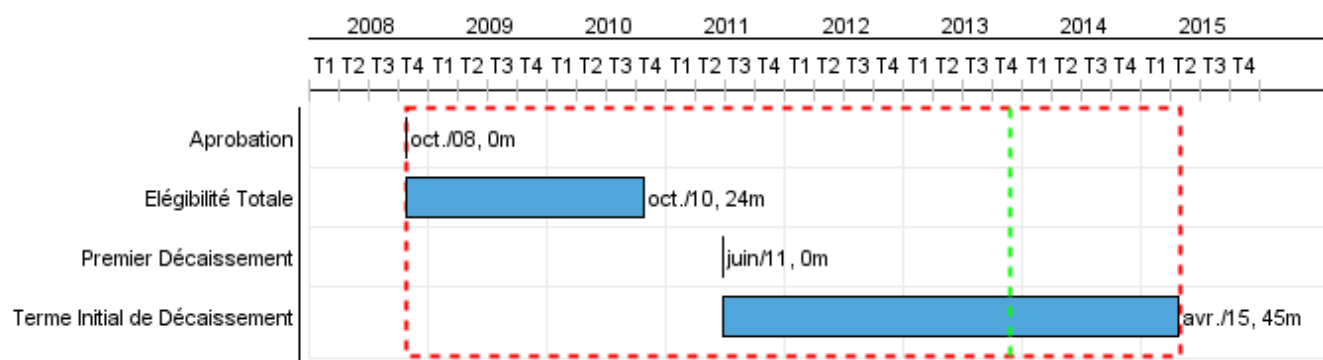

Progrès Cumulé à 2013

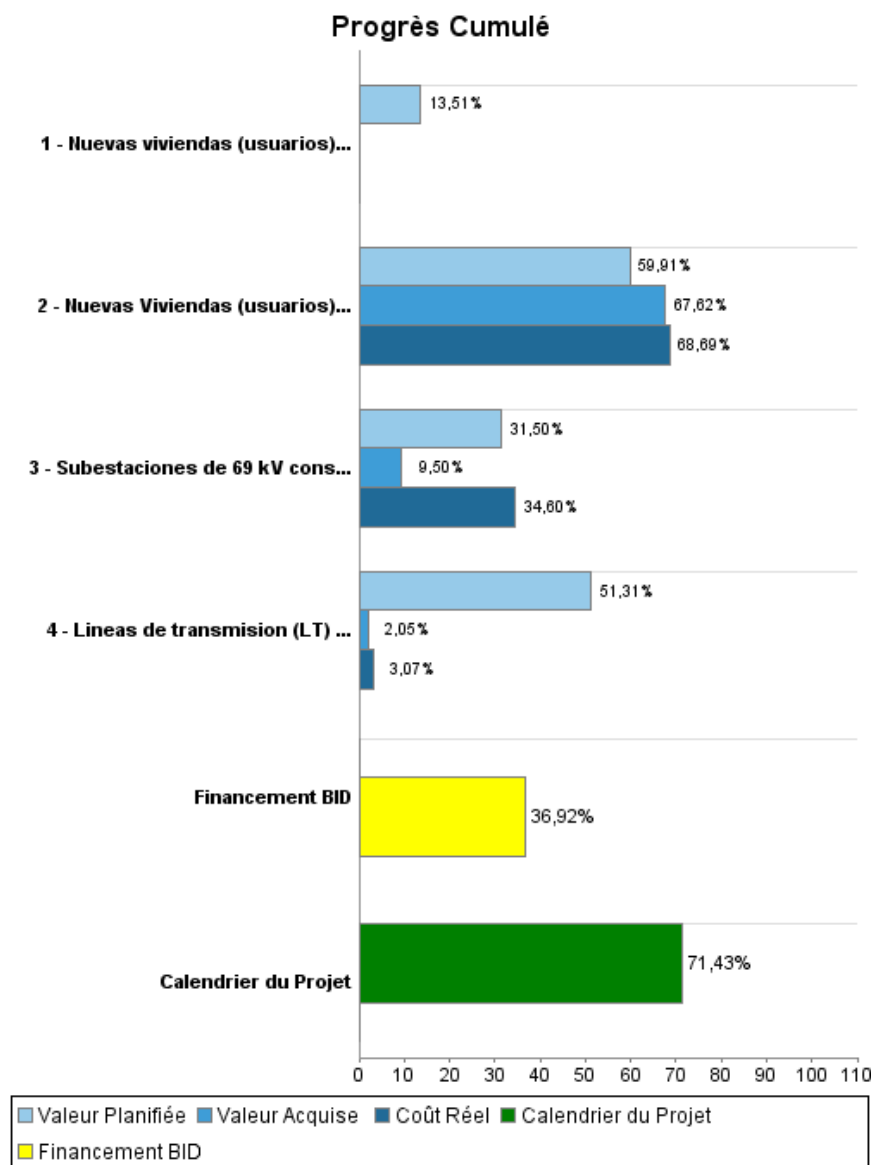

Résultats

Résultat:	Cobertura del servicio eléctrico en las comunidades rurales mejorada
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2015	Fin du Projet
Cobertura de electrificación rural a nivel nacional	Porcentaje	82,60	2007	P A		85,90
Cobertura de electrificación en los municipios más pobres priorizados.	Porcentaje	66,10	2007	P A		73,90

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente 1 - Electrificación rural mediante conexión a la red eléctrica.									
Nuevas Viviendas (usuarios) conectadas a la red nacional	viviendas	6.986,00	6.684,00		25.751,00	6.090.000,00	5.727.000,00		23.400.000,00
Lineas de transmision (LT) del PER, construidas	Kilómetros	61,00			175,00	4.969.000,00			15.400.000,00
Subestaciones de 69 kV construidas	subestaciones	2,00			6,00	755.000,00	381.000,00		8.200.000,00
Componente 2 - Electrificación rural en sistemas aislados.									
Nuevas viviendas (usuarios) electrificadas en zonas aisladas	viviendas	334,00			5.000,00	1.000.000,00			7.400.000,00
Componente 3 - Apoyo a la administración del Programa y supervisión.									
Supervisión, auditoria y administración	N/A					100.000,00	9.000,00		750.000,00
TOTAL						12.914.000,00	6.117.000,00		55.150.000,00
