

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA S.A.
Secteur: ENERGY-NEW POWER DISTRIBUTION & TRANSMISSION PROJECTS
Numéro(s) de Prêt(s): 2024/OC-PN
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 12.500.000,00
Montant Décaissé à ce Jour: 11.342.330,40
% Décaissé: 90,74
Solde: 1.157.669,60

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 12.500.000,00
Courant BID: 12.500.000,00
Pari Passu: 50,00
Cofinancement/Pays: 12.500.000,00
Estimation Initiale: 25.000.000,00
Période d'Amortissement (mois): 234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet




Reformulation

Validation


Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division: 09-oct-2013

Validé par le Représentant: 09-oct-2013

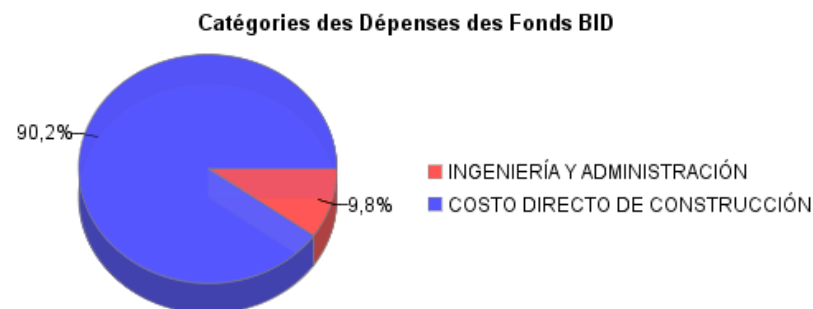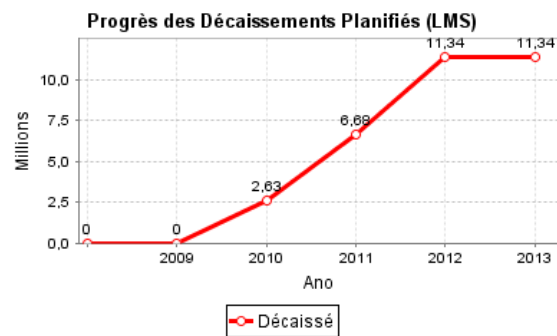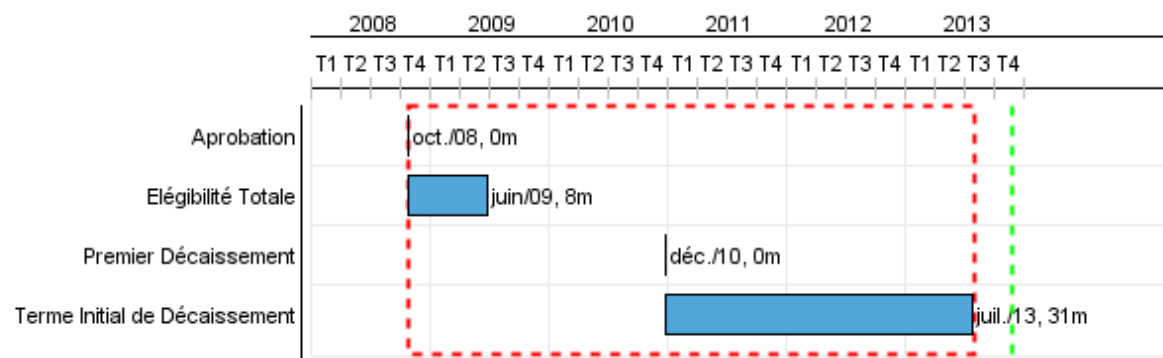

Progrès Cumulé à 2013

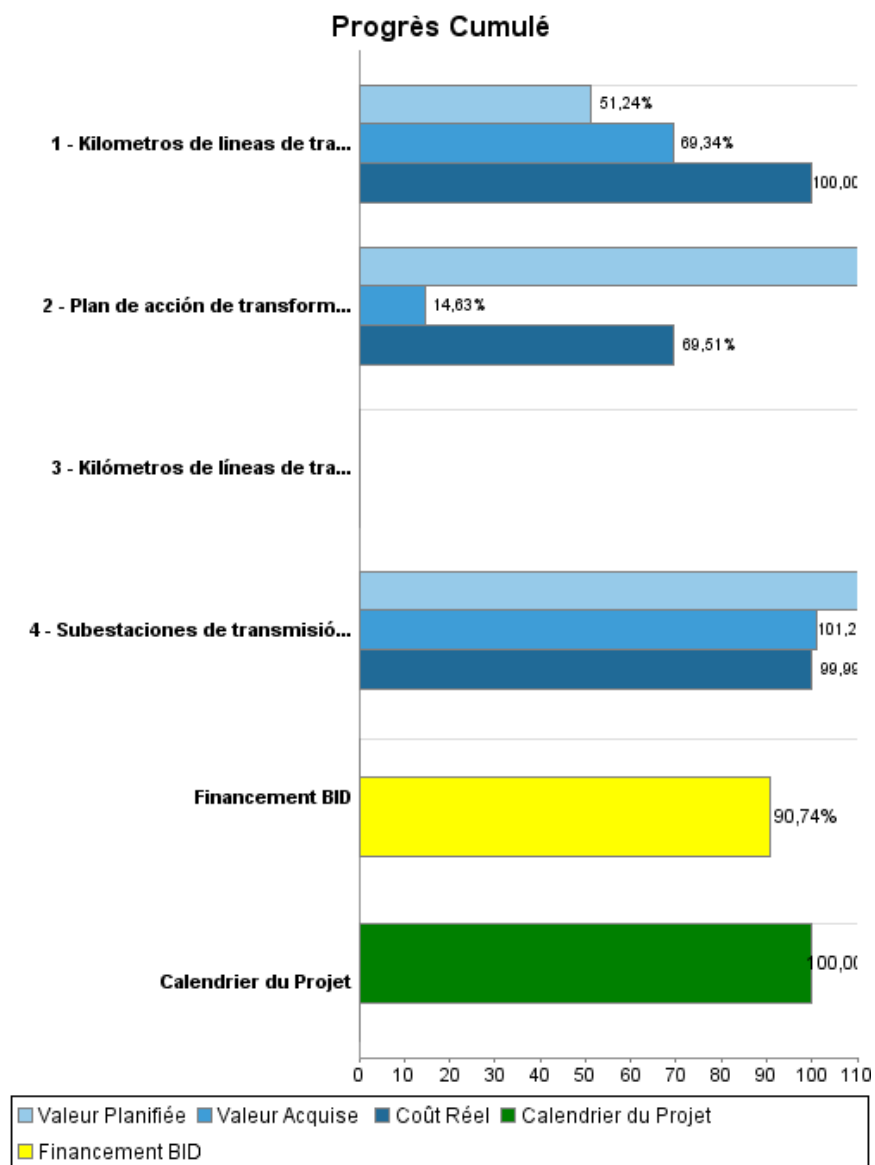

Résultats

Résultat:	Crecimiento de la demanda de energía eléctrica atendido.
Suposições:	Manteniendo niveles adecuados de calidad, confiabilidad y costo.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Electricidad suministrada al Sistema Interconectado Nacional	Gwh	8.412,90	2008	P A	8.881,90
Potencia entregada al Sistema Interconectado Nacional.	MW	1.356,50	2008	P A	1.431,20

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente 1.1 - Inversiones en la red de transmisión eléctrica- Proyecto Colón Fase II									
Kilómetros de líneas de transmisión eléctricas construidas (Proyecto Colón Fase II)	Kilometers	33,00			48,00				
Subestaciones de transmisión ampliadas (Proyecto Colón Fase II, Subestación de Santa Rita y Pedregal)	Subestaciones	2,00	0,29		2,00	2.694.003,00	337.163,00		4.432.000,00
Componente 1.2 - Inversiones en la red de transmisión eléctrica - Proyecto Guasquitas - Changuinola									
Kilometros de lineas de transmisión eléctrica construida (Proyecto Guasquitas -Changuinola)	Kilometers				121,00				17.622.000,00
Componente 2 - Actividades de transformación corporativa									
Plan de acción de transformación corporativa implementado	Plan	1,00			1,00	100.000,00			328.000,00
Gastos sin Asignación Específica									
Gastos sin asignación específica	N/A					1.810.000,00			1.810.000,00
Gastos Financieros									
Costos Financieros	N/A					1.510.000,00			1.527.000,00
TOTAL						6.114.003,00	337.163,00		25.719.000,00
