

## Informe Resumido

### Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
Sector:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-HOUSING
Número(s) de Préstamo:	2082/BL-BO
Etapas:	Approved
Tipo de Operación:	INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):	BO-P1012, BO-T1093, BO-T1133
Subtipo de Operación:	PFM - Proyecto de Fases Múltiples

### Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual:	30.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:	15.796.945,24
% Desembolsado:	52,66
Saldo:	14.203.054,76

### Costo total y Fuente

BID Original:	30.000.000,00
Actual BID:	30.000.000,00
Pari-passu:	83,00
Co-financiamiento/País:	6.000.000,00
Estimado Original:	36.000.000,00
Período de Amortización (meses):	282

### Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto



Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno

### Reformulación


( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

### Validación


Validado por el Jefe de División: 23-sep-2013  
Validado por Representante de País: 25-sep-2013

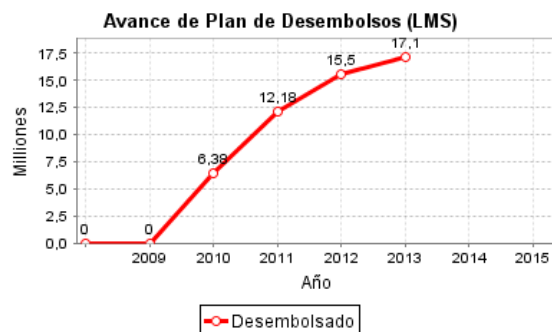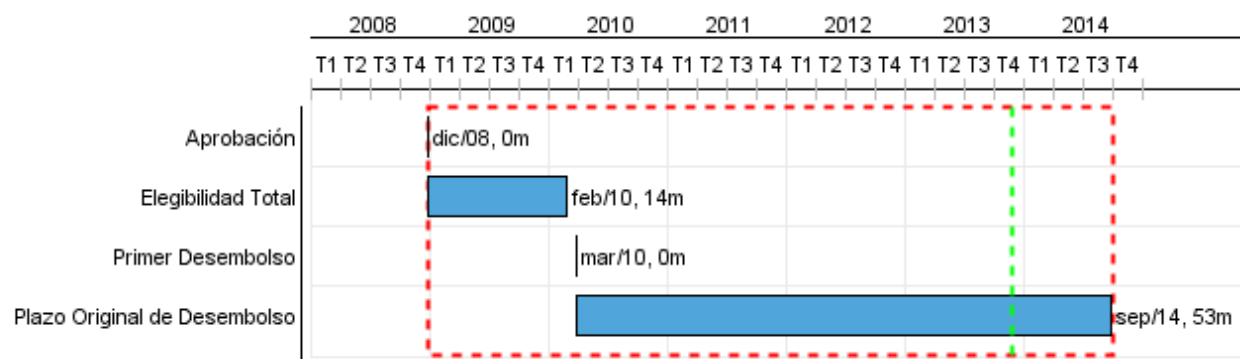

### Categorías de Gasto-Fondos BID



## Progreso Acumulado al 2013

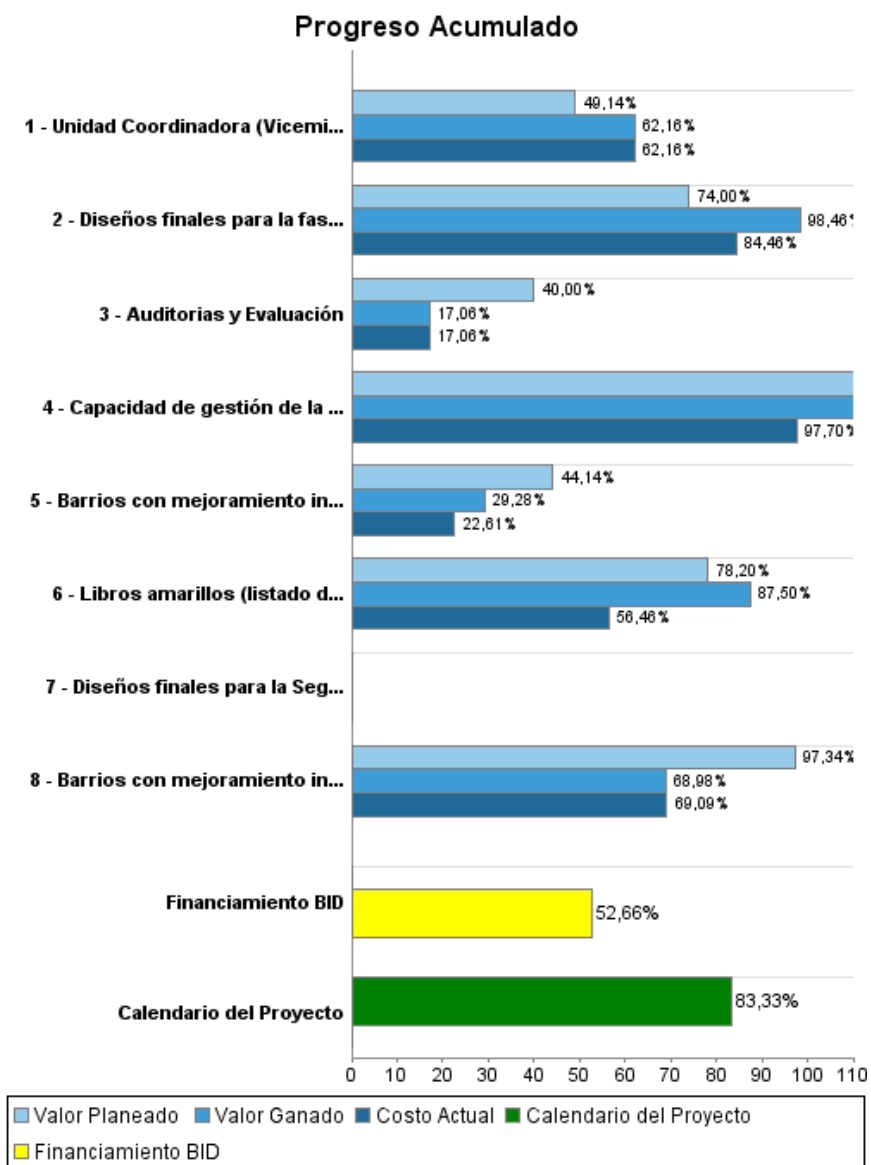

## Resultados

<b>Resultado:</b>	Calidad de vida de los habitantes de los barrios intervenidos mejorada
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	Fin de Proyecto
Hogares con sistemas de suministro de agua mejorado	Hogar		2009	P	950,00	6.749,00
				A	601,00	
Hogares con sistemas sanitarios mejorado	Hogar		2009	P	900,00	7.200,00
				A	916,00	
Infraestructura social construida utilizada por la comunidad al menos una vez a la semana	Infraestructura		2009	P	5,00	31,00
				A	5,00	
Hogares con accesibilidad mejorada	Hogar		2009	P	1.200,00	7.749,00
				A	1.416,00	

<b>Resultado:</b>	Familias del Municipio de La Paz con seguridad jurídica de viviendas mejorada
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	Fin de Proyecto
Beneficiarios con folio real entregado	Folios Reales		2009	P	269,00	359,00
				A	272,00	
Beneficiarios con registro catastral entregado	Certificado de Catastro		2009	P	392,00	751,00
				A	511,00	

## Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>Componente I. Mejoramiento de Barrios para el Municipio de La Paz</b>									
Barrios con mejoramiento integral ejecutado	Barrio	4,00	1,00		20,00	2.600.000,00	929.283,00		12.923.850,00
Libros amarillos (listado de las obras en cada a barrio) difundidos	Libro				1.829,00				26.150,00
Capacidad de gestión de la Unidad Ejecutora fortalecida	Unidad Ejecutora				1,00				50.000,00
<b>Componente II. Mejoramiento de Barrios en otros Municipios</b>									
Barrios con mejoramiento integral ejecutado	Barrio	2,00	2,00		19,00	3.000.000,00	1.515.095,00		22.279.650,00
Diseños finales para la Segunda Fase elaborados	Diseño								
Unidad Coordinadora (Viceministerio)	n/a					33.537,90			170.000,00
Auditorías y Evaluación	n/a					20.000,00			200.000,00
Diseños finales para la fase I elaborados	Diseño	3,00	3,00		14,00	84.744,00	30.291,00		350.350,00
<b>TOTAL</b>						<b>5.738.281,90</b>	<b>2.474.669,00</b>		<b>36.000.000,00</b>
