

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1099 - PROCIDADES-Programa Mejoramiento Infraestructura Urbana Municipio
Ponta Grossa
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID




Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 12/09/2013


Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA				
Sector:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING				
Número(s) de Préstamo:	2054/OC-BR	Monto Aprobado Actual:	7.500.000,00	BID Original:	7.500.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	7.500.000,00	Actual BID:	7.500.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	100,00	Pari-passu:	50,00
Operación(es) Relacionada(s):	BR-L1043, BR-T1225	Saldo:		Co-financiamiento/País:	7.500.000,00
Subtipo de Operación:	GCR - Operación Global de Crédito			Estimado Original:	15.000.000,00
				Período de Amortización (meses):	234

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:	B () ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 23-sep-2013 Validado por Representante de País: 25-sep-2013

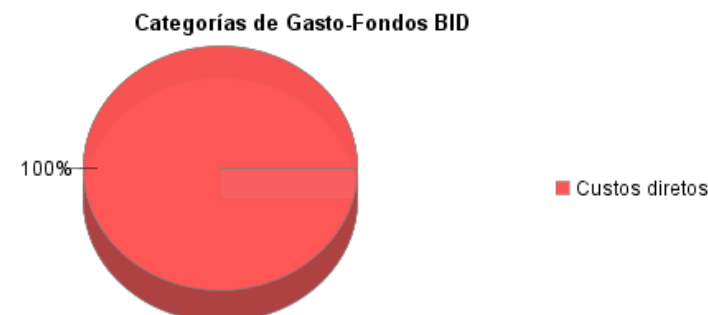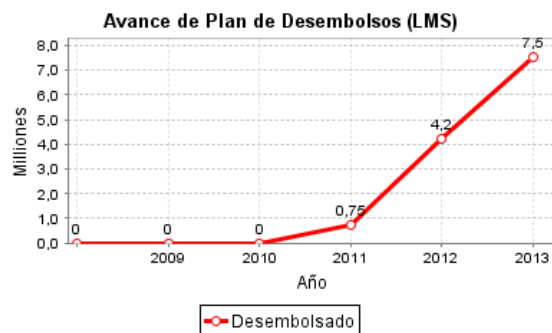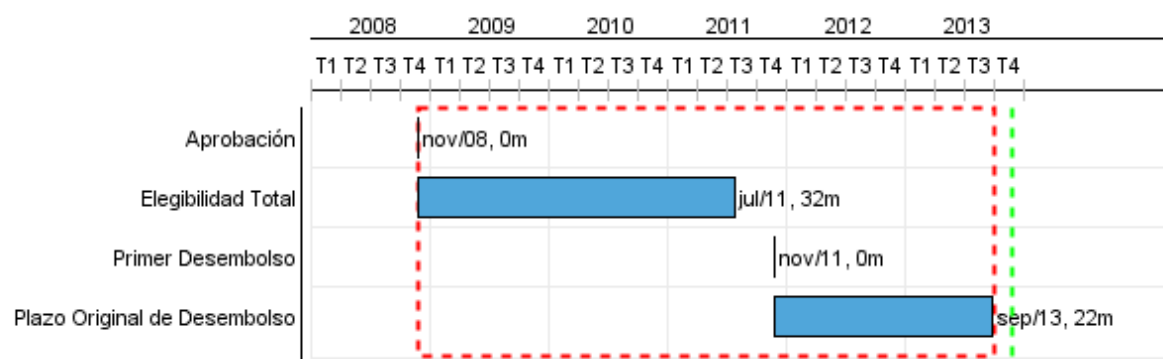

Progreso Acumulado al 2013

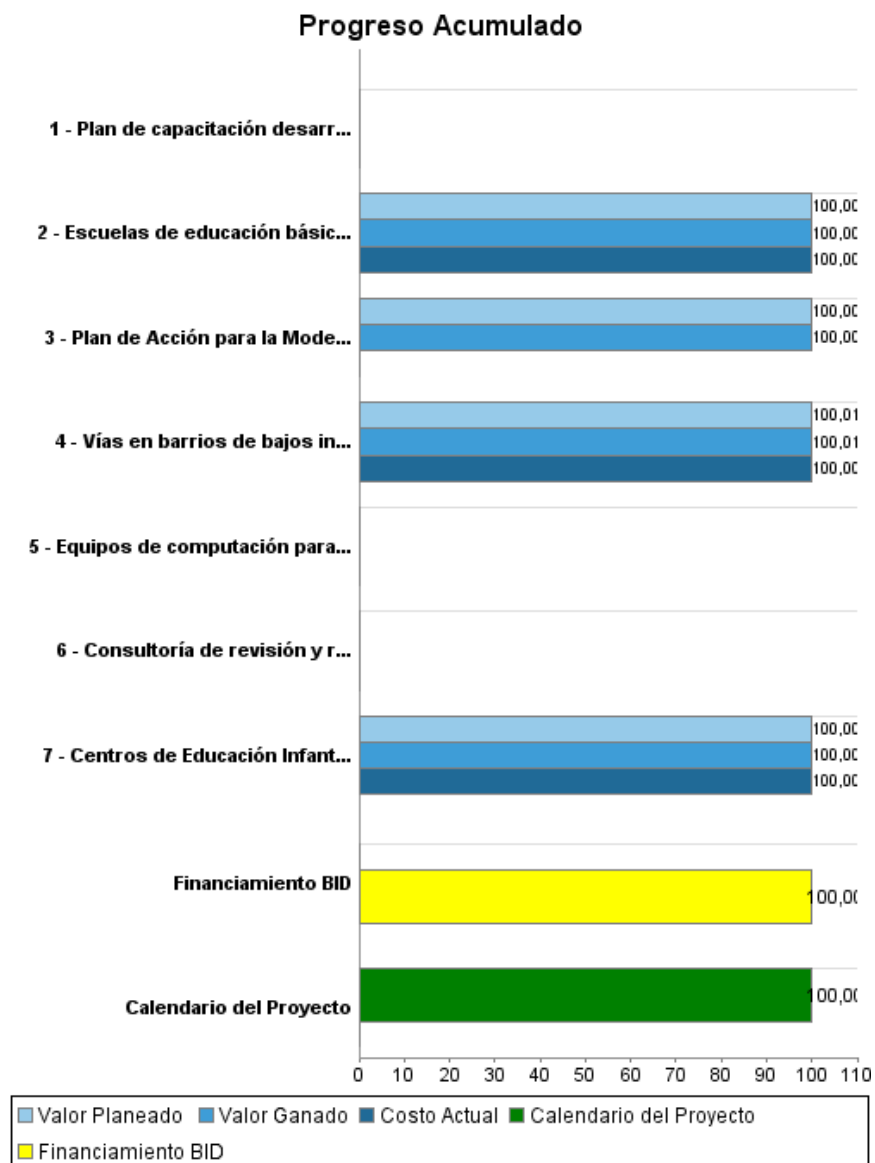

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1099 - PROCIDADES-Programa Mejoramiento Infraestructura Urbana Municipio
Ponta Grossa
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 12/09/2013

Resultados

Resultado: Movilidad del municipio de Ponta Grossa mejorada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Tiempo de viaje de autobuses que circulan en los tramos pavimentados	Minutos/viaje	40,00	2007	P	38,00
				A	

Resultado: Red de infraestructura escolar basica (tanto educación fundamental como educación infantil) mejorada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Alumnos de educación básica beneficiados con las mejoras de infraestructura escolar	Estudiantes		2007	P	10.420,00
				A	
Vagas de educação infantil	Estudiantes	3.285,00	2007	P	3.876,00
				A	

Resultado: Eficiencia de la gestión municipal de Ponta Grossa mejorada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Tiempo medio de los procesos de licitación de la Prefeitura	Dias	65,00	2007	P	45,00
				A	
Media de procesos de licitación de la Prefeitura realizados por año	Procesos por año	840,00	2007	P	798,00
				A	

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1099 - PROCIDADES-Programa Mejoramiento Infraestructura Urbana Municipio
Ponta Grossa
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 12/09/2013

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Educación									
Escuelas de educación básica remodeladas	Escuela				26,00				5.330.000,00
Centros de Educación Infantil (CEMEIs) remodelados	Escuela				5,00				1.065.000,00
Mobilidad y Transporte									
Vías en barrios de bajos ingresos pavimentadas	kilometer	3,90	3,90		12,30	2.133.000,00	3.412.500,00		7.612.500,00
Fortalecimiento Institucional									
Consultoría de revisión y racionalización de procesos y procedimientos de la PMPG realizada	relatorio		1,00		1,00				105.000,00
Equipos de computación para a unidad ejecutora adquiridos	equipamentos		1,00		1,00				157.000,00
Plan de Acción para la Modernización del Catastro Inmobiliario elaborado	Plan				1,00				210.000,00
Plan de capacitación desarrollado	Plan				1,00				52.500,00
Otros									
Administración del programa	N/A					100.000,00	462.000,00		462.000,00
TOTAL						2.233.000,00	3.874.500,00		14.994.000,00
