

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
Sector: URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING
Número(s) de Préstamo: 1960/OC-BR
Etapas: Approved
Tipo de Operación: INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s): BR-L1043, BR-T1225
Subtipo de Operación: GOM - Operación Global de Obras Múltiples

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual: 19.382.000,00
Monto Desembolsado a la fecha: 19.277.997,87
% Desembolsado: 99,46
Saldo: 104.002,13

Costo total y Fuente

BID Original: 19.382.000,00
Actual BID: 19.382.000,00
Pari-passu: 50,00
Co-financiamiento/País: 19.382.000,00
Estimado Original: 38.764.000,00
Período de Amortización (meses): 234

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno

Reformulación


() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División: 23-sep-2013
Validado por Representante de País: 25-sep-2013

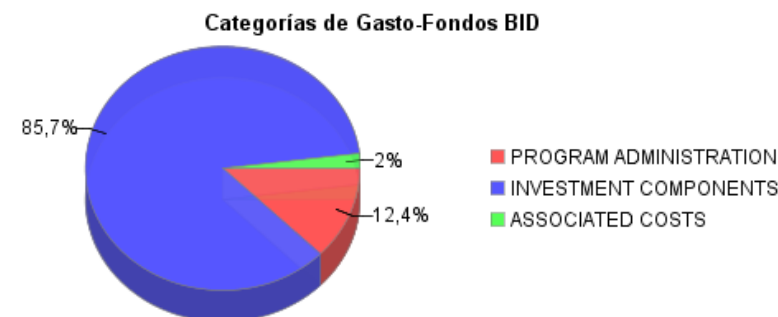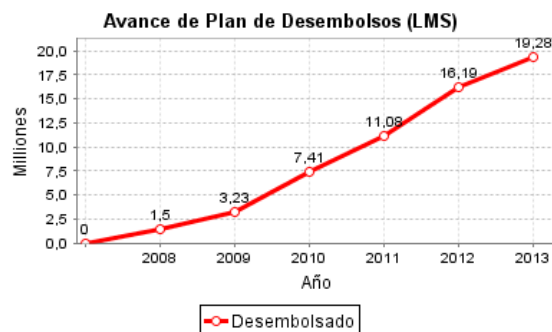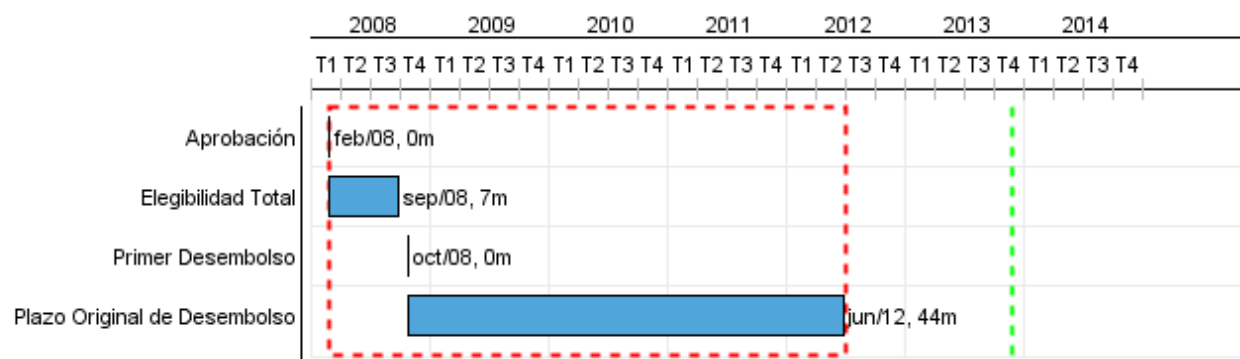

Progreso Acumulado al 2013

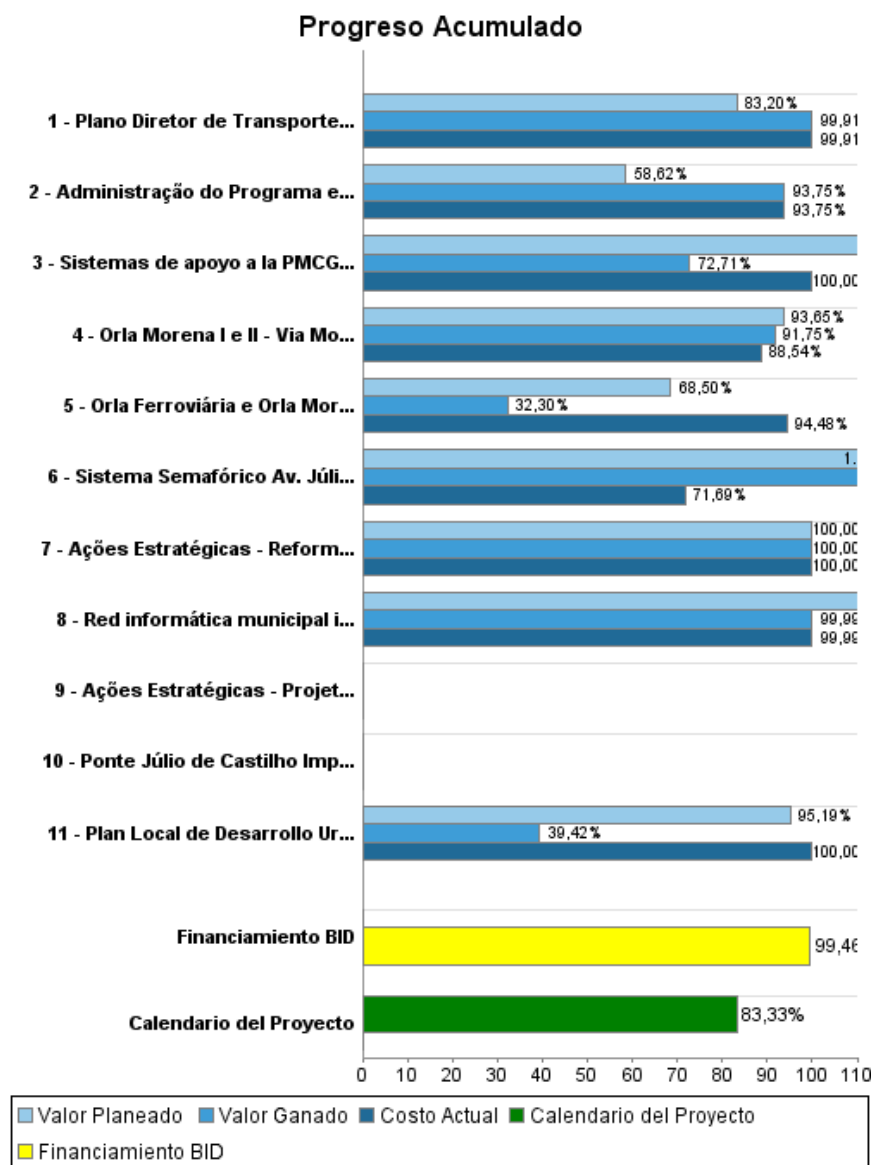

Resultados

Resultado: Área central de la ciudad revitalizada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	Fin de Proyecto
Valor promedio de los inmuebles residenciales en el Centro.	Valor en R\$/ m2	75,12	2007	P A		97,65
Número de licencias de funcionamiento concedidas anualmente para comercio y servicios en el Centro.	Licencias de funcionamiento anuales	172,00	2006	P A		189,00

Resultado: Movilidad de la ciudad mejorada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	Fin de Proyecto
Tiempo de viaje para usuarios del transporte colectivo entre el área Oeste y el Centro (Aeroporto Praça Newton Cavalcanti)	Minutos	9,32	2007	P A		6,99
Tiempo de viaje para usuarios del transporte privado entre el área Oeste y el Centro (Aeroporto - Praça Newton Cavalcanti)	Minutos	8,25	2007	P A	7,02	6,19
Tiempo de viaje para usuarios del transporte colectivo dentro del Centro en la Calle Alfonso Pena	Minutos	8,15	2007	P A	5,29	6,11
Tiempo de viaje para usuarios del transporte particular dentro del Centro en la Calle Alfonso Pena	Minutos	7,20	2007	P A		5,04
Tiempo de viaje para usuarios del transporte colectivo entre el área Oeste y el Centro (Terminal Julio de Castilho - Av. Tamandaré)	Minutos	14,30	2007	P A		10,72

Resultado: Gestión administrativa de la Prefeitura Municipal de Campo Grande mejorada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	Fin de Proyecto
Reducción del 50% en costos de comunicación, incluyendo consumo telefónico, datos y redes de voz (internet e intranet) y datos corporativos del Ayuntamiento.	US\$ millones anuales	2,70	2007	P A		1,35
20% de reducción en los plazos para llevar a cabo el proceso de licenciamiento ambiental.	Días	120,00	2007	P A	1,27	96,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Revitalización del Centro									
Plan Local de Desarrollo Urbano del Centro desarrollado y aprobado por el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano (CMDU)	Plan Local de Desarrollo Urbano				1,00				472.761,00
Orla Ferroviária e Orla Morena II - Espaços públicos recuperados (parques lineares)	Metros cuadrados	7.000,00			103.863,00	418.112,93	257.956,81		2.897.112,93
Ações Estratégicas - Projetos executivos Identificados Plano Local	Projetos				2,00				453.533,74
Ações Estratégicas - Reforma casas históricas Esplanada Ferroviários	reforma				2,00				609.688,00
Movilidad Urbana									
Orla Morena I e II - Via Morena - Júlio de Castilho - Vias implantadas	Km	2,00	3,00		25,79	2.000.000,00	1.537.278,86		32.411.896,05
Sistema Semafórico Av. Júlio de Castilho - Implantado	Sistema semafórico centralizado				1,00		268.245,88		738.269,44
Plano Diretor de Transportes atualizado	Plan Director de Transportes				1,00				311.000,00
Ponte Júlio de Castilho Implantadas	Ponte				1,00				308.054,36
Fortalecimiento Institucional									
Red informática municipal instalada (con 6 estaciones básicas y conexión de 274 puntos clientes)	Red Informática				1,00				700.000,00
Sistemas de apoyo a la PMCG implantados (software de licenciamiento ambiental e aquisição de equipamentos de informática)	Sistemas Implantados				2,00				319.707,18
Otros									
Administração do Programa e Gastos Correntes	No aplica					965.000,00	773.242,19		7.393.901,33
TOTAL						3.383.112,93	2.836.723,74		46.615.924,03
