

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	COMITE EJECUTOR MATANZA-RICHUELO
Sector:	WATER AND SANITATION-SEWERAGE
Número(s) de Préstamo:	1059/OC-AR
Etapas:	Approved
Tipo de Operación:	INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):	AR0217
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual:	250.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:	230.991.696,29
% Desembolsado:	92,40
Saldo:	19.008.303,71

Costo total y Fuente

BID Original:	250.000.000,00
Actual BID:	250.000.000,00
Pari-passu:	80,51
Co-financiamiento/País:	250.000.000,00
Estimado Original:	500.000.000,00
Período de Amortización (meses):	150

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B

Reformulación


() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División: Apr 26, 2011
Validado por Representante de País: Apr 28, 2011

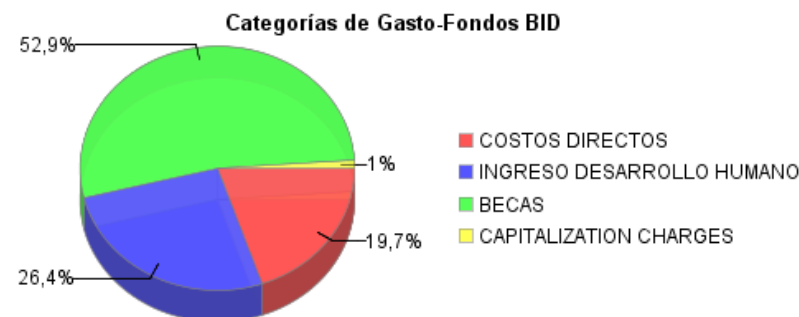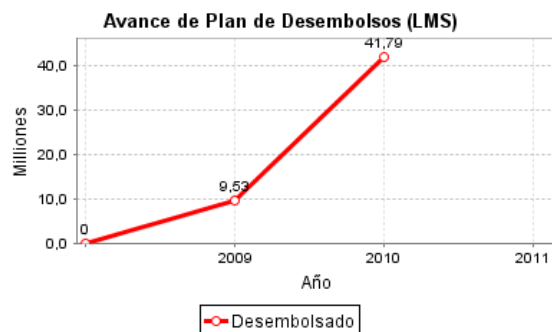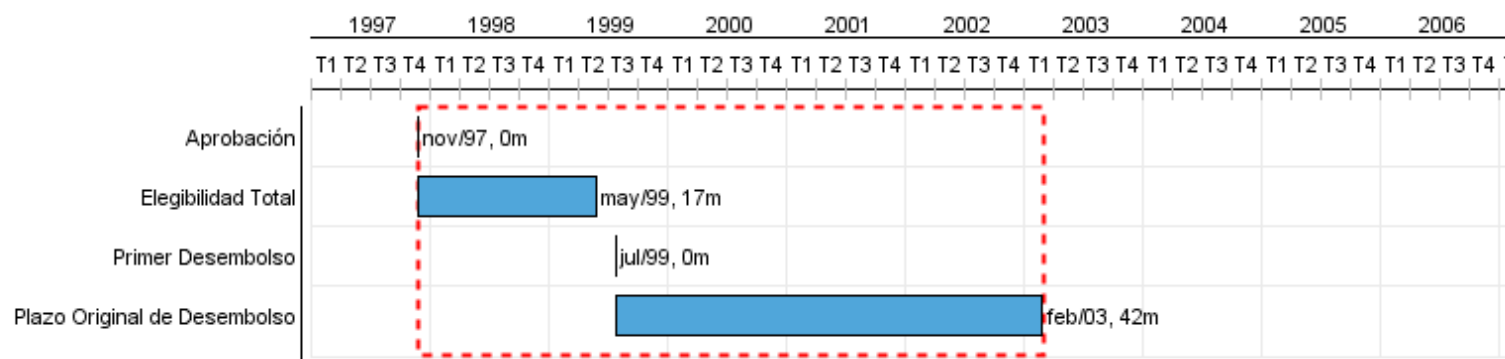

Progreso Acumulado al 2010

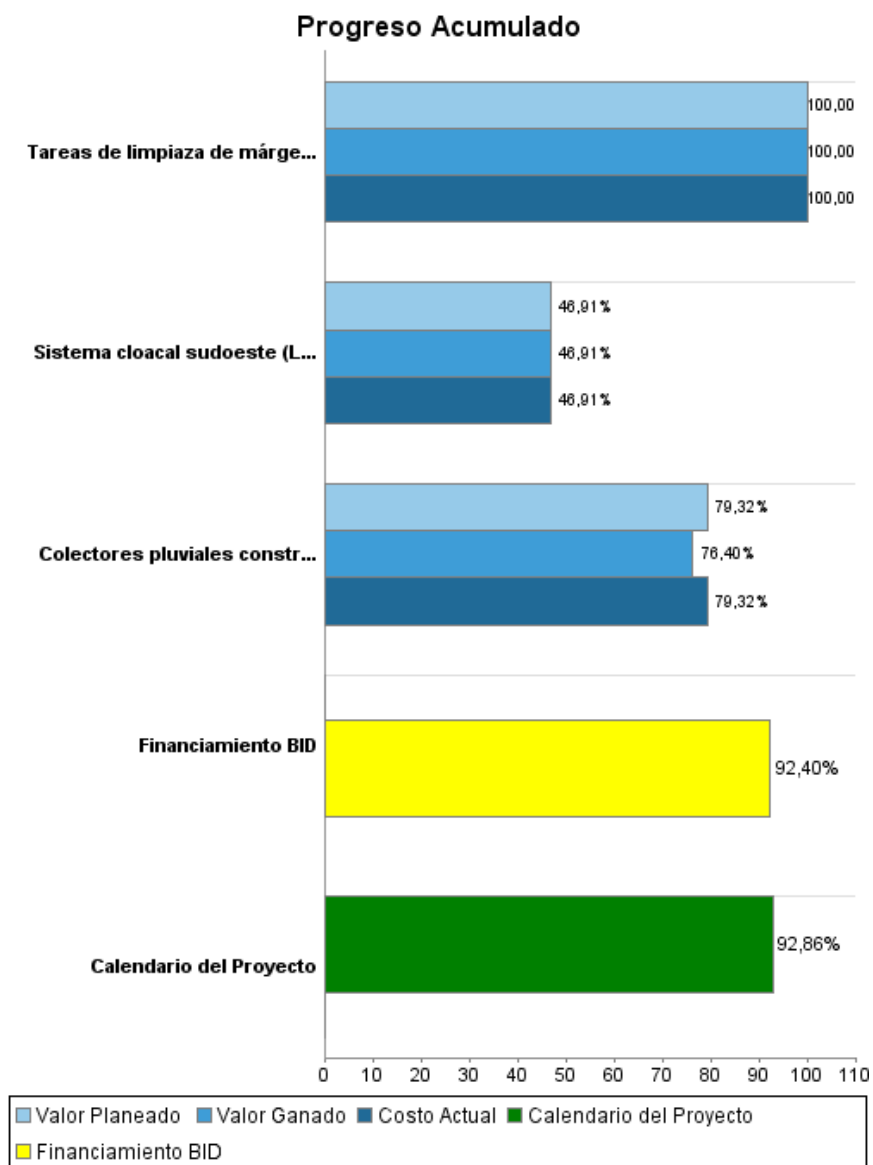

Resultados

Resultado:	Cobertura de saneamiento en la cuenca Matanza-Riachuelo incrementada
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2015	Fin de Proyecto
Hogares con servicio de saneamiento nuevo	Hogares		2006	P A		49.000,00

Resultado:	Riesgo de inundaciones reducido
-------------------	---------------------------------

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2015	Fin de Proyecto
Habitantes beneficiados por las obras de drenaje pluvial	habitantes		2006	P A		427.000,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Obras de drenaje urbano									
Colectores pluviales construidos	km	9,50	6,30		32,30	2.504.907,00	2.504.907,00		28.946.000,00
Limpieza de márgenes									
Tareas de limpieza de márgenes concluidas	Contratos concluidos	1,00	1,00		1,00				1.451.000,00
Saneamiento cloacal									
Sistema cloacal sudoeste (LaFerrere) construido	Plantas				1,00	19.719.058,00	19.719.058,00		59.498.000,00
Administración, supervisión y costos financieros									
TOTAL						22.223.965,00	22.223.965,00		89.895.000,00
