



Operation Number: **BO-L1013**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2014**
Last Update: **10/13/2014**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **10/21/2014**
Division Chief validation date: **10/21/2014**
Country Representative validation date: **11/04/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Small Community Water Program	Loan Number:	1927/BL-BO,1927/OC-BO-DE,1927/SF-BO-DE
Executing Agency (EA):	FND NAC.DE INVER. PRODUCTIVA Y SOCIAL ,FND NAC.DE INVER. PRODUCTIVA Y SOCIAL ,FND NAC.DE INVER. PRODUCTIVA Y SOCIAL		
Team Leader:	Orellana Arevalo,Edgar R.	Sector/Subsector:	AS
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Closed (All the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BOLIVIA
Borrower:	REPUBLICA DE BOLIVIA ,REPUBLICA DE BOLIVIA ,REPUBLICA DE BOLIVIA	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BO-L1013	\$21,000,000.00	\$21,000,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$24,500,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BO-L1013	\$21,000,000.00	\$20,812,785.28	99.11%	\$187,214.72


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

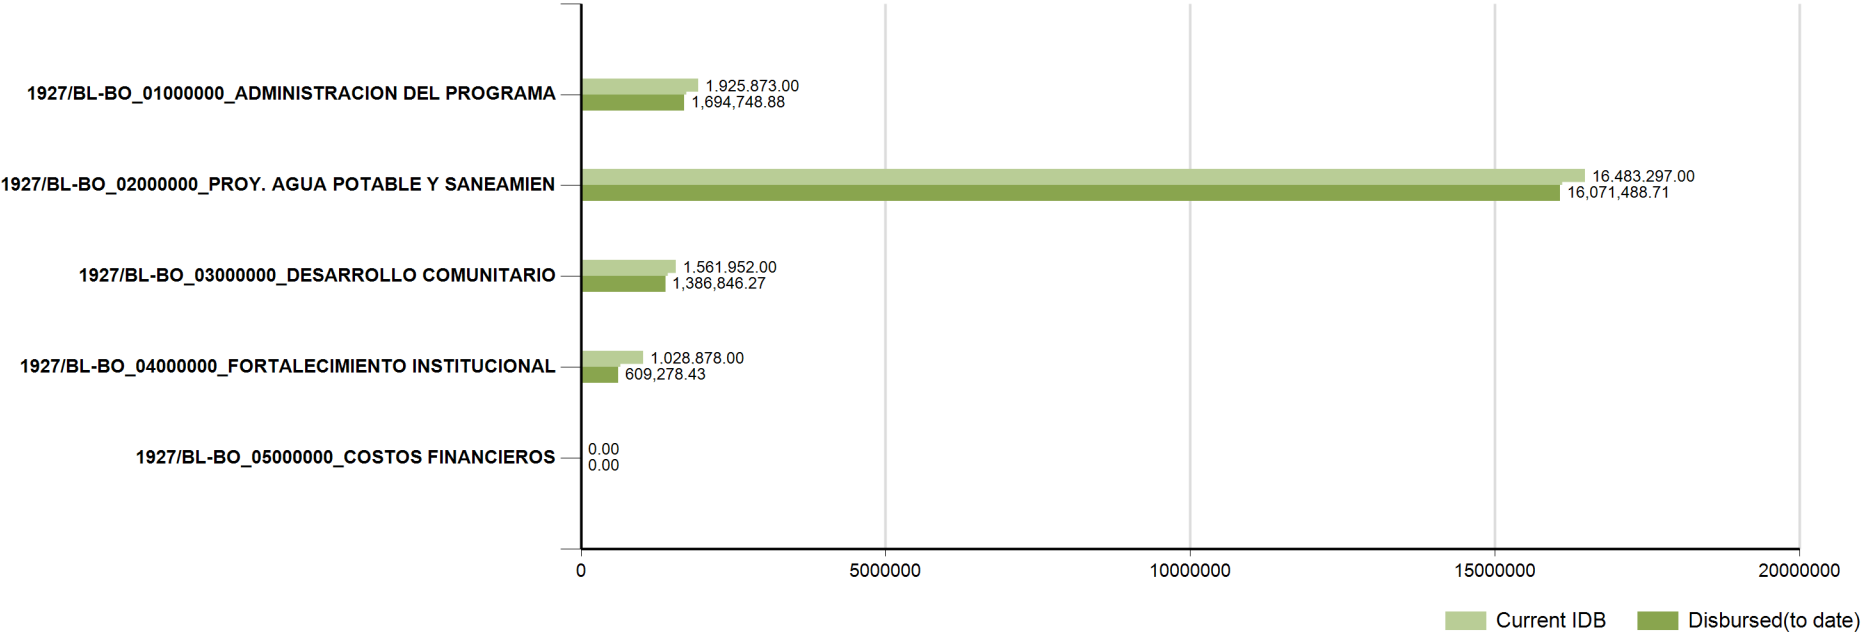




Results Matrix

Impacts

Impact:	0 Acceso de la población a Servicios Básicos								
Observation:									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		EOP
0.1 Porcentaje de la población con acceso sostenible a Agua Potable		%	74.60	2008	Reportes del FPS sobre la ejecución del Programa APPC 1927	El indicador de beneficio de la intervención del programa APPC establece que se debe beneficiar hasta una población de 100,000 habitantes. La medición del impacto de la inversión del Programa estará relacionada con los porcentajes de población que deben a	P		
							P(a)		75.34
							A	75.34	75.51
0.2 Porcentaje de la población con acceso a servicios de saneamiento básico		%	48.40	2008	Reportes FPS APPC I		P		
							P(a)		49.10
							A	49.10	49.38

 RF - RF Indicator  SI - Sector Indicator  CI - Country Indicator  PG - Pro-Gender  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Calidad de vida de los beneficiarios mejorada										
Observation:											
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012		2013	2014	EOP
1.1 Hogares con suministro de agua mejorado		Hogares	0.00	2010	Informes del proyecto		P				
							P(a)			4,536.00	7,059.00
							A	2,160.00	3,647.00	2,429.00	8,236.00
1.2 Hogares con suministro de agua nuevo		Hogares	0.00	2008	Informes del proyecto	Al 2011 se han superado las metas planteadas inicialmente.	P				
							P(a)			2,276.00	2,930.00
							A	3,634.00	4,005.00	1,211.00	8,850.00
1.3 Hogares con conexiones sanitarias mejoradas		Hogares	0.00	2008	Informes del proyecto		P				
							P(a)			815.00	4,751.00
							A	1,471.00	447.00	649.00	2,567.00

1.4 Hogares con conexiones sanitarias nuevas	RF	Hogares	0.00	2010	Informes del proyecto	Al 2011 se han superado las metas planteadas inicialmente.	P				
							P(a)			1,170.00	7,056.00
							A	5,129.00	757.00	1,825.00	7,711.00
1.5 Hogares cuyas aguas residuales son tratadas		Hogares	0.00	2008	Reporte de ejecución del FPS		P				
							P(a)			1,985.00	7,179.00
							A		5,194.00	4,706.00	9,900.00

Outcome:	2 Sostenibilidad del servicio de agua potable y alcantarillado mejorada										
Observation:											

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	EOP
2.1 Empresas con equilibrio financiero		Empresas	0.00	2010	Estado de resultados		P			34.00
							P(a)	14.00	8.00	44.00
							A	16.00	20.00	40.00

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Proyectos de agua potable y saneamiento básico		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Proyectos de agua construidos hasta el final del programa	Proyectos	P		17.00	P		9,138,856.35
		P(a)	2.00	18.00	P(a)	239,660.02	6,903,355.04
		A	2.00	18.00	A	200,456.86	6,864,151.88
Proyectos de agua ampliados hasta el final del programa (incluye mejoramiento)	Proyectos	P		11.00	P		1,493,447.46
		P(a)	2.00	16.00	P(a)	358,623.68	3,350,400.12
		A	2.00	16.00	A	378,387.80	3,370,164.24
Proyectos de saneamiento construidos hasta el final del programa	Proyectos	P		32.00	P		4,819,008.14
		P(a)	4.00	26.00	P(a)	482,827.45	9,098,983.12
		A	3.00	25.00	A	558,023.91	9,174,179.58
Proyectos de saneamiento mejorados hasta el final del programa	Proyectos	P		2.00	P		462,814.15
		P(a)	1.00	3.00	P(a)	38,764.91	1,427,978.89
		A	1.00	3.00	A	39,951.22	1,429,165.20
Desarrollo Comunitario		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Empresas Prestadoras de Servicios de Agua y Alcantarillado EPSAS con estado financiero	Empresas	P		57.00	P		3,136,260.85
		P(a)	8.00	44.00	P(a)	424,982.59	1,889,087.59
		A	5.00	41.00	A	423,954.00	1,888,059.00
Fortalecimiento institucional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Módulo en el Sistema Informático de administración de proyectos implementado	Módulo	P		1.00	P		1,080,624.89
		P(a)		1.00	P(a)	731,876.98	1,087,759.77
		A		1.00	A	642,057.00	997,939.79
Other Cost					2014		Cost
Administración, evaluación, seguimiento y auditorías				P			\$1,773,827.19
				P(a)	\$409,266.00		\$1,916,864.72
				A	\$336,144.00		\$1,843,742.72
Total Cost					2014		Total Cost
				P			\$21,904,839.03
				P(a)	\$2,686,001.63		\$25,674,429.25
				A	\$2,578,974.79		\$25,567,402.41

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
