
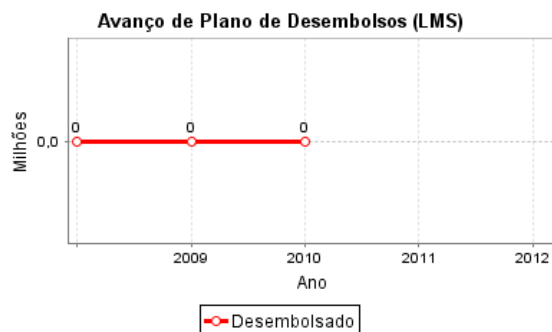



Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: Prefeitura Municipal de Niteroi		
Sector: URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-INTEGRATED URBAN DEVELOPMENT		
Número da Operação: 1943/OC-BR	Atual: 26.470.000,00	Original BID: 26.470.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 26.470.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu:
Operação Relacionada: BR-L1043	Saldo: 26.470.000,00	Cofinanciamento/País: 17.660.000,00
Subtipo de Operação: GOM - Global of Multiple Works Operation		Original Estimado: 44.130.000,00
		Período de Amortização (meses):

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Apr 19, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 19, 2011

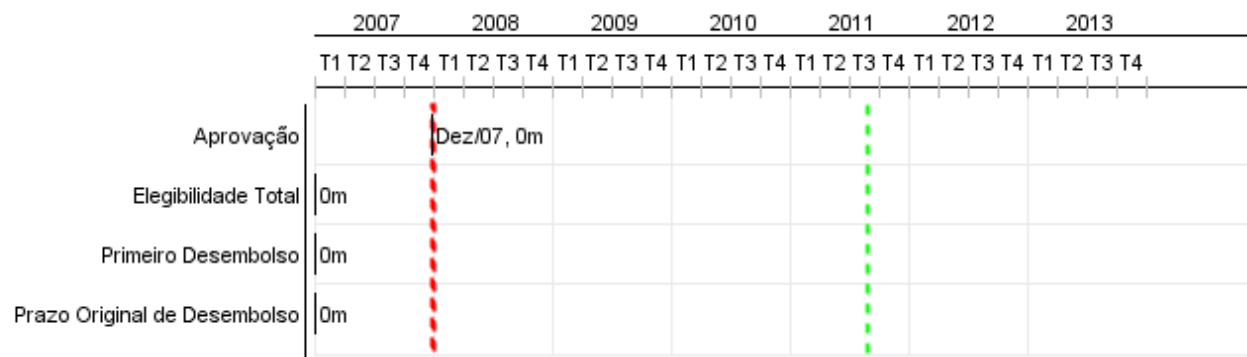

Progresso Acumulado até 2010

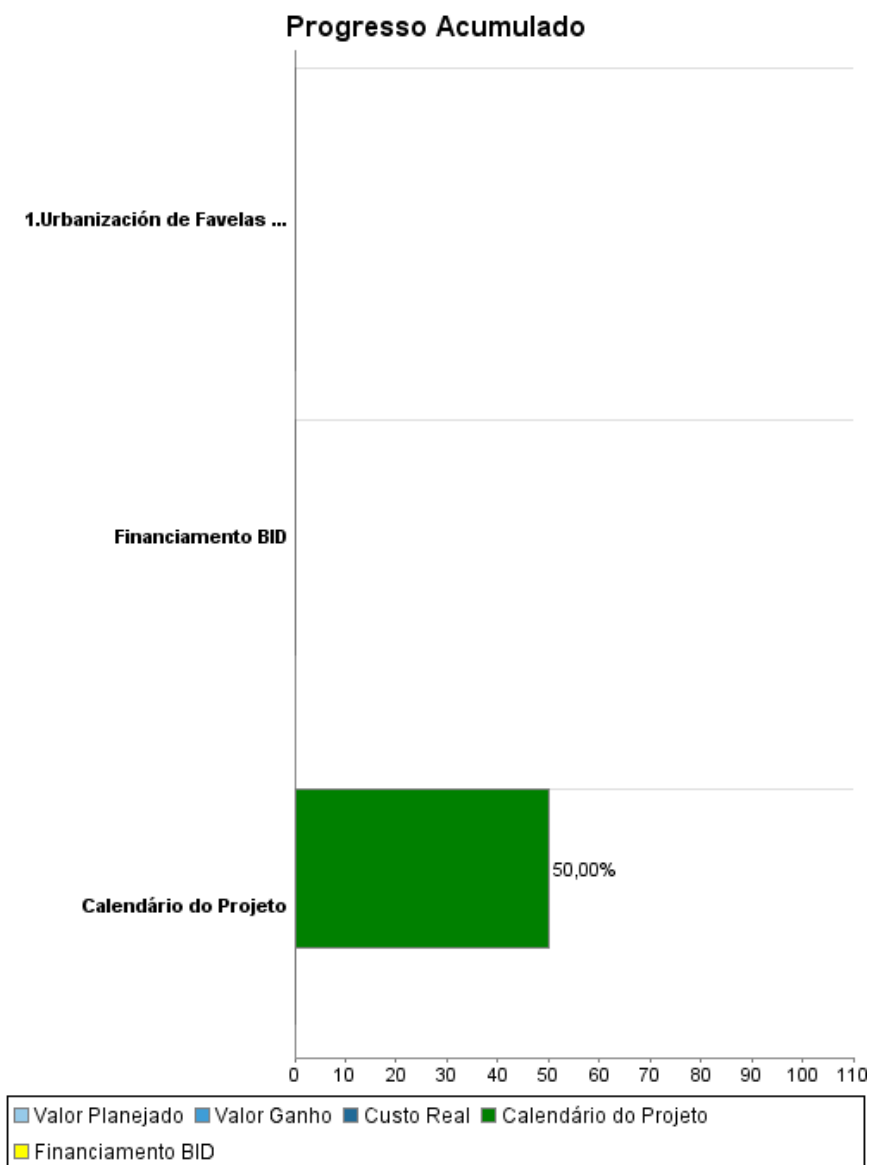

Resultados

Resultado: Condições de urbanização y acceso a servicios básicos en favelas mejoradas

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	Final do Projeto
Valorización inmobiliaria en las favelas atendidas	R\$/ m2	19.800,00	2007	P A			29.700,00
Familias beneficiarias con situación de tenencia regularizada en las favelas atendidas	# familias		2007	P A			3.900,00
Residentes con acceso a al menos 3 servicios básicos en favelas atendidas	% de residentes	20,00	2007	P A			100,00

Resultado: Las condiciones de movilidad de la ciudad mejoradas

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	Final do Projeto
Tiempo de desplazamiento médio de los autobuses en los corredores exclusivos / preferenciales	velocidad km.h	1,00		P A			0,85

Resultado: Zonas degradadas del Centro con uso recalificado

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	Final do Projeto
Mínimo 3 zonas públicas degradadas recalificadas	Zonas	1,00		P A			3,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
1.Urbanización de Favelas ¿ Comunidad Ciudadana									
1.Urbanización de Favelas ¿ Comunidad Ciudadana	familias				1.000,00				
2.Transporte y Movilidad Urbana									
2.Transporte y Movilidad Urbana									
Recalificación del Centro									
Recalificación del Centro									
Fortalecimiento Institucional									
Fortalecimiento Institucional									
TOTAL									
