
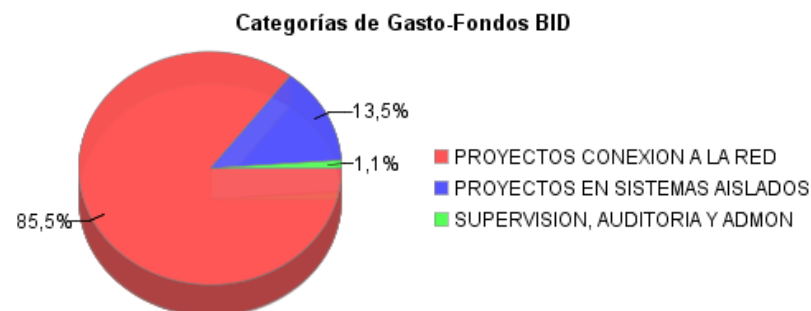




## Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION		
Sector:	ENERGY-RURAL ELECTRIFICATION		
Número(s) de Préstamo:	2033/OC-GU	Monto Aprobado Actual: 55.000.000,00	BID Original: 55.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	Actual BID: 55.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	Pari-passu:
Operación(es) Relacionada(s):	GU-P1043, GU-T1120	Saldo: 55.000.000,00	Co-financiamiento/País: 150.000,00
Subtipo de Operación:	PFM - Proyecto de Fases Múltiples		Estimado Original: 55.150.000,00
			Período de Amortización (meses): 234

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Apr 14, 2011 Validado por Representante de País: Apr 14, 2011

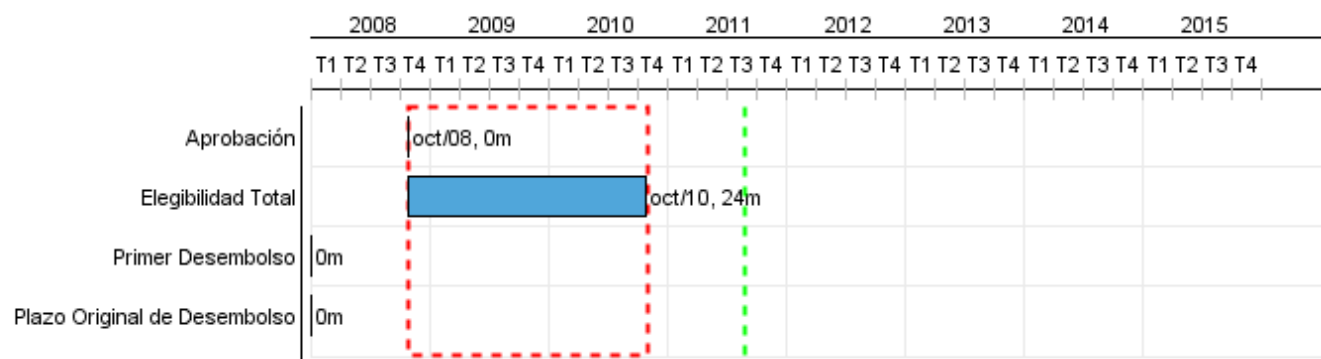

## Progreso Acumulado al 2010

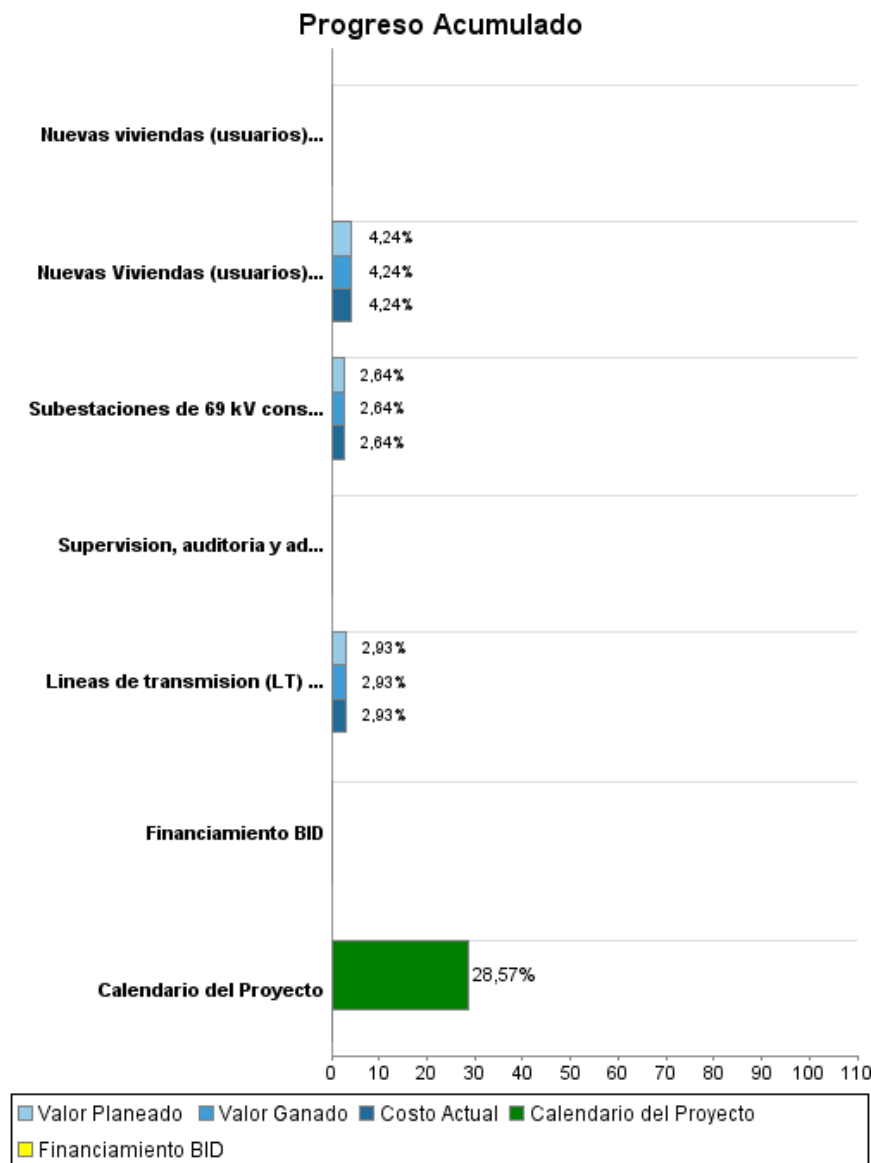

## Resultados

<b>Resultado:</b>	Cobertura del servicio eléctrico en las comunidades rurales ampliada
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2015	Fin de Proyecto
Cobertura de electrificación rural a nivel nacional	Porcentaje	82,60	2007	P		85,90
				A		
Cobertura de electrificación en los municipios más pobres priorizados.	Porcentaje	66,10	2007	P		73,90
				A		

## Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>Componente 1 - Electrificación rural mediante conexión a la red eléctrica.</b>									
Nuevas Viviendas (usuarios) electrificadas mediante conexión a la red nacional	Kilómetros		125,00		29.152,00	991.727,00	991.727,00		23.400.000,00
Lineas de transmisión (LT) del PER, construidas	Kilómetros				175,00	451.202,00	451.202,00		15.400.000,00
Subestaciones de 69 kV construidas	Kilómetros				6,00	216.349,00	216.349,00		8.200.000,00
<b>Componente 2 - Electrificación rural en sistemas aislados.</b>									
Nuevas viviendas (usuarios) electrificadas en zonas aisladas	viviendas				5.000,00				7.400.000,00
<b>Componente 3 - Apoyo a la administración del Programa y supervisión.</b>									
Supervision, auditoria y administracion	n.a								750.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.659.278,00</b>	<b>1.659.278,00</b>		<b>55.150.000,00</b>
