
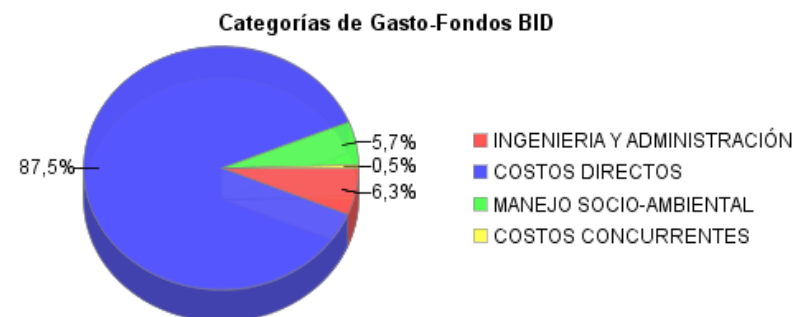
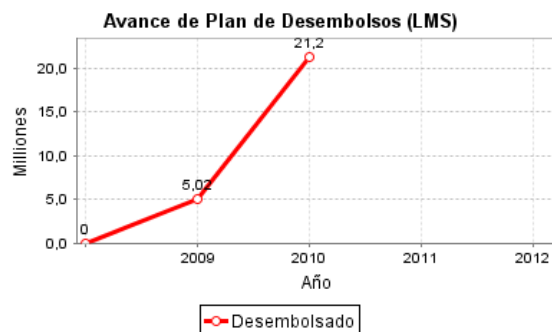



Informe Resumido

| Datos Básicos del Proyecto | | Fondos Disponibles (US\$) | | Costo total y Fuente | |
|-------------------------------|--|--------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| Agencia Ejecutora (AE): | EMPRESA PUBL.MUNICIPAL TELECOMUNIC,AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO SANEAMEN.CUENCA | | | | |
| Sector: | WATER AND SANITATION-SEWERAGE | | | | |
| Número(s) de Préstamo: | 1753/OC-EC | Monto Aprobado Actual: | 61.250.000,00 | BID Original: | 61.250.000,00 |
| Etapas: | Approved | Monto Desembolsado a la fecha: | 32.269.749,62 | Actual BID: | 61.250.000,00 |
| Tipo de Operación: | INV - Inversión | % Desembolsado: | 52,69 | Pari-passu: | 49,07 |
| Operación(es) Relacionada(s): | | Saldo: | 28.980.250,38 | Co-financiamiento/País: | 35.750.000,00 |
| Subtipo de Operación: | ESP - Inversión Específica | | | Estimado Original: | 97.000.000,00 |
| | | | | Período de Amortización (meses): | 222 |

| Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto | Reformulación | Validación |
|---|--|--|
| Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B | () ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? | Validado por el Jefe de División: Mar 24, 2011 Validado por Representante de País: Mar 25, 2011 |

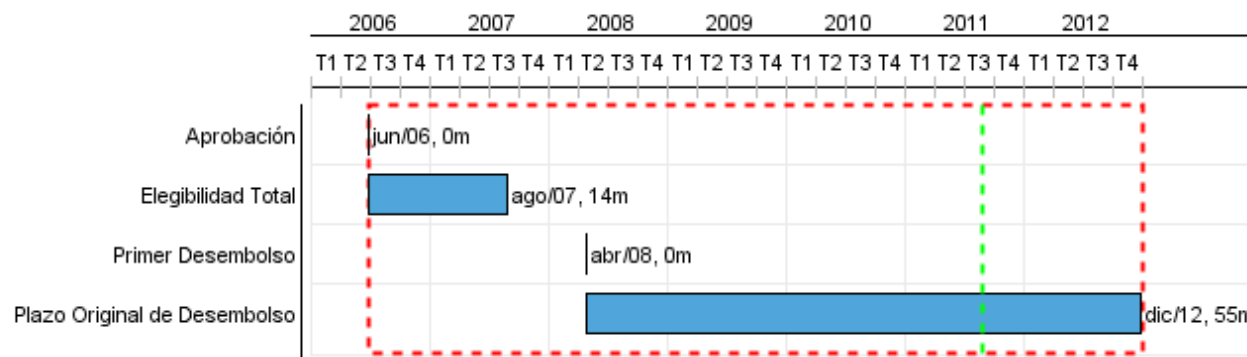

Progreso Acumulado al 2010

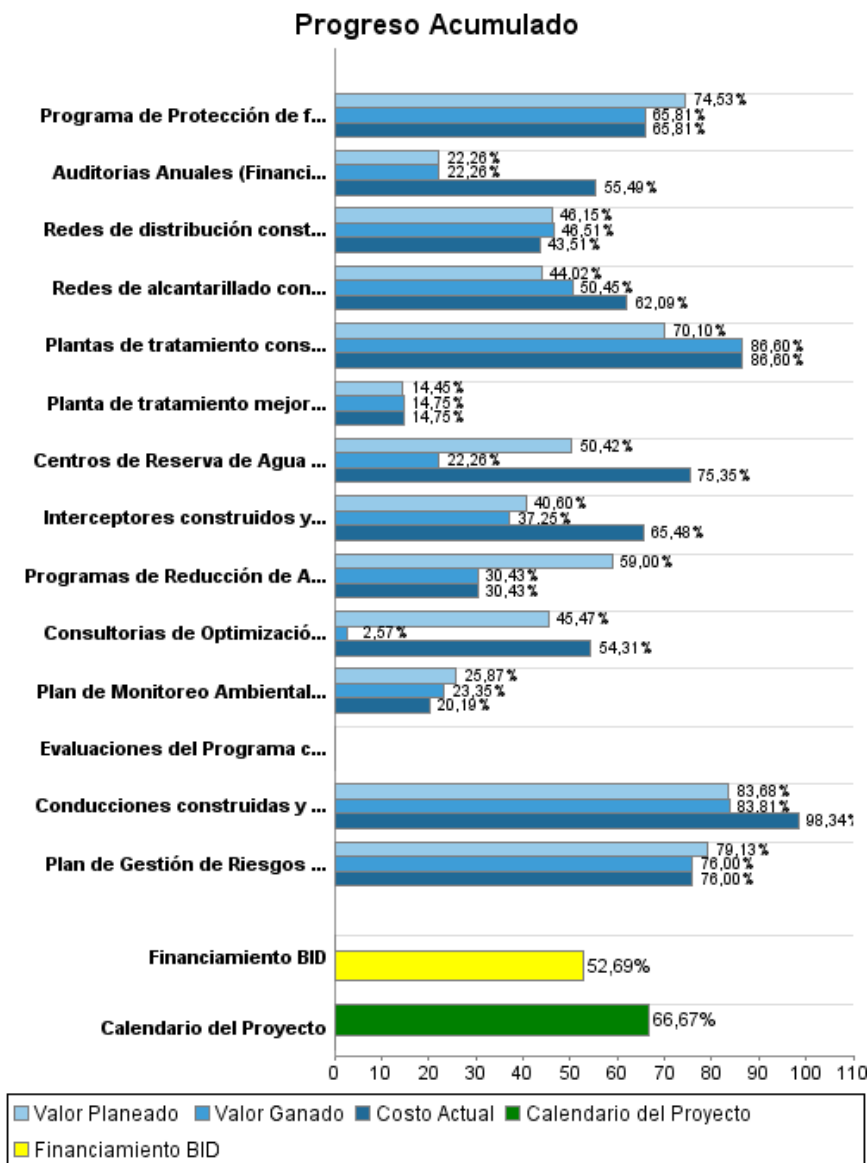

Resultados

Resultado: Demanda de agua potable y alcantarillado en la zona periurbana y rural atendida

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2010 | Fin de Proyecto |
|---|------------------|---------------|-------------------|---|-------|-----------------|
| Porcentaje de cobertura en agua potable en el área del proyecto. | % | 90,00 | 2006 | P | 92,40 | 93,00 |
| | | | | A | 94,00 | |
| Porcentaje de cobertura de alcantarillado en la zona de intervención del Programa | % | 78,00 | 2006 | P | 85,00 | 89,00 |
| | | | | A | 82,00 | |

Resultado: La calidad del agua de los ríos y quebradas han sido mejoradas

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2010 | Fin de Proyecto |
|---|------------------|---------------|-------------------|---|-------|-----------------|
| Descargas directas eliminadas en los ríos Yanuncay, Machángara, Tarqui, El Chorro, Tomebamba y Milchichig | Descargas | | 2006 | P | 98,00 | 183,00 |
| | | | | A | 77,00 | |

Resultado: Servicios de agua potable y saneamiento financieramente sostenibles en el largo plazo.

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2010 | Fin de Proyecto |
|---------------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------|-----------------|
| Porcentaje del Margen Operativo | % | 20,00 | 2006 | P | 20,00 | 24,00 |
| | | | | A | 20,00 | |

Resultado: Empresa de Telecomunicacione, Agua Potable y Alcantarillado y Saneamineto de Cuenca (ETAPA) Eficiente y sostenible.

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2010 | Fin de Proyecto |
|--|------------------|---------------|-------------------|---|-------|-----------------|
| Indicadores de Desempeño Cumplidos en conformidad con el Cuadro 2 Anexo A (17 indicadores anuales) | Indicadores | | 2006 | P | 17,00 | 17,00 |
| | | | | A | 11,00 | |

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

| Descripción | Unidad de medida | Físico | | | | Financiero | | | |
|--|-------------------|----------|--------|---------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | Planeado | Actual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planeado | Actual | Costos Acumulados | Costos FDP |
| Abastecimiento de Agua Potable. | | | | | | | | | |
| Redes de distribución construidas y operando | KM | 61,00 | 62,00 | | 214,00 | 2.910.000,00 | 2.429.000,00 | | 13.329.000,00 |
| Conducciones construidas y operando | KM | 1,60 | 1,70 | | 62,90 | 380.000,00 | 1.218.000,00 | | 18.451.000,00 |
| Plantas de tratamiento construidas (Yanuncay) , mejoradas (Lodos del Tixan y el Cebollar) y operando | Plantas | | | | 3,00 | | | | 10.325.000,00 |
| Centros de Reserva de Agua Potable Construidos y Operando | Centros | 11,00 | 4,00 | | 28,00 | 1.429.000,00 | 2.234.000,00 | | 3.229.000,00 |
| Abastecimiento de servicios de saneamiento y drenaje pluvial | | | | | | | | | |
| Redes de alcantarillado construidas y operando | KM | 7,40 | 9,19 | | 66,00 | 3.090.000,00 | 4.396.000,00 | | 11.631.000,00 |
| Interceptores construidos y operando | KM | 14,90 | 12,84 | | 44,00 | 2.740.000,00 | 3.851.000,00 | | 11.308.000,00 |
| Planta de tratamiento mejorada (Ucubamba) y operando | Plantas | | | | 1,00 | 1.200.000,00 | 1.225.000,00 | | 8.305.000,00 |
| Fortalecimiento Empresarial | | | | | | | | | |
| Consultorias de Optimización empresarial, Subsidios, Tarifas, Valuación de Activos implementadas | Consultorias | 1,00 | | | 4,00 | 1.000.000,00 | 884.000,00 | | 2.331.000,00 |
| Programas de Reducción de Agua no Contabilizada y Operación y Mantenimiento fortalecido e implementado | Programas | | | | 2,00 | 583.000,00 | 86.000,00 | | 1.949.000,00 |
| Plan de manejo SocioAmbiental | | | | | | | | | |
| Plan de Monitoreo Ambiental completado | No. de Auditorias | 3,00 | 1,00 | | 15,00 | 130.000,00 | | | 1.179.000,00 |
| Plan de Gestión de Riesgos elaborado y aprobado | Planes | | | | 1,00 | 455.000,00 | 437.000,00 | | 575.000,00 |
| Programa de Protección de fuentes y Cursos Naturales implementado | Programas | | | | 1,00 | 277.000,00 | 127.000,00 | | 1.720.000,00 |
| Seguimiento/ Evaluación y Administración y Costos Financieros | | | | | | | | | |
| Evaluaciones del Programa concluidas (Evaluaciones intermedias y final) | Evaluaciones | | | | 4,00 | | | | |
| Auditorias Anuales (Financieras y de Gestion) realizadas | Auditorias | 2,00 | 2,00 | | 10,00 | 50.000,00 | 126.000,00 | | 674.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 14.244.000,00 | 17.013.000,00 | | 85.006.000,00 |
