




Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	OFFICE OF THE PRIME MINISTER		
Secteur:	ENERGY-RURAL ELECTRIFICATION		
Numéro(s) de Prêt(s):	GRT/FM-13897-GY	Montant Courant Approuvé: 5.000.000,00	Initial BID: 5.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	Courant BID: 5.000.000,00
Type d' Opération:	GEF - GEF	% Décaissé:	Pari Passu: 80,00
Opération(s) Connexe(s):	GY-T1041, GY-T1061, GY-L1038, GY-T1096, GY-M1022	Solde: 5.000.000,00	Cofinancement/Pays: 1.250.000,00
Sous-Type de l'Opération:	IGR - Investment Loans		Estimation Initiale: 6.250.000,00
			Période d'Amortissement (mois):

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 09-oct-2013
		Validé par le Représentant: 09-oct-2013

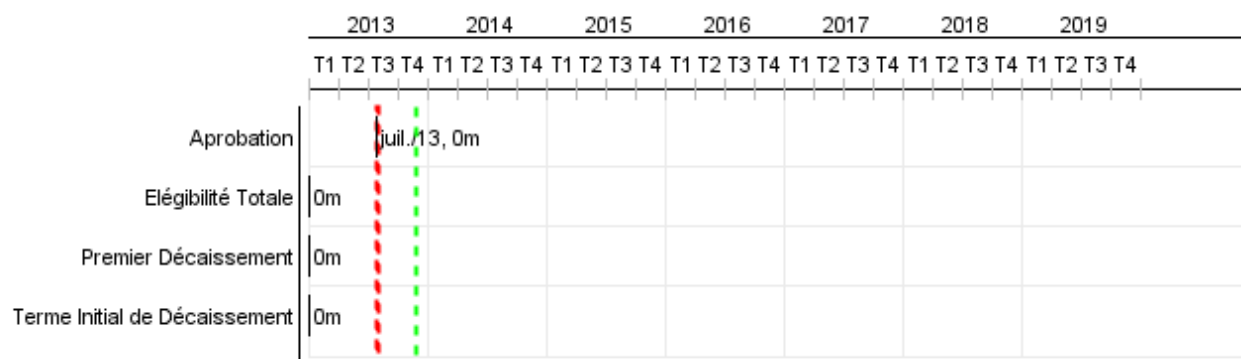

Progrès Cumulé à 2013



Résultats

Résultat: Rural communities have access to RE supply.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Number of rural end-users supplied with sustainable electricity service from installed RETs.	persons	6.900,00	2011	P A	27.500,00

Résultat: Increase in rural energy supply from RE sources

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Amount of annual energy production by installed rural RETs	MWh/yr	198,00	2011	P A	12.222,00

Résultat: Increase in energy supply from RE sources injected to the national grid

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Amount of annual energy production by installed on-grid wind turbine	MWh/yr		2011	P A	789,00

Résultat: Technical, social and financial sustainability of on-grid RETs demonstrated

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Number of on-grid RE projects evaluated.	# projects		2011	P A	1,00

Résultat: Technical, social and financial sustainability of rural RETs demonstrated

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Number of rural RE projects evaluated.	# projects		2011	P A	2,00

Résultat: Increase of technical and managerial skills for implementing RETs by GP&L

RAPPORT DE SUIVI

GY-G1004 - Sustainable Energy Program for Guyana
2013 1^o período con cierre al (31-oct.-2013)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 26/09/2013

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Investment to implement a Corporate Development Program	US\$		2011	P	20.000.000,00
				A	

Résultat:	Increase of local capacities to implement and operate RETs for rural electrification
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Trainings conducted	# trainings	2,00	2011	P	7,00
				A	

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
I. Strengthening of the policy and institutional framework to implement RETs in Guyana									
Legal and technical revision of electricity regulatory framework developed.	# revisions				1,00				100.000,00
Public Awareness campaign developed	# campaigns				4,00				110.000,00
II. Strengthening of the Power Utility capabilities and promote the use of RETs									
RE potential assessment developed	# assessments				2,00				140.000,00
III. Contribute to sector sustainability with the implementation of RETs for electricity generation									
Solar-PV projects installed for rural electrification	kW				1.112,00				805.000,00
Rural hydro power projects installed	kW				2.330,00				2.000.000,00
On-grid RET (wind power) installed	kW				300,00				800.000,00
On-grid PV projects installed	kW				180,00				795.000,00
Project Management									
Project Management	N/A								250.000,00
TOTAL									5.000.000,00
