



Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	OFFICE OF THE PRIME MINISTER		
Sector:	ENERGY-RURAL ELECTRIFICATION		
Número(s) de Préstamo:	GRT/FM-13897-GY	Monto Aprobado Actual: 5.000.000,00	BID Original: 5.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	Actual BID: 5.000.000,00
Tipo de Operación:	GEF - GEF	% Desembolsado:	Pari-passu: 80,00
Operación(es) Relacionada(s):	GY-T1041, GY-T1061, GY-L1038, GY-T1096, GY-M1022	Saldo: 5.000.000,00	Co-financiamiento/País: 1.250.000,00
Subtipo de Operación:	IGR - Préstamos de Inversión		Estimado Original: 6.250.000,00
			Período de Amortización (meses):

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 09-oct-2013 Validado por Representante de País: 09-oct-2013

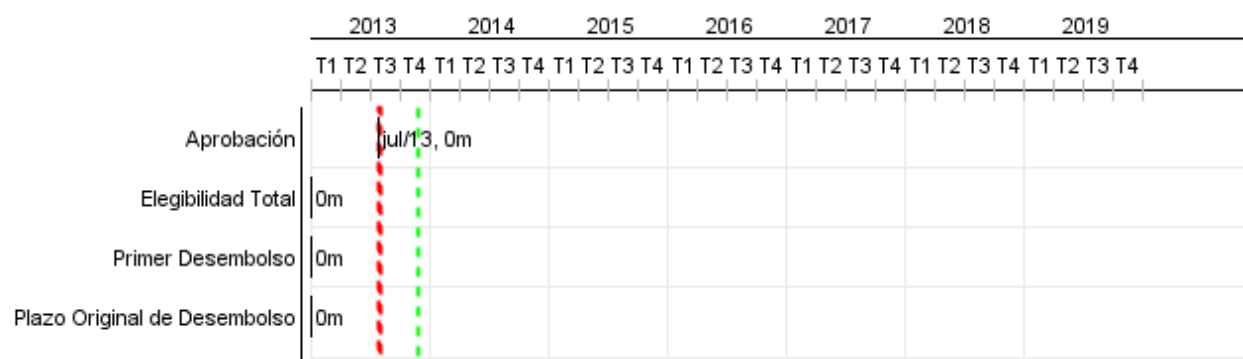

Progreso Acumulado al 2013



Resultados

Resultado: Rural communities have access to RE supply.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Number of rural end-users supplied with sustainable electricity service from installed RETs.	persons	6.900,00	2011	P A	27.500,00

Resultado: Increase in rural energy supply from RE sources

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Amount of annual energy production by installed rural RETs	MWh/yr	198,00	2011	P A	12.222,00

Resultado: Increase in energy supply from RE sources injected to the national grid

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Amount of annual energy production by installed on-grid wind turbine	MWh/yr		2011	P A	789,00

Resultado: Technical, social and financial sustainability of on-grid RETs demonstrated

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Number of on-grid RE projects evaluated.	# projects		2011	P A	1,00

Resultado: Technical, social and financial sustainability of rural RETs demonstrated

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Number of rural RE projects evaluated.	# projects		2011	P A	2,00

Resultado: Increase of technical and managerial skills for implementing RETs by GP&L

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Investment to implement a Corporate Development Program	US\$		2011	P A	20.000.000,00

Resultado: Increase of local capacities to implement and operate RETs for rural electrification

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

GY-G1004 - Programa de Energía Sostenible para Guyana
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 26/09/2013

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Trainings conducted	# trainings	2,00	2011	P A	7,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
I. Strengthening of the policy and institutional framework to implement RETs in Guyana									
Legal and technical revision of electricity regulatory framework developed.	# revisions				1,00				100.000,00
Public Awareness campaign developed	# campaigns				4,00				110.000,00
II. Strengthening of the Power Utility capabilities and promote the use of RETs									
RE potential assessment developed	# assessments				2,00				140.000,00
III. Contribute to sector sustainability with the implementation of RETs for electricity generation									
Solar-PV projects installed for rural electrification	kW				1.112,00				805.000,00
Rural hydro power projects installed	kW				2.330,00				2.000.000,00
On-grid RET (wind power) installed	kW				300,00				800.000,00
On-grid PV projects installed	kW				180,00				795.000,00
Project Management									
Project Management	N/A								250.000,00
TOTAL									5.000.000,00
