
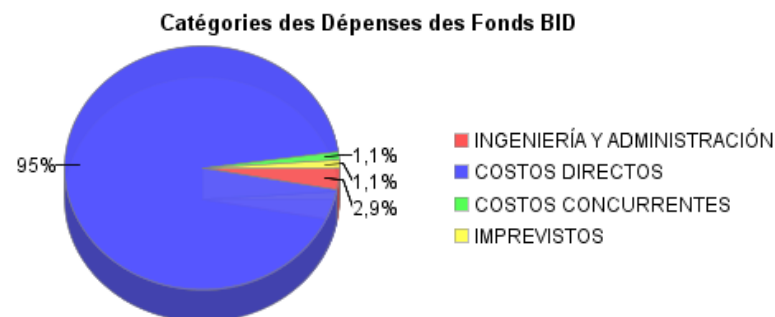



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	Empresa de Obra Sanitaria de Pasto		
Secteur:	WATER AND SANITATION-SEWERAGE		
Numéro(s) de Prêt(s):	2183/OC-CO	Montant Courant Approuvé: 27.800.000,00	Initial BID: 27.800.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	Courant BID: 27.800.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	Pari Passu:
Opération(s) Connexe(s):	CO-T1069, RG-P1374	Solde: 27.800.000,00	Cofinancement/Pays: 16.200.000,00
Sous-Type de l'Opération:	GOM - Global of Multiple Works Operation		Estimation Initiale: 44.000.000,00
			Période d'Amortissement (mois): 222

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Apr 1, 2011 Validé par le Représentant: Apr 15, 2011

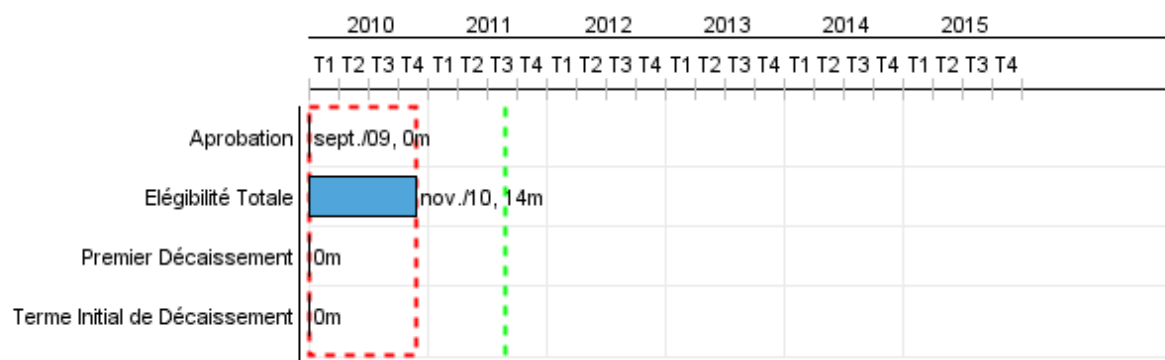

Progrès Cumulé à 2010



Résultats

Résultat: Calidad del Rio Pasto (medida en la estacion Club de Tennis) mejorada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Caudal Estacion Club de Tennis	m3/seg	1,61	2006	P A	1,86
DBO5 Estacion Club de Tennis	mg/l	210,00	2006	P A	1,60
OD DBO5 Estacion Club de Tennis	mg/l	0,60	2006	P A	1,51
Coliformes DBO5 Estacion Club de Tennis	NMP/ 100ml	4,50	2006	P A	3,20
Numero de descargas (descoles) directas a los cuerpos de agua (rio pasto y afluentes) de aguas residuales	Descargas	6,00	2006	P A	0,00
Numero de quejas al año por inundaciones y/o rebosamientos de aguas residuales (negras)	Quejas		2011	P A	0,00

Résultat: Cobertura del servicio de acueducto mejorada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Suscriptores del servicio de agua potable servidos por EMPOPASTO	Suscriptores	62.500,00	2009	P A	68.000,00
Suscriptores del servicio de acueducto en los estratos 1 y 2 del area urbana	Suscriptores	37.625,00	2008	P A	40.936,00

Résultat: Nivel de riesgo financiero de EMPOSPASTO mantenido a un nivel bajo

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Razon de Liquidez (Activo corriente/ Pasivo corriente)	Ratio	1,00	2009	P A	1,00
Endeudamiento financiero (Deudas/Pasivo)	Porcentaje	40,00	2009	P A	40,00
Eficiencia del recaudo (Monto facturado/ Monto recaudado en un año)	Porcentaje	85,00	2009	P A	85,00
Cobertura de Intereses (Utilidad operativa / Gastos financieros)	Ratio	1,50	2009	P A	1,50
EBITDA (Resultado del año ante de Depreciacion, Amortizacion e Intereses) / Ingresos Operacionales del Servicio	Porcentaje	20,00	2009	P A	20,00

RAPPORT DE SUIVI

CO-L1028 - Water and Sanitation Program for the Municipio of Pasto
2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 30/03/2011

Résultat:	Nuevos hogares con acceso a servicios de saneamiento en la zona rural mejorado
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Hogares con acceso al servicio	Hogares		2009	P A	6.200,00
Razon de liquidez (Activo corriente/ Pasivo corriente)	Porcentaje		2011	P A	0,00
Eficiencia del recaudo (Monto facturado/ Monto recaudado en un año)	Porcentaje		2011	P A	0,00

Résultat:	Eficiencia operativa de EMPOPASTO mejorada
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Disminucion de costos de bombeo medido en KWH ahorrados	\$		2011	P A	0,00
Indice de Agua no Contabilizada (Agua facturada/ Agua producida en un año)	Porcentaje	42,20	2009	P A	37,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Obras de Agua Potable									
Planta de tratamiento de Agua Potable construida	Planta de tratamiento				1,00				6.300.000,00
Sectores del sistema de acueducto con obras de control de agua no contabilizada (macro y micromedidores, valvulas) instaladas	Sectores				13,00				2.300.000,00
Obras de Alcantarillado									
Colectores e interceptores (longitud de via intervenida) con diametros entre 12 y 40 en tuberia de concreto/PVC que recogen las aguas servidas han sido construidos	km				7,60				19.300.000,00
Redes de alcantarillado (longitud via intervenida) construidos	km				6,01				5.000.000,00
Fortalecimiento Empresarial									
Plan estrategico integrado a hechos y propositos	Plan estrategico				1,00				750.000,00
Estructura organizacional con enfoque por procesos implementada	Estructura organizacional				1,00				
Agua para el Campo									
Planes de inversion de agua potable y saneamiento basico en zonas rurales disenados	proyectos				15,00				4.050.000,00
Sistemas de acueducto rural construidos	sistemas				18,00				
Costos Administrativos									
TOTAL									37.700.000,00
