
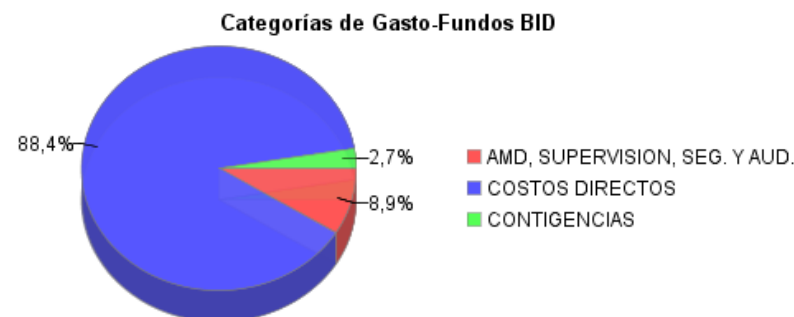
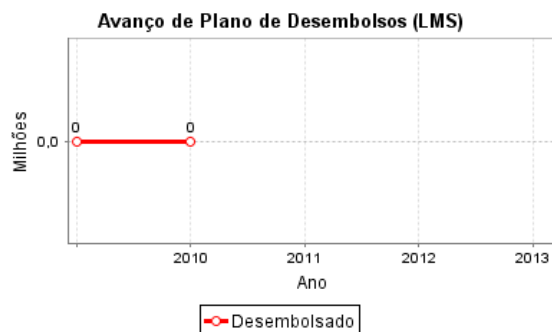


Relatório Resumido


Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS		
Sector: ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-NATURAL DISASTERS PREVENTION RELIEF		
Número da Operação: 2152/BL-HO	Atual: 19.000.000,00	Original BID: 19.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 19.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu:
Operação Relacionada: HO-P1010, HO-X1013	Saldo: 19.000.000,00	Cofinanciamento/País:
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 19.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 282

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Mar 17, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 15, 2011

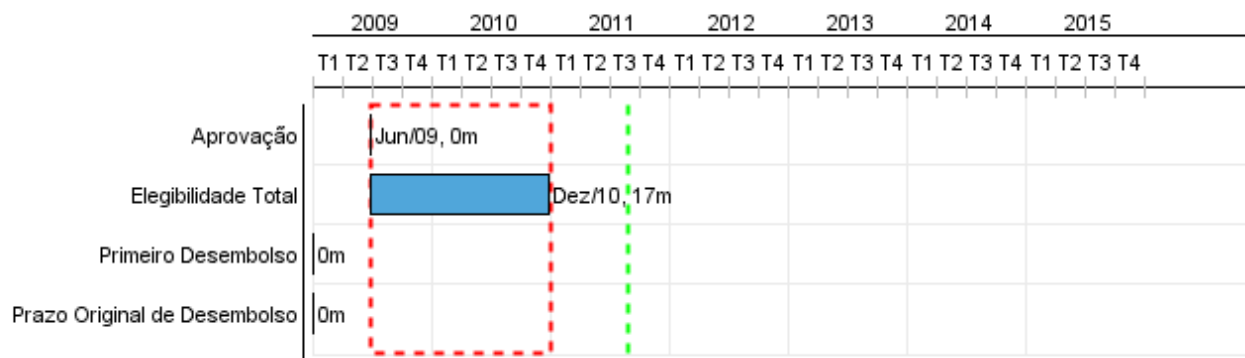

Progresso Acumulado até 2010

Progresso Acumulado

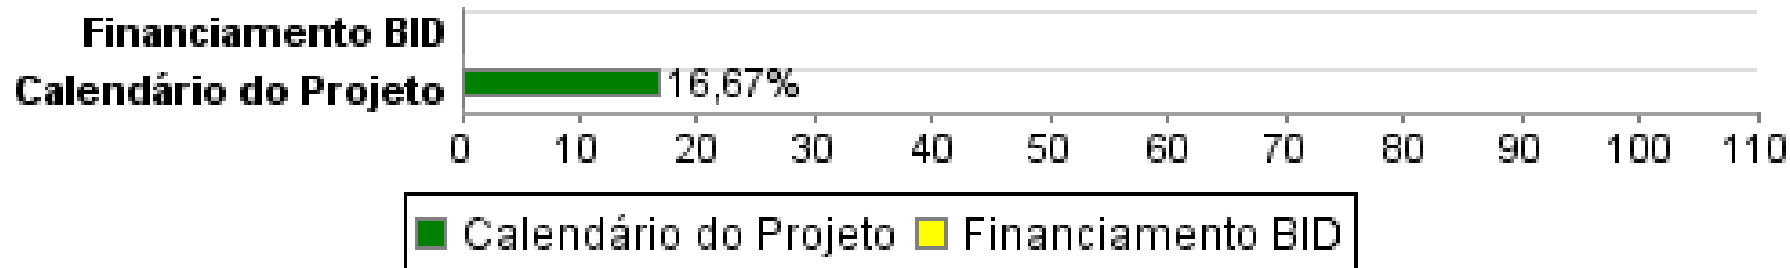

Resultados

Resultado:	Gestión de riesgos en los municipios (IGR-m) intervenidos por el Programa mejorada.
Suposições:	Dadas las intervenciones del proyecto a nivel municipal, el IGR-m será adaptado para calcular el desempeño en la gestión de riesgos a nivel municipal.
Observações:	El IGR-m en los municipios a ser intervenidos por el proyecto será calculado en el marco de la preparación de los planes de prevención y mitigación de desastres.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2015	Final do Projeto
Índice de Gestão de Risco Municipal (IGR-m) incrementado.	IGR-m		2011	P A	40,00	40,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Prevención y mitigación a nivel municipal									
Producto 1.1: Obras estructurales de mitigación de riesgo ejecutadas.	obras				45,00				9.000.000,00
Producto 1.2: Obras no estructurales de mitigación de riesgo ejecutadas	obras				10,00				2.000.000,00
Producto 1.3: Planes de gestión de riesgo a nivel municipal formulados.	planes				20,00				1.640.000,00
Producto 1.4: Sistema Integral de Gestión del Riesgos SIGRET/CAPRA finalizado.	sistema				1,00				367.900,00
Fortalecimiento de la capacidad de gestión integral de riesgos de desastres a nivel comunitario y municipal									
Producto 2.1: Medidas de gestión integral de riesgos a desastres a nivel municipal implementadas	Municipios				10,00				712.800,00
Producto 2.2: Medidas prioritarias de gestión de riesgos a desastres a nivel comunitario implementadas	Comunidades				10,00				2.787.200,00
Fortalecimiento institucional para la gestión integral de riesgo de desastres									
Producto 3.1: Plan estratégico nacional para la gestión integral de riesgos de desastres elaborado	Plan				1,00				100.000,00
Producto 3.2: Gestión integral de riesgos de desastres incorporada a los planes estratégicos sectoriales	Plan				2,00				390.000,00
Producto 3.3: Plan de fortalecimiento Institucional de Comisión Permante de Contingencia (COPECO) Implementado	Plan				1,00				930.000,00
Educación e información para la gestión del riesgo									
Producto 4.1: Estrategia de socialización de información de riesgo desarrollada.	Estrategia				1,00				250.000,00
Producto 4.2: Curricula relacionada a la gestión integral de riesgos de desastres implementada en escuelas primarias y secundarias	Municipios				20,00				300.000,00
Producto 4.3: Curricula de gestión integral de riesgos de desastres incorporada a carreras universitarias	Carreras universitarias				5,00				330.000,00

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

HO-L1031 - Disaster Risk Prevention and Mitigation Project
2010 2º período com encerramento em (31-Mar-2011)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Última Atualização do PMR: 11/03/2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Producto 4.4: Funcionarios municipales capacitados sobre la nueva reglamentación y normas técnicas de contrucción impartida.	Funcionarios				200,00				
Administración del Programa									
Monitoreo y Evaluación									
Contingencias									
TOTAL									18.807.900,00
