
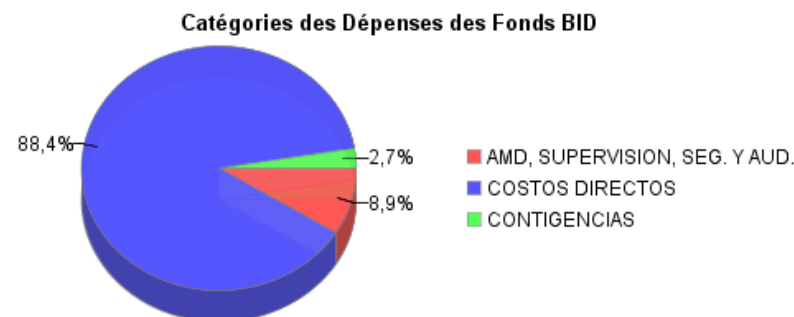




Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS		
Secteur:	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-NATURAL DISASTERS PREVENTION RELIEF		
Numéro(s) de Prêt(s):	2152/BL-HO	Montant Courant Approuvé:	19.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	19.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	Pari Passu:
Opération(s) Connexe(s):	HO-P1010, HO-X1013	Solde:	19.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation		Cofinancement/Pays:
			Estimation Initiale:
			Période d'Amortissement (mois):
			282

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Mar 17, 2011 Validé par le Représentant: Apr 15, 2011

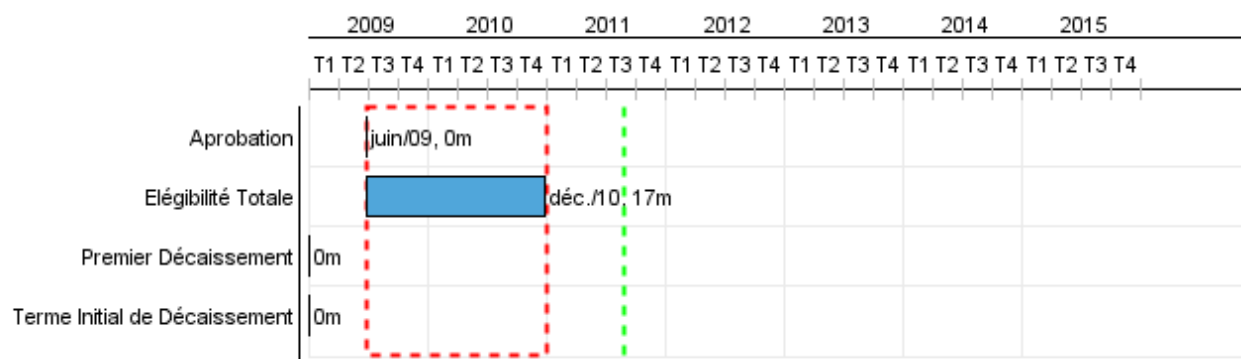

Progrès Cumulé à 2010

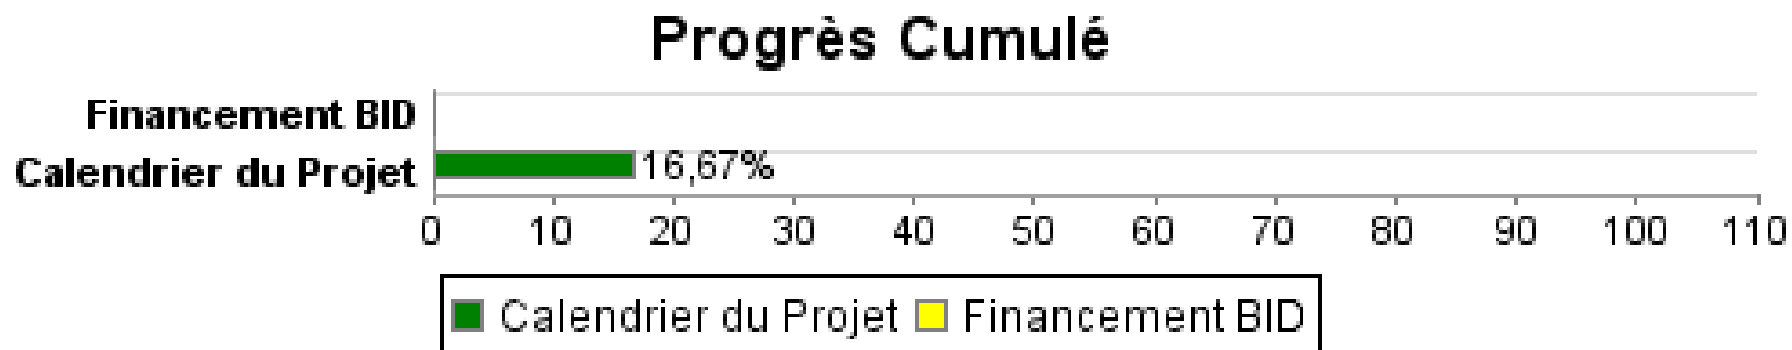

Résultats

Résultat:	Gestión de riesgos en los municipios (IGR-m) intervenidos por el Programa mejorada.
Suposições:	Dadas las intervenciones del proyecto a nivel municipal, el IGR-m será adaptado para calcular el desempeño en la gestión de riesgos a nivel municipal.
Observações:	El IGR-m en los municipios a ser intervenidos por el proyecto será calculado en el marco de la preparación de los planes de prevención y mitigación de desastres.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2015	Fin du Projet
Indice de Gestión de Riesgo Municipal (IGR-m) incrementado.	IGR-m		2011	P A	40,00	40,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Prevención y mitigación a nivel municipal									
Producto 1.1: Obras estructurales de mitigación de riesgo ejecutadas.	obras				45,00				9.000.000,00
Producto 1.2: Obras no estructurales de mitigación de riesgo ejecutadas	obras				10,00				2.000.000,00
Producto 1.3: Planes de gestión de riesgo a nivel municipal formulados.	planes				20,00				1.640.000,00
Producto 1.4: Sistema Integral de Gestión del Riesgos SIGRET/CAPRA finalizado.	sistema				1,00				367.900,00
Fortalecimiento de la capacidad de gestión integral de riesgos de desastres a nivel comunitario y municipal									
Producto 2.1: Medidas de gestión integral de riesgos a desastres a nivel municipal implementadas	Municipios				10,00				712.800,00
Producto 2.2: Medidas prioritarias de gestión de riesgos a desastres a nivel comunitario implementadas	Comunidades				10,00				2.787.200,00
Fortalecimiento institucional para la gestión integral de riesgo de desastres									
Producto 3.1: Plan estratégico nacional para la gestión integral de riesgos de desastres elaborado	Plan				1,00				100.000,00
Producto 3.2: Gestión integral de riesgos de desastres incorporada a los planes estratégicos sectoriales	Plan				2,00				390.000,00
Producto 3.3: Plan de fortalecimiento Institucional de Comisión Permanente de Contingencia (COPECO) Implementado	Plan				1,00				930.000,00
Educación e información para la gestión del riesgo									
Producto 4.1: Estrategia de socialización de información de riesgo desarrollada.	Estrategia				1,00				250.000,00
Producto 4.2: Curricula relacionada a la gestión integral de riesgos de desastres implementada en escuelas primarias y secundarias	Municipios				20,00				300.000,00
Producto 4.3: Curricula de gestión integral de riesgos de desastres incorporada a carreras universitarias	Carreras universitarias				5,00				330.000,00

RAPPORT DE SUIVI

HO-L1031 - Disaster Risk Prevention and Mitigation Project
2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 11/03/2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Producto 4.4: Funcionarios municipales capacitados sobre la nueva reglamentación y normas técnicas de contrucción impartida.	Funcionarios				200,00				
Administración del Programa									
Monitoreo y Evaluación									
Contingencias									
TOTAL									18.807.900,00
