
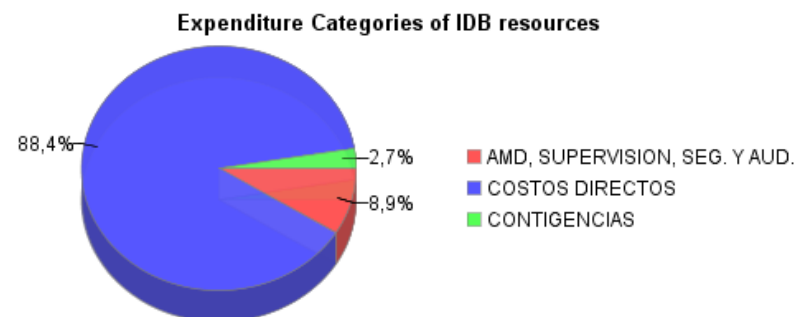




## Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)	Total Cost and Source
Executing Agency (EA):	COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS		
Sector:	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-NATURAL DISASTERS PREVENTION RELIEF		
Loan Number(s):	2152/BL-HO	Current Approved Amount: 19.000.000,00	Original IDB: 19.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	Current IDB: 19.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	Pari-passu:
Related Operation(s):	HO-P1010, HO-X1013	Balance: 19.000.000,00	Co-Financing/Country:
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation		Original Estimate: 19.000.000,00
			Amortization Period (months): 282

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	( ) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Mar 17, 2011 Validated by Country Representative: Apr 15, 2011

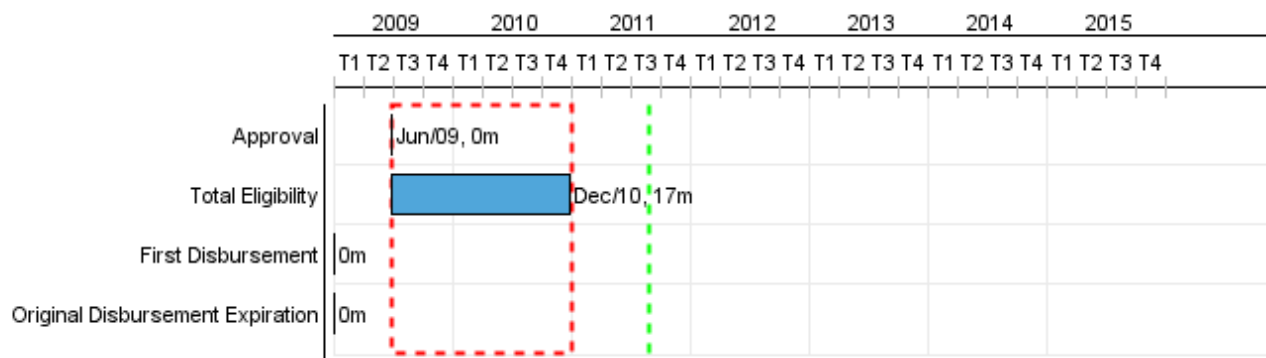

**Accumulated Progress as of 2010**

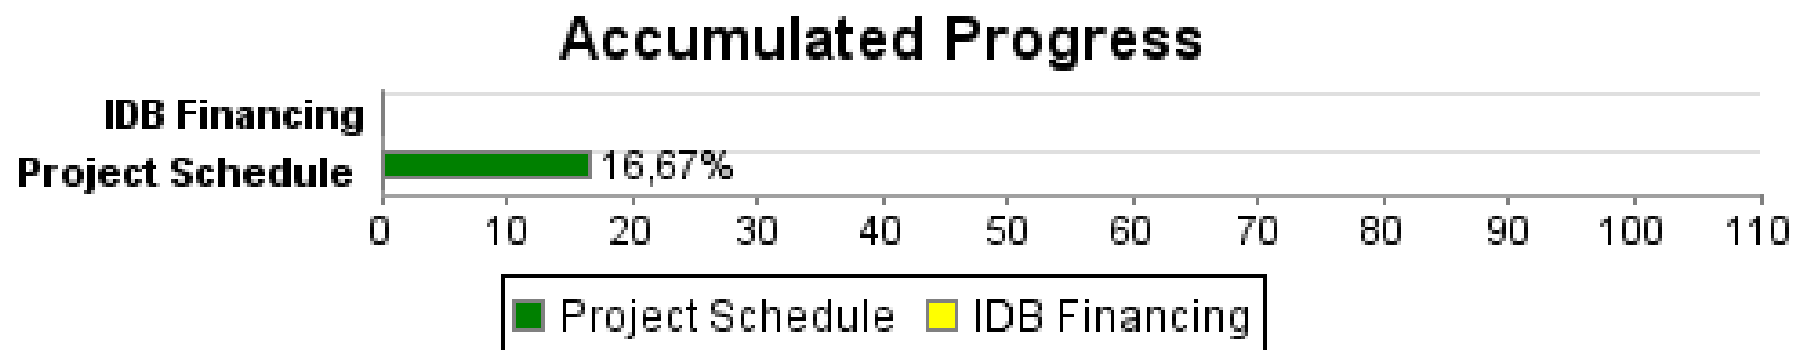

## Outcomes

<b>Outcome:</b>	Gestión de riesgos en los municipios (IGR-m) intervenidos por el Programa mejorada.
<b>Suppositions:</b>	Dadas las intervenciones del proyecto a nivel municipal, el IGR-m será adaptado para calcular el desempeño en la gestión de riesgos a nivel municipal.
<b>Comments:</b>	El IGR-m en los municipios a ser intervenidos por el proyecto será calculado en el marco de la preparación de los planes de prevención y mitigación de desastres.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	End of project
Indice de Gestión de Riesgo Municipal (IGR-m) incrementado.	IGR-m		2011	P A	40,00	40,00

## Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
<b>Prevención y mitigación a nivel municipal</b>									
Producto 1.1: Obras estructurales de mitigación de riesgo ejecutadas.	obras				45,00				9.000.000,00
Producto 1.2: Obras no estructurales de mitigación de riesgo ejecutadas	obras				10,00				2.000.000,00
Producto 1.3: Planes de gestión de riesgo a nivel municipal formulados.	planes				20,00				1.640.000,00
Producto 1.4: Sistema Integral de Gestión del Riesgos SIGRET/CAPRA finalizado.	sistema				1,00				367.900,00
<b>Fortalecimiento de la capacidad de gestión integral de riesgos de desastres a nivel comunitario y municipal</b>									
Producto 2.1: Medidas de gestión integral de riesgos a desastres a nivel municipal implementadas	Municipios				10,00				712.800,00
Producto 2.2: Medidas prioritarias de gestión de riesgos a desastres a nivel comunitario implementadas	Comunidades				10,00				2.787.200,00
<b>Fortalecimiento institucional para la gestión integral de riesgo de desastres</b>									
Producto 3.1: Plan estratégico nacional para la gestión integral de riesgos de desastres elaborado	Plan				1,00				100.000,00
Producto 3.2: Gestión integral de riesgos de desastres incorporada a los planes estratégicos sectoriales	Plan				2,00				390.000,00
Producto 3.3: Plan de fortalecimiento Institucional de Comisión Permanente de Contingencia (COPECO) Implementado	Plan				1,00				930.000,00
<b>Educación e información para la gestión del riesgo</b>									
Producto 4.1: Estrategia de socialización de información de riesgo desarrollada.	Estrategia				1,00				250.000,00
Producto 4.2: Curricula relacionada a la gestión integral de riesgos de desastres implementada en escuelas primarias y secundarias	Municipios				20,00				300.000,00
Producto 4.3: Curricula de gestión integral de riesgos de desastres incorporada a carreras universitarias	Carreras universitarias				5,00				330.000,00

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Producto 4.4: Funcionarios municipales capacitados sobre la nueva reglamentación y normas técnicas de contrucción impartida.	Funcionarios				200,00				
<b>Administración del Programa</b>									
<b>Monitoreo y Evaluación</b>									
<b>Contingencias</b>									
<b>TOTAL</b>									<b>18.807.900,00</b>
