



Operation Number: **VE-L1031**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2014**
Last Update: **10/27/2014**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **10/30/2014**
Division Chief validation date: **10/31/2014**
Country Representative validation date: **11/03/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Strengthen National Capacity for Integrated Solid Waste Management	Loan Number:	2322/OC-VE
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE		
Team Leader:	Cressa Z.,Rudi	Sector/Subsector:	AS
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	VENEZUELA
Borrower:	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA		
		Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
VE-L1031	\$140,000,000.00	\$140,000,000.00	\$60,000,000.00	\$0.00	\$200,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
VE-L1031	\$140,000,000.00	\$22,008,513.12	15.72%	\$117,991,486.88


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

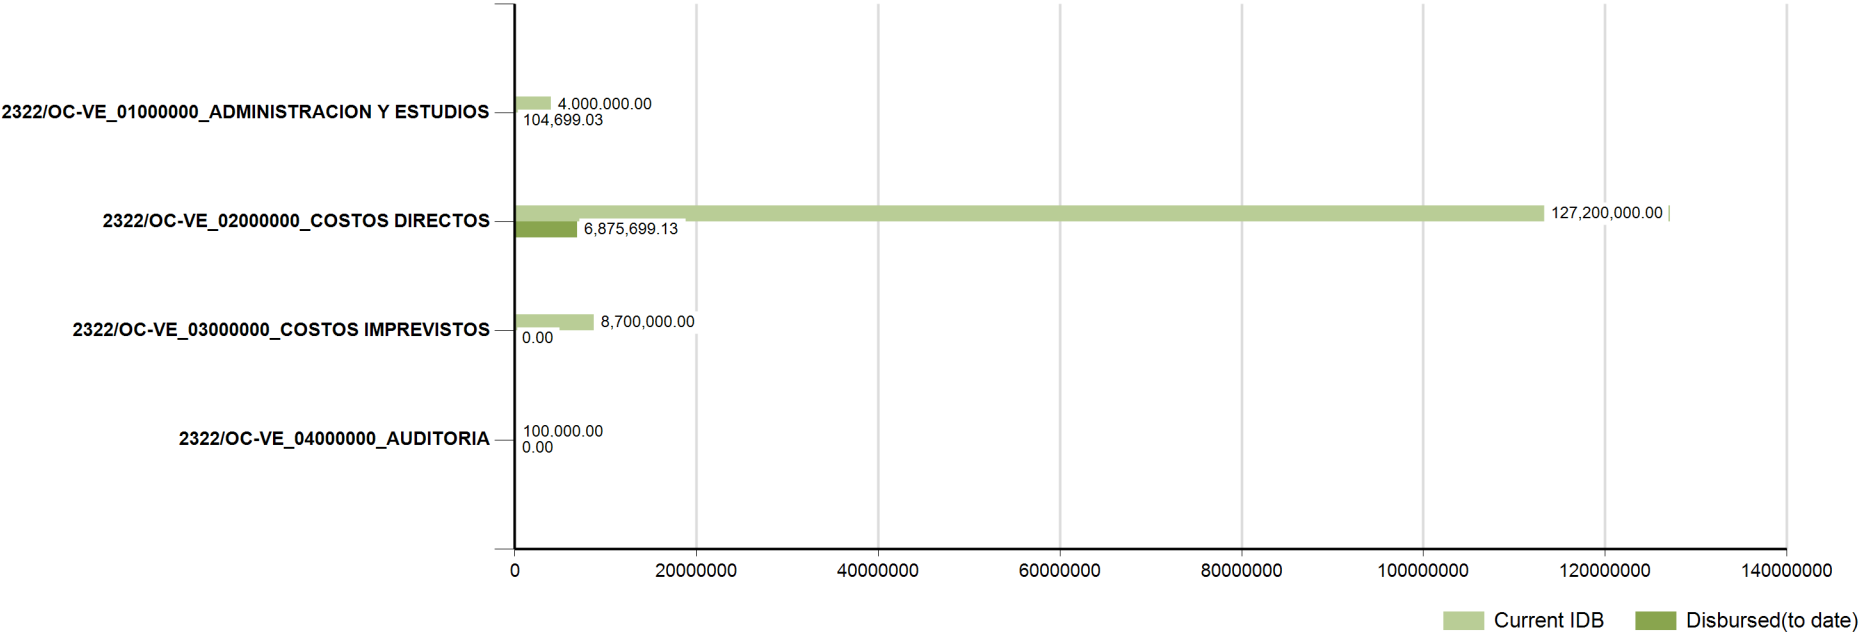

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Gestión integral de los residuos y desechos sólidos municipales mejorada en las zonas atendidas por el Programa.							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Vertederos a cielo abierto clausurados.		Vertederos	0.00	2011	Informes de gestión del Viceministerio de Conservación Ambiental y de la UEP del Programa.	Meta estimativa al momento del montaje de la operación, puede modificarse durante la ejecución.	P	5.00
							P(a)	5.00
							A	

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Residuos y desechos sólidos (RDS) dispuestos adecuadamente en los proyectos beneficiados con el Programa.
Observation:	Datos de línea base y logrados son acumulativos en relación a los proyectos elegibles del Programa.

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015		EOP
							P	P(a)	A
1.1 Residuos y desechos sólidos (RDS) enviados a vertederos a cielo abierto no controlados.		ton/día	1,100.00	2011	Información reportada por el operador/registros del vertedero actual, y del relleno sanitario a partir de su entrada en operación.	Datos preliminares de "línea base" referidos a los "proyectos muestra", y estimativos de la selección representativa de los rellenos adicionales a ser beneficiados con el Programa; la línea base será ajustada en relación a los proyectos que efectivamente	P		0.00
	P(a)						0.00	0.00	
	A								
1.2 Hogares cuyos residuos sólidos son dispuestos en rellenos sanitarios.		Hogares		2013			P		
	P(a)						5,000.00	5,000.00	
	A								
Outcome:	2 Sustentabilidad Ambiental y Social lograda en lo que a Residuos y Desechos (RDS) se refiere en los proyectos beneficiados por el Programa.								
Observation:									

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015		EOP
2.1 Residuos y desechos sólidos (RDS) separados en condiciones sanitarias y de seguridad en los proyectos beneficiados por el Programa.			Nº Proyectos	0.20	2011	Información reportada por el MPPA	Datos preliminares de "línea base" referidos a los "proyectos muestra", y estimativos de la selección representativa de los rellenos adicionales a ser beneficiados con el Programa; la línea base será ajustada en relación a los proyectos que efectivamente	P		4.00
							P(a)	4.00	4.00	
							A			
Outcome:	3 Fortalecimiento Institucional facilitado en las zonas beneficiadas por el Programa.									
Observation:										
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015		EOP
3.1 Planes de Gestión Integral de residuos y desechos sólidos.			Plan	0.00	2011	Información reportada por el MPPA	Meta estimativa que puede modificarse durante la ejecución.	P		5.00
							P(a)	5.00	5.00	
							A			

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Asistencia Técnica y Fortalecimiento Institucional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Anteproyectos diseñados y aprobados.	Anteproyecto	P	1.00	3.00	P	1,200,000.00	3,800,000.00
		P(a)	1.00	3.00	P(a)	742,000.00	3,000,000.00
		A	1.00	3.00	A		979,000.00
Planes de formalización de segregadores elaborados.	Plan	P	2.00	4.00	P	400,000.00	800,000.00
		P(a)	2.00	4.00	P(a)	230,000.00	800,000.00
		A	1.00	3.00	A		110,000.00
Infraestructura y Mejora Operacional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Rellenos Sanitarios Construidos.	Relleno	P	2.00	5.00	P	59,232,998.22	135,199,999.99
		P(a)	2.00	5.00	P(a)	52,303,218.00	135,200,000.00
		A	0.00	3.00	A	33,501,000.00	57,395,637.06
Residuos y desechos sólidos dispuestos, bajo operación transitoria durante el período de asistencia.	Ton/día	P	460.00	1,100.00	P	11,233,289.38	38,508,190.48
		P(a)	460.00	1,100.00	P(a)	15,040,000.00	39,600,000.00
		A	0.00	390.00	A	1,900,000.00	8,900,000.00

Costos administrativos y de supervisión
Costos imprevistos
Auditoría

Other Cost		2014	Cost
Maquinaria y Capacitación	P	\$750,000.00	\$3,000,000.00
	P(a)	\$1,000,000.00	\$3,000,000.00
	A		\$0.00
Costos administrativos y de supervisión	P	\$2,085,000.00	\$7,200,000.00
	P(a)	\$3,060,000.00	\$8,000,000.00
	A	\$763,000.00	\$1,595,000.00
Costos imprevistos	P	\$3,333,333.33	\$10,000,000.00
	P(a)		\$10,000,000.00
	A		\$0.00
Auditoría	P	\$50,000.00	\$200,000.00
	P(a)	\$60,000.00	\$200,000.00
	A	\$24,000.00	\$32,000.00
Estudios sectoriales y planes de comunicación elaborados.	P	\$60,000.00	\$200,000.00
	P(a)	\$93,500.00	\$200,000.00
	A		\$6,500.00
Total Cost		2014	Total Cost
	P	\$78,344,620.93	\$198,908,190.47
	P(a)	\$72,528,718.00	\$163,659,282.00
	A	\$36,188,000.00	\$69,018,137.06

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
