
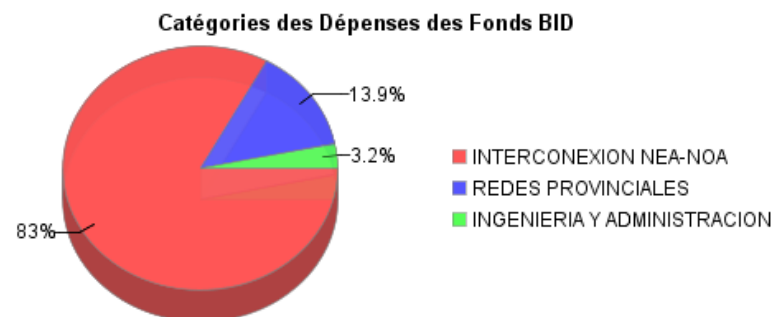
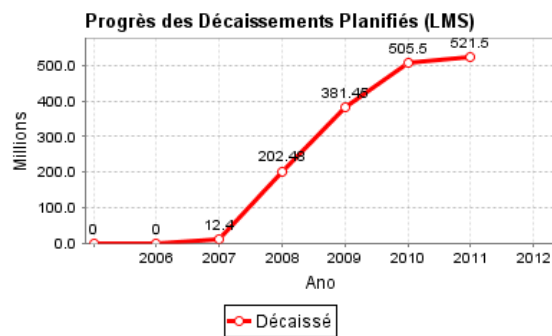



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS				
Secteur:	ENERGY-NEW POWER DISTRIBUTION & TRANSMISSION PROJECTS				
Numéro(s) de Prêt(s):	1764/OC-AR	Montant Courant Approuvé:	580.000.000,00	Initial BID:	580.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	528.496.370,68	Courant BID:	580.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	91,12	Pari Passu:	80,00
Opération(s) Connexe(s):	AR-L1095	Solde:	51.503.629,32	Cofinancement/Pays:	145.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	GOM - Global of Multiple Works Operation			Estimation Initiale:	725.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: A(R)	(X) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 30-abr-2012 Validé par le Représentant: 08-may-2012

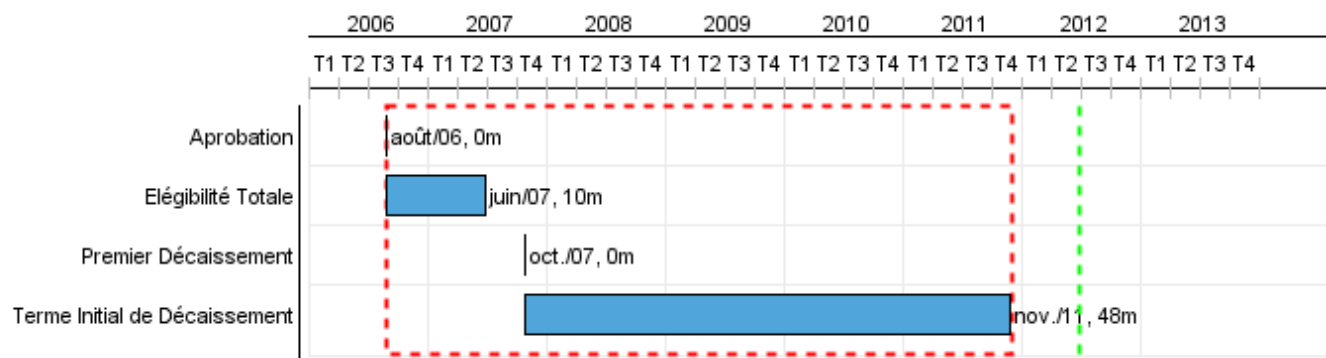

Progrès Cumulé à 2011

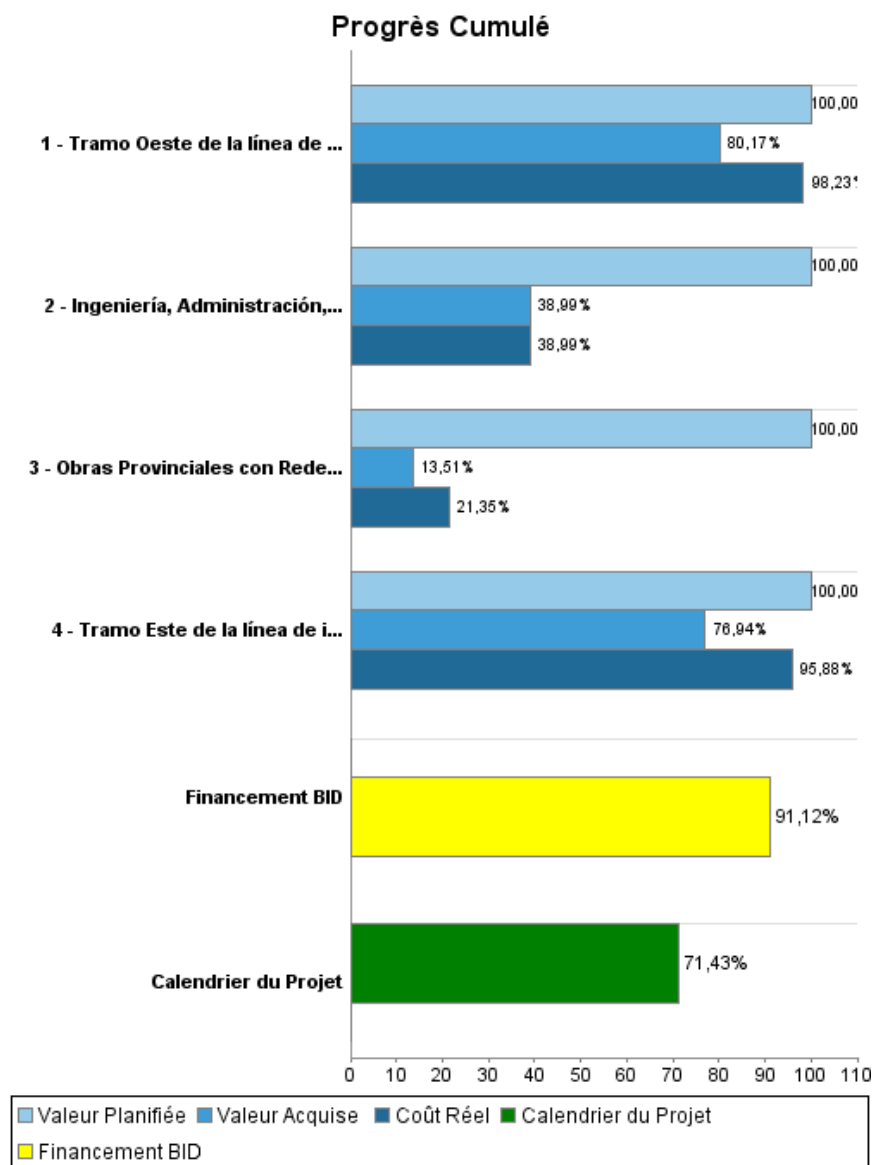

Résultats

Résultat:	Reforzar la red nacional de transmisión eléctrica y facilitar la competición en el mercado mayorista de generación.
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2014	Fin du Projet
Aumento del grado de electrificación en la Región del Norte Grande	%	77.30	2003	P A	87.00	87,00

Résultat:	Demanda de energía eléctrica del sistema de la región del Norte Grande, satisfecha
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2014	Fin du Projet
Disminuye la relación de Energía no Suministrada (ENS) con respecto a la demanda abastecida en los sistemas de transmisión regional	MWh/año x10(-4)	2.54	2004	P A	2.16	2,16

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente I - Obras Civiles y Electromecánicas para la Interconexión NEA-NOA									
Tramo Este de la línea de interconexion de extra alta tensión y EETT construida y operando	km				571,00	13.185.000,00	54.744.000,00		489.681.000,00
Tramo Oeste de la línea de interconexion de extra alta tensión y EETT construida y operando	km	83,00	83,00		637,00	37.039.000,00	24.799.000,00		504.005.000,00
Componente II - Obras civiles y electromecánicas para las redes de Transmisión y Subtransmisión Provincial y Regional del Norte Grande									
Obras Provinciales con Redes de transmisión, subtransmisión y Estaciones de transformación terminadas	Obras	12,00	1,00		16,00	141.909.000,00	27.803.000,00		203.691.000,00
Componente III - Ingeniería, Administración, Inspección, Escalonamiento e Imprevistos									
Ingeniería, Administración, Inspección, Escalonamiento e Imprevistos	0					28.611.000,00	3.703.000,00		40.123.000,00
TOTAL						220.744.000,00	111.049.000,00		1.237.500.000,00
