
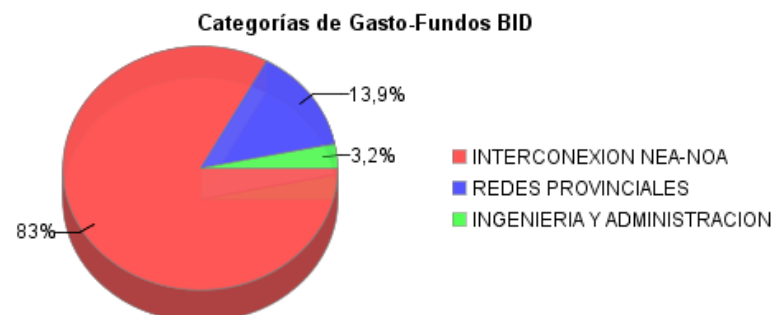
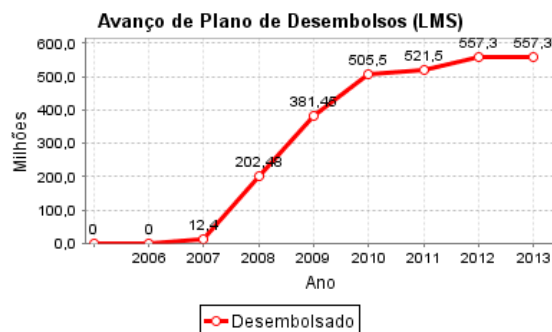



Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS				
Sector:	ENERGY-NEW POWER DISTRIBUTION & TRANSMISSION PROJECTS				
Número da Operação:	1764/OC-AR	Atual:	580.000.000,00	Original BID:	580.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	557.296.370,68	Corrente BID:	580.000.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	96,09	Pari-passu:	80,00
Operação Relacionada:	AR-L1095	Saldo:	22.703.629,32	Cofinanciamento/País:	145.000.000,00
Subtipo de Operação:	GOM - Global of Multiple Works Operation			Original Estimado:	725.000.000,00
				Período de Amortização (meses):	234

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	A(R) () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 09-abr-2013 Validado pelo Representante do País: 10-abr-2013

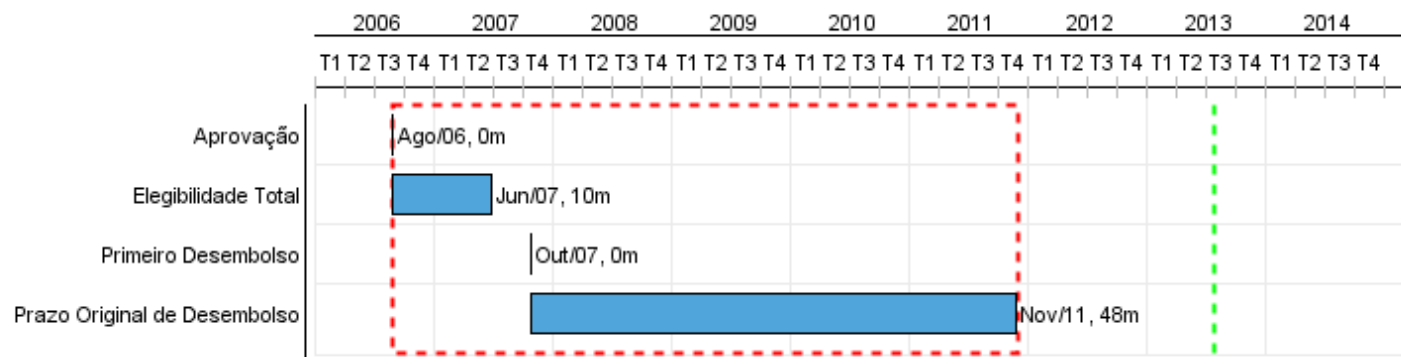

Progresso Acumulado até 2012

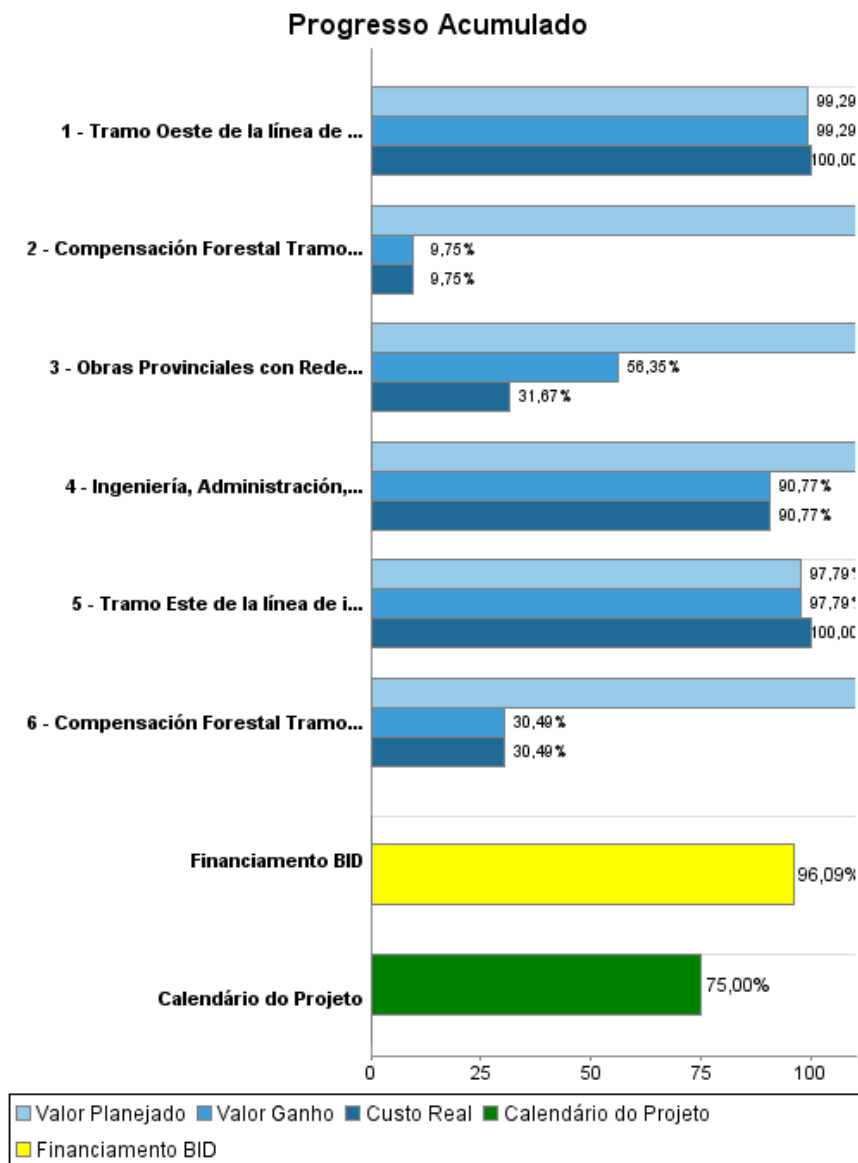

Resultados

Resultado: Reforzar la red nacional de transmisión eléctrica y facilitar la competición en el mercado mayorista de generación.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2014	Final do Projeto
Aumento del grado de electrificación en la Región del Norte Grande	%	77,30	2003	P A	87,00	87,00

Resultado: Demanda de energía eléctrica del sistema de la región del Norte Grande, satisfecha

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2014	Final do Projeto
Disminuye la relación de Energía no Suministrada (ENS) con respecto a la demanda abastecida en los sistemas de transmisión regional	MWh/año x10(-4)	2,54	2004	P A	2,16	2,16

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente I - Obras Civiles y Electromecánicas para la Interconexión NEA-NOA									
Tramo Este de la línea de interconexión de extra alta tensión y EETT construida y operando	km				571,00				494.141.000,00
Tramo Oeste de la línea de interconexión de extra alta tensión y EETT construida y operando	km				637,00				509.970.000,00
Compensación Forestal Tramo Este realizada	Obra Compensada				1,00	5.540.000,00	540.000,00		5.540.000,00
Compensación Forestal Tramo Oeste realizada	Obra Compensada				1,00	5.035.000,00	1.535.000,00		5.035.000,00
Componente II - Obras civiles y electromecánicas para las redes de Transmisión y Subtransmisión Provincial y Regional del Norte Grande									
Obras Provinciales con Redes de transmisión, subtransmisión y Estaciones de transformación terminadas	Obras	4,00	4,00		19,00	70.480.000,00	20.210.000,00		203.691.000,00
Componente III - Ingeniería, Administración, Inspección, Escalonamiento e Imprevistos									
Ingeniería, Administración, Inspección, Escalonamiento e Imprevistos	0					13.366.000,00	1.715.000,00		19.123.000,00
TOTAL						94.421.000,00	24.000.000,00		1.237.500.000,00
