
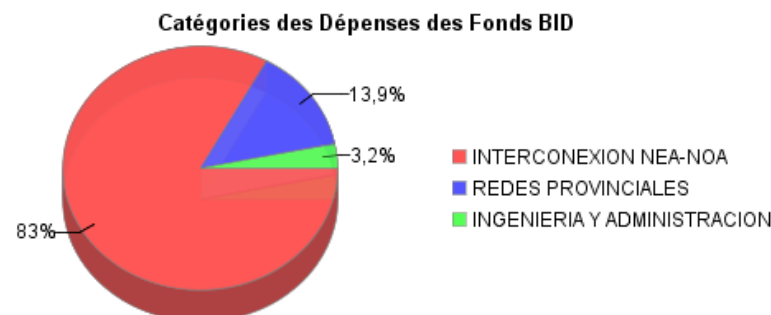
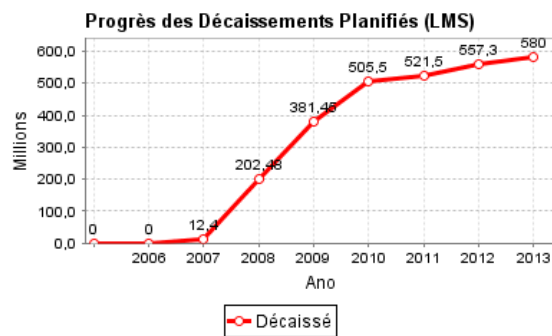



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS				
Secteur:	ENERGY-NEW POWER DISTRIBUTION & TRANSMISSION PROJECTS				
Numéro(s) de Prêt(s):	1764/OC-AR	Montant Courant Approuvé:	580.000.000,00	Initial BID:	580.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	577.596.370,68	Courant BID:	580.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	99,59	Pari Passu:	80,00
Opération(s) Connexe(s):	AR-L1095	Solde:	2.403.629,32	Cofinancement/Pays:	145.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	GOM - Global of Multiple Works Operation			Estimation Initiale:	725.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: A(R)	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 07-oct-2013 Validé par le Représentant: 25-oct-2013

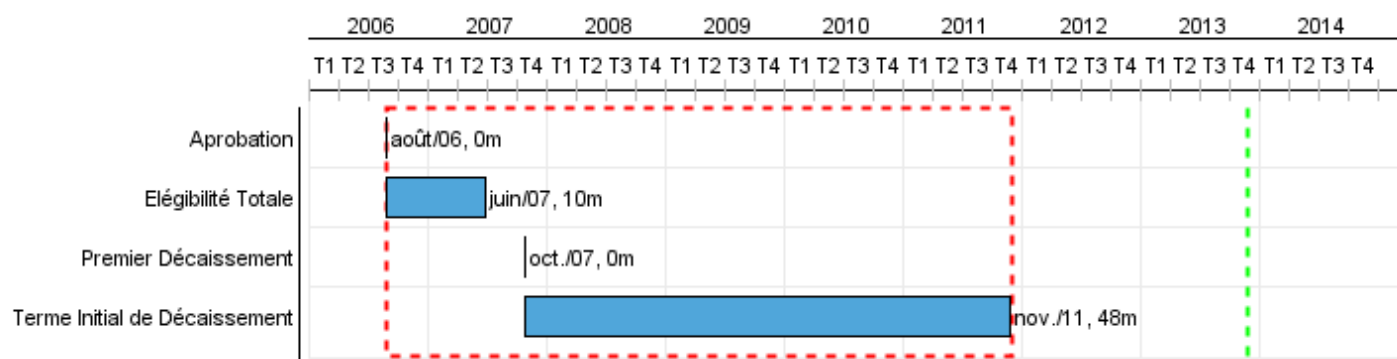

Progrès Cumulé à 2013

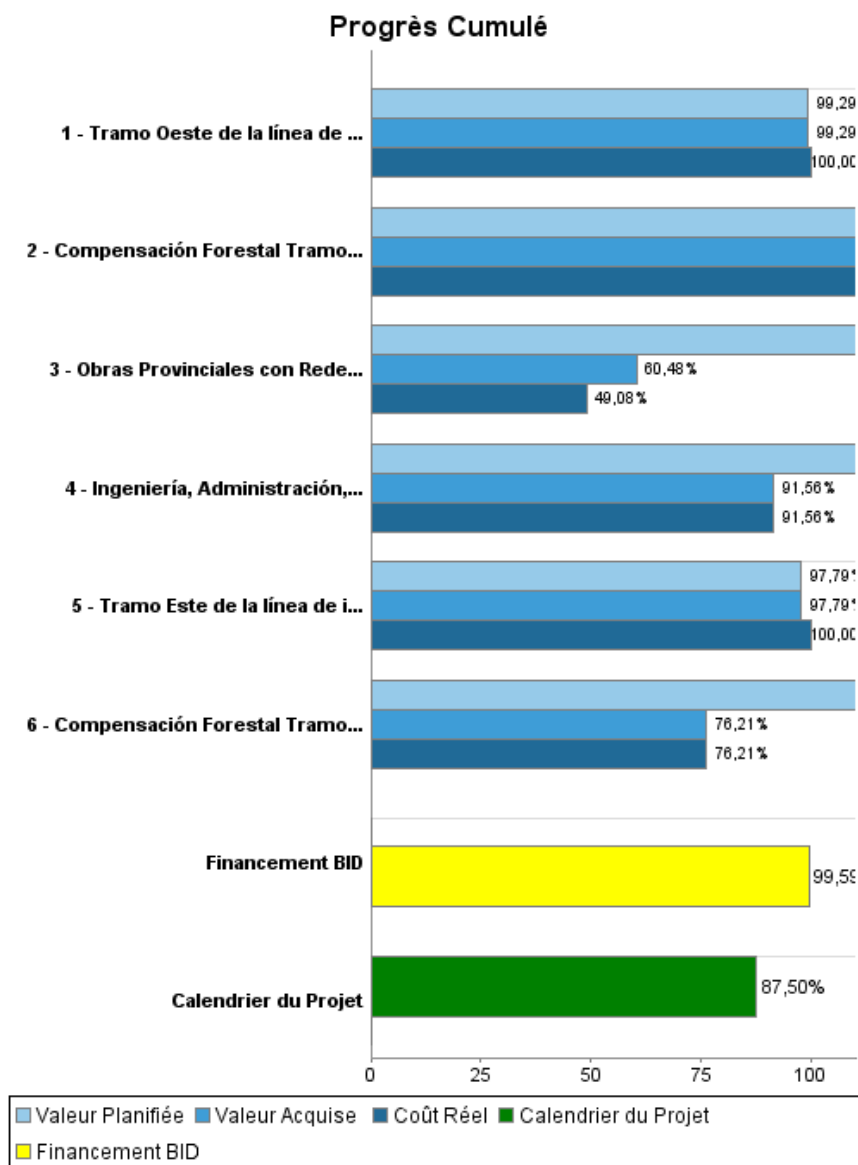

Résultats

Résultat: Reforzar la red nacional de transmisión eléctrica y facilitar la competición en el mercado mayorista de generación.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2014	Fin du Projet
Aumento del grado de electrificación en la Región del Norte Grande	%	77,30	2003	P A	87,00	87,00

Résultat: Demanda de energía eléctrica del sistema de la región del Norte Grande, satisfecha

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2014	Fin du Projet
Disminuye la relación de Energía no Suministrada (ENS) con respecto a la demanda abastecida en los sistemas de transmisión regional	MWh/año x10(-4)	2,54	2004	P A	2,16	2,16

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente I - Obras Civiles y Electromecánicas para la Interconexión NEA-NOA									
Tramo Este de la línea de interconexión de extra alta tensión y EETT construida y operando	km				571,00				494.141.000,00
Tramo Oeste de la línea de interconexión de extra alta tensión y EETT construida y operando	km				637,00				509.970.000,00
Compensación Forestal Tramo Este realizada	Obra Compensada				1,00	4.000.000,00	6.432.000,00		5.540.000,00
Compensación Forestal Tramo Oeste realizada	Obra Compensada				1,00	2.500.000,00	2.302.000,00		5.035.000,00
Componente II - Obras civiles y electromecánicas para las redes de Transmisión y Subtransmisión Provincial y Regional del Norte Grande									
Obras Provinciales con Redes de transmisión, subtransmisión y Estaciones de transformación terminadas	Obras	5,00	1,00		19,00	42.000.000,00	35.453.000,00		203.691.000,00
Componente III - Ingeniería, Administración, Inspección, Escalonamiento e Imprevistos									
Ingeniería, Administración, Inspección, Escalonamiento e Imprevistos	0					520.000,00	152.000,00		19.123.000,00
TOTAL						49.020.000,00	44.339.000,00		1.237.500.000,00
