
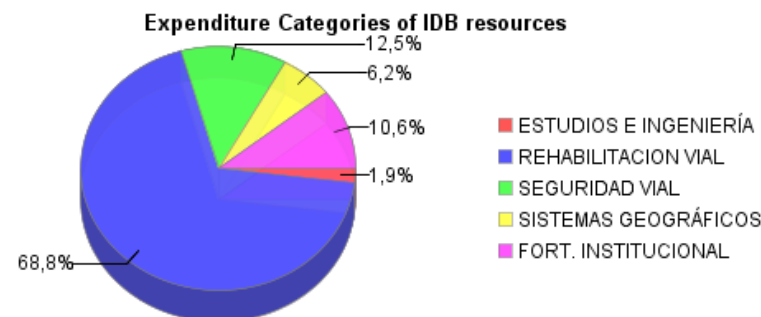
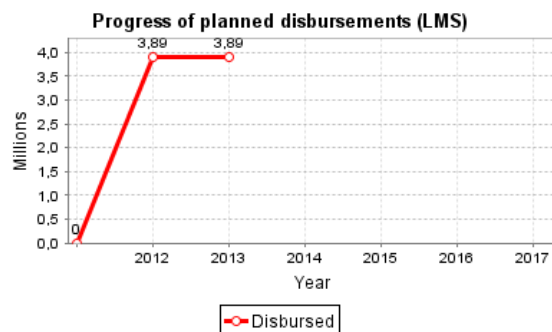


## Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS				
Sector:	TRANSPORT-RAILWAYS				
Loan Number(s):	2677/OC-UR	Current Approved Amount:	80.000.000,00	Original IDB:	80.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	3.886.559,00	Current IDB:	80.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	4,86	Pari-passu:	80,00
Related Operation(s):	RG-P1442, RG-P1478	Balance:	76.113.441,00	Co-Financing/Country:	20.000.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	100.000.000,00
				Amortization Period (months):	234

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	( ) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 12-abr-2013 Validated by Country Representative: 12-abr-2013

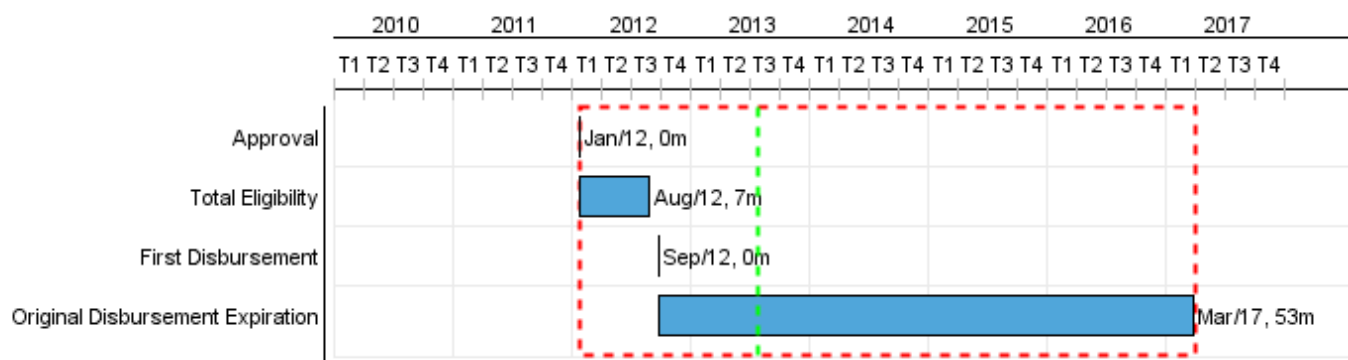

## Accumulated Progress as of 2012



## Outcomes

<b>Outcome:</b>	Conservación vial en corredores productivos en tramos de la red principal (corredores de integración y red primaria) y secundaria
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	End of project
Reducción de los costos de operación vehicular	% Reducción		2011	P A	2,50	2,50
Corredores internacionales y red primaria en MUY BUEN Estado de Conservación	Porcentaje	49,00	2011	P A	54,00	54,00
Corredores internacionales y red primaria en BUEN Estado de Conservación	Porcentaje	17,00	2011	P A	22,00	22,00
Corredores internacionales y red primaria en REGULAR Estado de Conservación	Porcentaje	18,00	2011	P A	13,00	13,00
Corredores internacionales y red primaria en MAL Estado de Conservación	Porcentaje	16,00	2011	P A	11,00	11,00
Red Secundaria en MUY BUEN Estado de Conservación	Porcentaje	6,00	2011	P A	11,00	11,00
Red Secundaria en BUEN Estado de Conservación	Porcentaje	19,00	2011	P A	24,00	24,00
Red Secundaria en REGULAR Estado de Conservación	Porcentaje	40,00	2011	P A	35,00	35,00
Red Secundaria en MAL Estado de Conservación	Porcentaje	35,00	2011	P A	30,00	30,00
Valor de Patrimonio Vial Ponderado en corredores internacionales y red primaria rehabilitados	Porcentaje	103,40	2011	P A	100,00	100,00
Valor de Patrimonio Vial Ponderado en red secundaria rehabilitada	Porcentaje	91,70	2011	P A	100,00	100,00
Valor de Patrimonio Vial Ponderado en red terciaria rehabilitada	Porcentaje	98,10	2011	P A	100,00	100,00
Valor de Patrimonio Vial Ponderado en total de la red rehabilitada	Porcentaje	99,60	2011	P A	100,00	100,00
IRI máximo en tramos de pavimentos de hormigón rehabilitados	m/Km		2011	P A	2,00	2,00
IRI máximo en tramos de pavimentos de carpeta asfáltica rehabilitados	m/Km		2011	P A	2,00	2,00
IRI máximo en tramos de pavimentos de tratamiento bituminoso rehabilitados	m/Km		2011	P A	2,80	2,80

<b>Outcome:</b>	Mejorar las condiciones de seguridad vial en la red interurbana
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	End of project
Accidentes con víctimas	% Reducción		2011	P A		20,00

<b>Outcome:</b>	Reorganización institucional del sector ferroviario
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	End of project
Conformación y puesta en marcha de empresa de infraestructura ferroviaria	Empresas		2011	P A		1,00
Conformación y puesta en marcha de empresa de transporte ferroviario	Empresa		2011	P A		1,00
Conformación y puesta en marcha de Dirección de Transporte Ferroviario	Dirección de TF		2011	P A		1,00
Eficiencia Productiva del sector ferroviario (Ton km transportadas por vagón disponible)	Ton/Km	0,24	2011	P A	0,23	0,57

<b>Outcome:</b>	Acceso y uso de información geográfica precisa
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	End of project
Usuarios identificados que, a los 24 meses de poner la inf. geográfica a su disposición, la utilizan	Porcentaje		2011	P A		60,00

## Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
<b>Estudios e Ingeniería</b>									
Estudios de factibilidad y diseños finales de ingeniería	Trabajos Aprobados	2,00			6,00				1.300.000,00
Informes de Auditoría Financiera con no objeción del BID.	Informes	1,00			3,00				300.000,00
Número de contratos de obra terminada	Contratos	1,00			6,00				100.000,00
Número de informes de evaluación del Programa aprobados.	Informes				2,00				100.000,00
<b>Rehabilitación Vial</b>									
Corredores internacionales o red primaria rehabilitados	Km	21,00			63,00				50.300.000,00
Longitud red secundaria rehabilitados	Km	21,00			63,00				18.900.000,00
<b>Seguridad Vial</b>									
Longitud de ruta iluminada	Km				57,00				5.000.000,00
Estudio de normativa de tratamiento de travesías urbanas entregado por el consultor a la DNV	Estudios				1,00				5.000.000,00
Piloto de travesías urbanas realizado	Pilotos				2,00				2.500.000,00
<b>Sistemas Geográficos</b>									
Relevamiento realizado	Relevamientos				1,00				6.000.000,00
Información procesada disponible para usuarios internos y externos al MTOP	Información Procesada				1,00				100.000,00
<b>Fortalecimiento Institucional</b>									
Auditorías de seguridad vial realizadas	Auditorías				10,00				2.000.000,00
Propuesta de reorganización de DNV diseñada y aprobada por MTOP	Propuestas				1,00				300.000,00
Sistemas de planificación y gestión de DNV implantados y operativos	Sistemas				2,00				2.000.000,00
Planes empresarios ferroviarios aprobados e implantados	Planes				1,00				6.000.000,00
Número de contratos de supervisión de consultoría terminados.	Contratos	1,00			1,00				100.000,00
<b>TOTAL</b>									<b>100.000.000,00</b>
