

PMR Operational Report

Operation Number	EC-L1160	Chief of Operations Validation Date	10/05/17
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2017	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/29/17	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Investment Plan to Support the Transition of the Energy Matrix in Ecuador	Loan Number	3710/OC-EC, 3711/KI-EC
Executing Agency	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE	Sector/Subsector	EN-REH - ENERGY-ENERGY SECTOR REHABILITATION AND EFFICIENCY
Team Leader	ECHEVERRIA, CARLOS BLADIMIR	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	ECUADOR
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE ECUADOR		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
EC-L1160	143,000,000	143,000,000	17,090,000	0	160,090,000	143,000,000	96,020,500	67.15%	46,979,500
Aggregated	143,000,000	143,000,000	17,090,000	0	160,090,000	143,000,000	96,020,500	67.15%	46,979,500

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

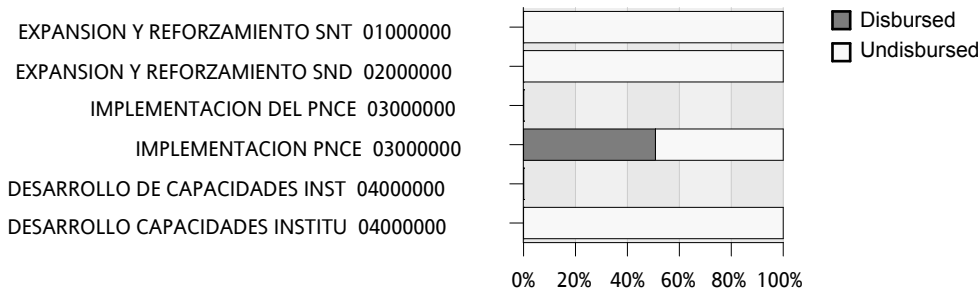

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Apoyar el avance del CME, mejorar los indicadores del sector y apoyar los planes de recuperación en las zonas afectadas por el sismo.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
0.0	Mejoramiento de la calidad del servicio en el SNT (disminución de la ENS por fallas y mantenimiento)	MWh/año	233662.0	2015	P		10,343.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Reporte de avance del Programa

Observations: CELEC EP-TRANSELECTRIC

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
0.1	Volúmen promedio anua de intercambios regionales de energía (Ecuador-Colombia-Perú)	GWh/año	496.0	2015	P		867.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Reporte de avance del Programa

Observations: CELEC EP-TRANSELECTRIC

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
0.2	Mejora de la continuidad del servicio de distribución eléctrica-Disminución de la ENS	MWh/año	15421.0	2015	P		14,650.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Reporte de avance del Programa

Observations: MEER

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
0.3	Mitigación cambio climático-Emissiones de CO2	kTonCO2	169.81	2015	P		30.25

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

0.3	anuales disminuídas por desplazamiento de GLP por electricidad (kt CO2 eq/año)	eq/año	169.81	2015	P(a)		
					A		
Details							
Means of verification: Reporte de avance del Programa							
Observations: MEER							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
0.4	Volúmen de GLP desplazado por el PNCE	BEP	434543.0	2015	P		82,559.00
					P(a)		
					A		
Details							
Means of verification: Reporte de avance del Programa							
Observations: MEER							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Componente I.Expansión y Reforzamiento del SNT

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2020
0.0	km de líneas de transmisión en 230kV incrementados	km	2166.4	2015	P	2,166.40	2,248.40
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Reporte de avance del Programa

Observations: MEER

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2020
0.1	Capacidad de transformación nueva instalada en el SNT	MVA	9343.0	2015	P	9,343.00	9,568.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Reporte de avance del Programa

Observations: MEER

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 1: Componente I.Expansión y Reforzamiento del SND

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2020
1.0	FMIk: Frecuencia media en interrupciones por KVA	veces/año	8.27	2015	P	7.01	7.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Reporte de avance del Programa

Observations: MEER

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of	Baseline	Baseline		2018	EOP 2020
-----------	---------	----------	----------	--	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

		Measure		Year			
1.1	TTIk: Tiempo total de interrupciones (horas)	horas/año	7.17	2015	P	6.85	6.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Reporte de avance del Programa

Observations: MEER

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2020
1.2	Viviendas sin servicio eléctrico y viviendas con servicio eléctrico mejorado, atendidas por el programa	número	0.0	2015	P	15,183.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Reporte de avance del Programa

Observations: MEER

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2020
1.3	Clientes afroecuatorianos e indígenas beneficiados por el programa	número	0.0	2015	P	8,718.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Reporte de avance del Programa

Observations: MEER

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 2: Componente III. Implementación del PNCE

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2020
2.0	Número de Cocinas Eléctricas de Inducción vendidas con el Fondo de Cocción Eficiente	número	270000.0	2015	P	348,746.00
					P(a)	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.0	Número de Cocinas Eléctricas de Inducción vendidas con el Fondo de Cocción Eficiente	número	270000.0	2015	A		
Details							
Means of verification: Reporte de avance del Programa							
Observations: MEER							
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No

Outcome Nbr. 3: Componente IV.Desarrollo de Capacidades Institucionales

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2020
3.0	Instituciones fortalecidas en integración energética regional	número de instituciones	0.0	2015	P	1.00
					P(a)	2.00
					A	

Details							
Means of verification: Reporte de avance del Programa							
Observations: MEER							
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2020
3.1	Empresas Eléctricas e instituciones capacitadas en gestión y monitoreo LOSPEE	número de entidades	0.0	2015	P	16.00
					P(a)	21.00
					A	

Details							
Means of verification: Reporte de avance del Programa							
Observations: MEER							
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2020
3.2	Mujeres capacitadas con el Programa	número de mujeres	0.0	2015	P	15.00
					P(a)	20.00
					A	

Details							
---------	--	--	--	--	--	--	--

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Reporte de avance del Programa

Observations: MEER

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I.Expansión y Reforzamiento del SNT

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2020	2017	EOP 2020
1.1	Construcción L/T Milagro-Babahoyo 230kV, 47km, doble circuito, 1200 ACAR	%	P	45	100	8,269,650.97	15,505,157
			P(a)	45	100	8,269,650.97	15,505,157
			A	26.5	31.5	0	0
1.2	S/E Milagro 138kV, ampliación	%	P	45	100	543,321.59	1,018,727.98
			P(a)	45	100	543,321.59	1,018,727.98
			A	26.5	31.5	0	0
1.3	S/E Babahoyo 138kV y 69kV, ampliación	%	P	45	100	1,880,119.92	3,525,224.84
			P(a)	45	100	1,880,119.92	3,525,224.84
			A	26.5	31.5	0	0
1.4	S/E Quevedo, ampliación 1 Bahía Línea 230kV	%	P	45	100	673,893.44	1,353,724.27
			P(a)	45	100	673,893.44	1,353,724.27
			A	26.5	31.5	0	0
1.5	S/E San Gregorio, ampliación patio 230kV, conexión Quevedo y San Juan de Manta	%	P	45	100	2,336,806.21	4,694,706.64
			P(a)	45	100	2,336,806.21	4,694,706.64
			A	26.5	31.5	0	0
1.6	Construcción L/T San Gregorio-San Juan de Manta 230kV, 35km, doble circuito 1200 ACAR (montaje de los dos circuitos)	%	P	45	100	7,306,324.96	14,677,022.83
			P(a)	45	100	7,306,324.96	14,677,022.83
			A	26.5	31.5	0	0
1.7	Construcción S/E San Juan de Manta 230/69kV, 225MVA	%	P	45	100	9,779,636.12	19,645,436.44
			P(a)	45	100	9,779,636.12	19,645,436.44
			A	26.5	31.5	0	0

Component Nbr. 2 Componente II.Expansión y Reforzamiento del SND

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2020	2017	EOP 2020
2.1	Proyectos de subtransmisión, fiscalizados y energizados	número de proyectos	P	1	6	3,526,786.56	4,299,066.13
			P(a)	1	6	2,149,533.07	4,299,066.14
			A	0	0	1,264,348.94	1,264,348.94
2.2	Proyectos de Distribución, fiscalizados y energizados	número de proyectos	P	25	47	6,119,693.86	6,461,933.87
			P(a)	25	47	3,230,966.94	6,461,933.88
			A	1	1	1,766,768.04	1,766,768.04
2.3	Proyectos de automatización de subestaciones fiscalizados y energizados	número de proyectos	P	0	11	305,964	720,000
			P(a)	0	11	305,964	720,000
			A	0	0	0	0
2.4	Proyectos de automatización de alimentadores fiscalizados y energizados	número de proyectos	P	0	40	3,055,200	5,472,000
			P(a)	0	40	2,736,000	5,472,000
			A	0	0	0	0
2.5	Proyectos de electrificación rural con extensión de red, fiscalizados y energizados	número de proyectos	P	150	389	25,444,209.08	26,375,000
			P(a)	150	389	13,187,500	26,375,000
			A	0	0	8,099,136.16	8,099,136.16
2.6	Proyectos de electrificación rural sin extensión de red, fiscalizados y energizados	número de proyectos	P	2	7	1,132,000	1,132,000
			P(a)	2	7	566,000	1,132,000
			A	0	0	287,508	287,508

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente III. Implementación del Plan Nacional de Cocción Eficiente

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2020	2017	EOP 2020
3.1	Cocinas de inducción eléctricas financiadas con este programa	unidades vendidas	P	250	78,746	32,085.56	50,050,000
			P(a)	346	78,746	203,374.35	50,050,000
			A	335	78,735	203,374.35	50,050,000
3.2	Circuitos expresos instalados	número de circuitos	P	0	75,462		3,269,000
			P(a)	0	75,462	0	3,269,013.84
			A	0	75,462	0	3,269,013.84

Component Nbr. 4 Componente IV. Desarrollo de Capacidades Institucionales

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2020	2017	EOP 2020
4.1	Estudios para el apoyo al fortalecimiento institucional en el sector eléctrico en base a LOSPEE y para la integración eléctrica regional, realizados	número de estudios	P	4	8	450,756	829,000
			P(a)	0	8	0	829,000
			A	0	0	0	0
4.2	Taller de capacitación para el fortalecimiento de capacidades en gestión y monitoreo (empresas e instituciones) según lineamientos de la LOSPEE, realizados	número de talleres	P	0	25		57,000
			P(a)	0	25	0	57,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

Auditorías externas		P			8,000	151,000
		P(a)			8,000	151,000
		A			0	0
Evaluación intermedia y final		P			45,600	103,000
		P(a)			30,000	103,000
		A			0	0
Monitoreo y seguimiento		P			36,000	151,000
		P(a)			36,000	151,000
		A			0	0
Unidad de Gestión		P			171,000	600,000
		P(a)			163,876.95	600,000
		A			93,400.64	124,523.69

Total Cost

Total Cost		P			71,117,048.27	160,090,000
		P(a)			53,406,968.52	160,090,013.86
		A			11,714,536.13	64,861,298.67

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section
