

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	CO-L1028	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	03/16/18
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	03/16/18
<b>Last Update</b>	03/15/18	<b>Country Representative Validation Date</b>	03/16/18
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Water and Sanitation Program for the Municipio of Pasto	<b>Loan Number</b>	2183/OC-CO, 2183/OC-CO-1
<b>Executing Agency</b>	Empresa de Obra Sanitaria de Pasto, Empresa de Obra Sanitaria de Pasto	<b>Sector/Subsector</b>	AS - WATER AND SANITATION
<b>Team Leader</b>	NAVARRETE JIMENEZ, MANUEL JOSE	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	COLOMBIA
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	Empresa de Obra Sanitaria de Pasto		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CO-L1028	27,800,000	27,800,000	16,200,000	0	44,000,000	27,800,000	26,241,726.38	94.39%	1,558,273.62
Aggregated	27,800,000	27,800,000	16,200,000	0	44,000,000	27,800,000	26,241,726.38	94.39%	1,558,273.62

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

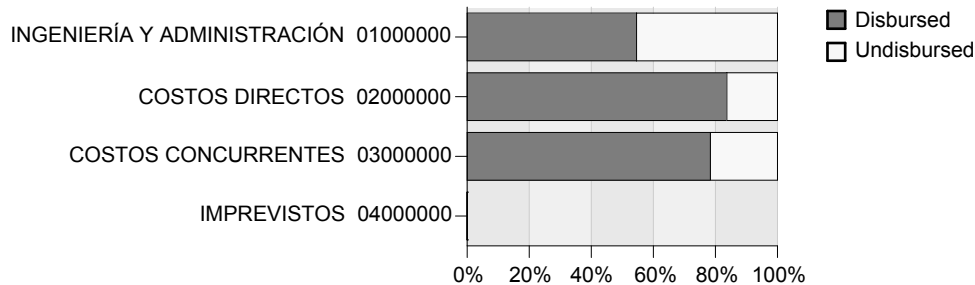

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

### IMPACTS

No information available for this section

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Calidad del Río Pasto (medida en la estación Club de Tenis) mejorada

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.5	Descargas (descoles) directas a los cuerpos de agua (río pasto y afluentes) de aguas residuales	Número	2006	P	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
				P(a)	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00
				A		6.00	6.00	4.00	3.00	2.00	0.00				0.00

#### Details

**Means of verification:** Reportes de EMPOPASTO

**Observations:** La meta esperada se medirá a final del proyecto (2015)

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.6	Reportes año por inundaciones y/o rebosamientos de aguas residuales (negras)	Número	2011	P			0.00	0.00	0.00	0.00	5.00				5.00
				P(a)			0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
				A			10.00	8.00	4.00	5.00	5.00	5.00	3.00		3.00

#### Details

**Means of verification:** Reportes de EMPOPASTO

**Observations:** Debido a la forma que esta definido el indicador y la ausencia de información de detalle, el indicador registrará indistintamente eventos de diferente magnitud. La meta esperada se medirá a final del proyecto (2015)

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.7	Caudal interceptado Colector Lateral Izquierdo en el sector Juan XIII	lts/seg	2013	P											
				P(a)						301.00	592.00	0.00	70.00	0.00	592.00
				A					262.00	301.00	359.00	0.00	70.00		346.00

#### Details

**Means of verification:** Información basada en datos reportados por el laboratorio de calidad de Empopasto, e información primaria con la cual cuenta la Empresa. Los datos corresponden al mes de agosto (época de verano)

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 2:** Cobertura del servicio de acueducto mejorada

**Observation:**

Indicator	Unit of	Baseline	Baseline		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-----------	---------	----------	----------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Calidad del Río Pasto (medida en la estación Club de Tenis) mejorada

**Observation:**

Details			
<b>Means of verification:</b> Reportes de EMPOPASTO			
<b>Observations:</b> La meta esperada se medirá a final del proyecto (2015)			
<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No

Details			
<b>Means of verification:</b> Reportes de EMPOPASTO			
<b>Observations:</b> Debido a la forma que esta definido el indicador y la ausencia de información de detalle, el indicador registrará indistintamente eventos de diferente magnitud. La meta esperada se medirá a final del proyecto (2015)			
<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No

Details			
<b>Means of verification:</b> Información basada en datos reportados por el laboratorio de calidad de Empopasto, e información primaria con la cual cuenta la Empresa. Los datos corresponden al mes de agosto (época de verano)			
<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No

**Outcome Nbr. 2:** Cobertura del servicio de acueducto mejorada

**Observation:**

Indicator	Unit of	Baseline	Baseline		2018	EOP 2018
-----------	---------	----------	----------	--	------	----------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

		Measure		Year										
2.1	Hogares atendidos por EMPOPASTO con servicio de acueducto	Households (#)	58,750.00	2008	P	1,200.00	1,300.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00		
					P(a)	1,200.00	1,300.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	1,400.00	1,000.00
					A	858.00	1,708.00	1,463.00	1,593.00	1,714.00	3,879.00	1,528.00	3,064.00	4,044.00

#### Details

**Means of verification:** Valor a generar el área comercial de la EMPOPASTO

**Observations:** Se definió como año Base 2008, para hacerlo homologable al indicador de usuarios de estratos 1 y 2. La línea base se corrigió pues la inicial (62,500) hacia referencia al total de usuarios de Empopasto (esto es, incluyendo usuarios no-residenciales). Par

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No										
	Afro-descendant				P										
					P(a)										
					A										
	Indigenous				P										
					P(a)										
					A										

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2.2	Hogares en los estratos 1 y 2 del área urbana atendidos por EMPOPASTO con el servicio de acueducto	Hogares	31,229.00	2008	P	722.00	783.00	360.00	360.00	360.00	360.00	366.00			
					P(a)	722.00	783.00	360.00	360.00	360.00	360.00	366.00	400.00	400.00	0.00
					A	843.00	488.00	508.00	892.00	436.00	2,963.00	771.00	1,802.00	2,532.00	

#### Details

**Means of verification:** Reportes de usuarios del área comercial de EMPOPASTO

**Observations:** Se ajusta la línea base asumiendo que para 2008 el número de usuarios realmente correspondiente a estratos 1 y 2 corresponden al porcentaje reportado en 2009 con respecto a la proyección para ese año (83%). La nueva Meta FDP se determinó sumando los avanc

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No										
------------	--	----	---------------	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Outcome Nbr. 3:** Nivel de riesgo financiero de EMPOPASTO mantenido a un nivel bajo

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
3.1	Razón de Liquidez (Activo corriente/ Pasivo corriente)	Ratio	1.00	2009	P	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				1.00
					P(a)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
					A	2.58	2.08	1.97	2.85	2.90	2.84	3.25	3.04	2.83		

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

		Measure		Year			
2.1	Hogares atendidos por EMPOPASTO con servicio de acueducto	Households (#)	58,750.00	2008	P		66,172.00
					P(a)	0.00	70,565.00
					A		74,557.00

#### Details

**Means of verification:** Valor a generar el área comercial de la EMPOPASTO

**Observations:** Se definió como año Base 2008, para hacerlo homologable al indicador de usuarios de estratos 1 y 2. La línea base se corrigió pues la inicial (62,500) hacia referencia al total de usuarios de Empopasto (esto es, incluyendo usuarios no-residenciales). Par

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
	Afro-descendant		
		P	
		P(a)	
		A	
	Indigenous		
		P	
		P(a)	
		A	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
2.2	Hogares en los estratos 1 y 2 del área urbana atendidos por EMPOPASTO con el servicio de acueducto	Hogares	31,229.00	2008	P	35,006.00
					P(a)	37,725.00
					A	39,932.00

#### Details

**Means of verification:** Reportes de usuarios del área comercial de EMPOPASTO

**Observations:** Se ajusta la línea base asumiendo que para 2008 el número de usuarios realmente correspondiente a estratos 1 y 2 corresponden al porcentaje reportado en 2009 con respecto a la proyección para ese año (83%). La nueva Meta FDP se determinó sumando los avanc

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

**Outcome Nbr. 3:** Nivel de riesgo financiero de EMPOSPASTO mantenido a un nivel bajo

**Observation:**

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Details																
Means of verification: Valor a obtener de los estados financieros de EMPOPASTO																
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No									
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
3.2	Endeudamiento financiero (Deuda Financiera/Pasivo Total)	Porcentaje	40.00	2009	P	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00				40.00
					P(a)	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
					A	17.95	15.10	9.69	23.88	34.58	52.49	67.04	62.25	64.70		
Details																
Means of verification: Valor a obtener de los estados financieros de EMPOPASTO																
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No									
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
3.3	Eficiencia Comercial (Monto recaudado en un año / Monto facturado en un año)	Porcentaje	85.00	2009	P	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00				85.00
					P(a)	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
					A	91.47	94.74	96.80	97.75	100.11	98.14	97.95	98.70	93.10		
Details																
Means of verification: Valor a obtener de los estados financieros de EMPOPASTO																
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No									
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
3.4	Cobertura de Intereses (Utilidad operativa / Gastos financieros)	Ratio	1.50	2009	P	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50				1.50
					P(a)	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
					A	1.99	-2.87	6.72	10.41	12.54	11.74	9.68	5.03	2.62		
Details																
Means of verification: Valor a obtener de los estados financieros de EMPOPASTO																
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No									
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
3.5	EBITDA (Resultado del año antes de Depreciación, Amortización e Intereses) / Ingresos Operacionales del Servicio	Porcentaje	20.00	2009	P	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00				20.00
					P(a)	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
					A	38.76	33.54	44.00	43.70	39.11	25.47	57.30	33.42	36.20		

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Details																
<b>Means of verification:</b> Valor a obtener de los estados financieros de EMPOPASTO																
<b>Pro-Gender</b>				No	<b>Pro-Ethnicity</b>				No							

**Outcome Nbr. 4:** Nuevos hogares con acceso a servicios de saneamiento mejorado en la zona rural

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
4.1	Hogares rurales con acceso a servicios mejorados de agua potable y saneamiento	Households (#)	0.00	2009	P		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00				6,200.00
					P(a)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	2,810.00
					A				0.00	960.00	0.00	0.00	1,851.00	0.00		960.00

Details																
<b>Means of verification:</b> Valor a proveer por la Secretaria de Gestión Ambiental del Municipio de Pasto																
<b>Observations:</b> La línea base de este indicador es cero (0), refiriéndose la meta, por tanto, a nuevos hogares rurales con acceso a servicios mejorados de agua y saneamiento																
La meta esperada se medirá al final del proyecto (2015)																
<b>Pro-Gender</b>				No	<b>Pro-Ethnicity</b>				No							

	Afro-descendant				P											
					P(a)											
					A											
	Indigenous				P											
					P(a)											
					A											

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
4.2	Sostenibilidad financiera sistemas rurales construidos - Razón de liquidez (Activo Corriente/Pasivo Corriente)	Ratio	0.00	2011	P		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00				1.00
					P(a)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00		1.00
					A					0.00	1.00	1.00	1.00	1.00		

Details																
<b>Means of verification:</b> Reportes de la Secretaria de Gestión Ambiental (SGA) del Municipio de Pasto																
<b>Observations:</b> La línea base de este indicador es cero (0), por cuanto se refiere a la sostenibilidad financiera de los nuevos sistemas rurales a ser administrados y operados por organizaciones de base comunitaria. EMPOPASTO S.A E.S.P no tiene competencia en la zona rur																
<b>Pro-Gender</b>				No	<b>Pro-Ethnicity</b>				No							

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------



## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

4.3	Eficiencia comercial de los sistemas rurales construidos - Recaudado (Monto Facturado/Monto Recaudado en un año)	Porcentaje	0.00	2011	P		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00				85.00
					P(a)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	85.00		85.00
					A					60.00	74.70	74.70	74.70	74.70		

#### Details

**Means of verification:** Reportes de la Secretaria de Gestión Ambiental (SGA) del Municipio de Pasto

**Observations:** La línea base de este indicador es cero (0), por cuanto se refiere a la eficiencia comercial de los nuevos sistemas rurales a ser administrados y operados por organizaciones de base comunitaria. EMPOPASTO S.A. E.S.P. no tiene competencia en la zona rural

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 5:** Eficiencia operativa de EMPOPASTO mejorada

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
5.1	Eficiencia Energética	KWH/m3	0.13	2011	P											0.00
					P(a)							0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
					A					0.12	0.12	0.11	0.11	0.14		

#### Details

**Means of verification:** Reporte del área de Producción de EMPOPASTO S.A. E.S.P.

**Observations:** La línea base de este indicador, así como su correspondiente meta final y metas intermedias, se tendrá una vez se cuente con los diseños de la Planta Piedras.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
5.2	Índice de Agua no Contabilizada (m3 facturados en el año/ m3 producidos en el año)*100	Porcentaje	42.20	2009	P	42.20	42.00	41.00	40.00	39.00	38.00	37.00				37.00
					P(a)	42.20	42.00	41.00	40.00	78.50	38.00	37.00	37.00	37.00	32.20	37.00
					A	38.37	39.88	37.86	37.52	37.16	35.38	34.68	33.98	30.36		

#### Details

**Means of verification:** Reportes anuales de EMPOPASTO

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Obras de Agua Potable

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
1.1	Planta de tratamiento de Agua Potable construida (Transferencia de recursos a FINDETER)	Planta de tratamiento	P		1		2,282,000
			P(a)		1		2,304,891
			A		1		9,856,444
1.2	Sectores del sistema de acueducto con obras de control de agua no contabilizada (macro y micromedidores, válvulas) instaladas	Sectores	P		13		2,134,860
			P(a)		10		1,373,830
			A		10		1,462,811
1.3	Mejoramiento hidráulico redes acueducto	mt	P		9,332		4,245,000
			P(a)	3,000	15,835	793,956	3,643,269
			A	2,149	14,660	577,172	3,363,969
1.4	Plan Maestro de Acueducto	Plan Maestro	P		0		0
			P(a)	0	1	608,739	673,906
			A	0	0	192,706	192,706

## Component Nbr. 2 Obras de Alcantarillado

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
2.1	Colectores (longitud de la vía intervenida) construidos y funcionando	km	P		8		16,487,240
			P(a)	1.48	9.85	2,528,552	15,683,862
			A	1.09	9.14	2,049,383	14,952,462
2.2	Redes de alcantarillado (longitud vía intervenida) construidos y funcionando	km	P		6		7,494,180
			P(a)	0	6.16	0	5,560,533
			A	0	6.16	48,601	5,560,533
2.3	Plan Maestro de Alcantarillado	Plan Maestro	P		0		0
			P(a)	0	1	608,739	673,906
			A	0	0	192,706	192,706

## Component Nbr. 3 Fortalecimiento Empresarial

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
3.1	Plan estratégico integrado a hechos y propósitos	Plan estratégico	P		1		290,000
			P(a)		1		139,033
			A		1		288,144
3.2	Estructura organizacional con enfoque por procesos implementada	Estructura organizacional	P		1		308,000
			P(a)		1	104,396	574,483
			A		0	48,906	550,883

## Component Nbr. 4 Agua para el Campo

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
4.1	Sistemas de acueducto y/o saneamiento rural construidos y/o mejorados	sistemas	P		10		3,671,000
			P(a)	0	5	0	1,821,322
			A	0	5	42,776	1,821,322

## Other Cost

	Costos administrativos	P					7,087,720
		P(a)				1,223,267	8,756,621

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Costos administrativos	A			1,497,325	8,343,021
--	------------------------	---	--	--	-----------	-----------

Total Cost

	Total Cost	P				44,000,000
		P(a)			5,867,649	41,205,656
		A			4,649,575	46,585,001

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Mejoramiento hidráulico redes acueducto	Modify Output	Empopasto se cumpliendo la ejecución base de la prórroga de la fecha de último desembolso, aunque los pagos pasan vigencia a 2018 efecto de liquidación y pagos finales de contratos.	02/13/2018	02/13/2018
Output	Colectores (longitud de la vía intervenida) construidos y funcionando	Modify Output	Empopasto se cumpliendo la ejecución base de la prórroga de la fecha de último desembolso, aunque los pagos pasan vigencia a 2018 efecto de liquidación y pagos finales de contratos.	02/13/2018	02/13/2018
Output	Colectores (longitud de la vía intervenida) construidos y funcionando	Modify Output	Empopasto se cumpliendo la ejecución base de la prórroga de la fecha de último desembolso, aunque los pagos pasan vigencia a 2018 efecto de liquidación y pagos finales de contratos.	02/13/2018	02/13/2018
Output	Estructura organizacional con enfoque por procesos implementada	Modify Output	Empopasto se cumpliendo la ejecución base de la prórroga de la fecha de último desembolso, aunque los pagos pasan vigencia a 2018 efecto de liquidación y pagos finales de contratos.	02/13/2018	02/13/2018
Output	Mejoramiento hidráulico redes acueducto	Modify Output	Empopasto se cumpliendo la ejecución base de la prórroga de la fecha de último desembolso, aunque los pagos pasan vigencia a 2018 efecto de liquidación y pagos finales de contratos.	02/13/2018	02/13/2018
Output	Plan Maestro de Acueducto	Modify Output	Empopasto se cumpliendo la ejecución base de la prórroga de la fecha de último desembolso, aunque los pagos pasan vigencia a 2018 efecto de liquidación y pagos finales de contratos.	02/13/2018	02/13/2018
Output	Plan Maestro de Alcantarillado	Modify Output	Empopasto se cumpliendo la ejecución base de la prórroga de la fecha de último desembolso, aunque los pagos pasan vigencia a 2018 efecto de liquidación y pagos finales de contratos.	02/13/2018	02/13/2018
Output	Redes de alcantarillado (longitud vía intervenida) construidos y funcionando	Modify Output	Empopasto se cumpliendo la ejecución base de la prórroga de la fecha de último desembolso, aunque los pagos pasan vigencia a 2018 efecto de liquidación y pagos finales de contratos.	02/13/2018	02/13/2018
Output	Sistemas de acueducto y/o saneamiento rural construidos y/o mejorados	Modify Output	Empopasto se cumpliendo la ejecución base de la prórroga de la fecha de último desembolso, aunque los pagos pasan vigencia a 2018 efecto de liquidación y pagos finales de contratos.	02/13/2018	02/13/2018
