

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	HA-L1103	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/17/18
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2018	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/17/18	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Port-au-Prince Water and Sanitation Project III	<b>Loan Number</b>	4353/GR-HA
<b>Executing Agency</b>	Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement	<b>Sector/Subsector</b>	AS-AGU - WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY URBAN
<b>Team Leader</b>	PEREZ MONFORTE, SERGIO	<b>Overall Stage</b>	Approved/Pending Eligibility
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	HAITI
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLIQUE D' HAITI		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HA-L1103	65,000,000	65,000,000	0	0	65,000,000	65,000,000	0	0.00%	65,000,000
<b>Aggregated</b>	<b>65,000,000</b>	<b>65,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65,000,000</b>	<b>65,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>65,000,000</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

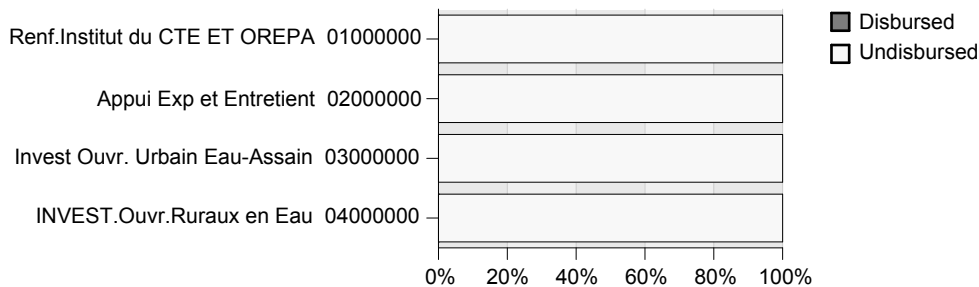

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

### IMPACTS

No information available for this section

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Résultat I : La DINEPA exerce une réglementation effective au niveau de la DINEPA centrale et la déconcentration au niveau de l'OREPA-Ouest.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022		EOP 2022			
0.1	Nombre de rapports de la DINEPA sur les opérations en milieu urbain (OREPA-Ouest)	Rapport	0.00	2016	P			70.00			
					P(a)			20.00			
					A						
Details											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
0.2	Nombre de rapports de planification et de suivi élaborés (OREPA-Ouest)	Rapport	0.00	2016	P	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
					P(a)	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
					A						
Details											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						

**Outcome Nbr. 1:** Résultat II : Le CTE-RMPP améliore sa viabilité financière

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.1	Nombre de connexions domiciliaires et commerciales actives au CTE-RMPP	Connection active	46,000.00	2016	P						
					P(a)		6,000.00	12,000.00	14,200.00		78,200.00
					A						
Details											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.1	Production durable d'eau par le CTE-RMPP	m3/Jour	103,000.00	2016	P						
					P(a)		159,000.00	169,000.00	183,000.00		183,000.00
					A						
Details											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No				

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.2	Indice de recouvrement du CTE-RMPP (% de paiement des factures)	%	54.00	2016	P						
					P(a)		59.00	63.00	66.00	71.00	71.00
					A						

#### Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.3	Ratio d'exploitation du CTE-RMPP (ratio des revenus d'exploitation annuels contre dépenses d'exploitation annuelles)	Ratio	0.67	2016	P						
					P(a)		1.07	1.22	1.32	1.41	1.41
					A						

#### Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

**Outcome Nbr. 2:** Résultat III : L'accès aux services d'eau et d'assainissement des ménages, la qualité du service des eaux et les pratiques d'hygiène se sont améliorés dans la RMPP

#### Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
2.1	Pourcentage de foyer ayant accès à un service d'eau amélioré	Ménage	44.00	2016	P		
					P(a)		60.00
					A		

#### Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.2	Pourcentage de ménages ayant accès à l'eau potable à domicile	Ménage	19.00	2016	P						
					P(a)					41.00	41.00
					A						

#### Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	----------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

2.3	Pourcentage de ménages ayant accès à l'eau potable via un kiosque	Ménage	5.00	2016	P						
					P(a)				8.00	8.00	
					A						
Details											
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.4	Nombre d'heures par jour d'alimentation des ménages à partir d'une connexion du CTE-RMPP	Heure/Jour	3.30	2016	P						
					P(a)				12.00	12.00	
					A						
Details											
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.5	% de femmes qui travaillent dans des kiosques nouveaux ou réhabilités dans la zone de Carrefour et au Centre-Ville	Femme	13.00	2016	P						
					P(a)				35.00	35.00	
					A						
Details											
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.6	% de ménages qui ont des installations pour le lavage des mains, y compris du savon	Ménage	5.00	2016	P						
					P(a)				20.00	20.00	
					A						
Details											
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.7	% de femmes qui utilisent des serviettes hygiéniques pendant leur période de menstruation	Femme	75.00	2016	P						
					P(a)				85.00	85.00	
					A						

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Details					
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No		

**Outcome Nbr. 3:** Résultat 4 : L'accès aux services d'eau et d'assainissement et à l'hygiène dans des zones rurales de l'OREPA-Ouest

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
3.1	Augmentation du nombre de ménages ayant accès à un service amélioré d'assainissement et à l'hygiène dans les zones rurales de l'OREPA-Ouest	Ménage	0.00	2016	P						
					P(a)					400.00	4,000.00
					A						
Details											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Composante I : Renforcement institutionnel du CTE-RMPP et de la DINEPA

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2022	2018	EOP 2022
1.1	Appui externe à la gestion du CTE-RMPP basé sur les résultats	Rapport	P	4	20		0
			P(a)	0	16		9,000,000
			A		0		0
1.2	Appui à l'OREPA NORD pour la préparation de la nouvelle opération (HA-L1135)	Rapport	P		0		0
			P(a)		1		125,000
			A		0		0
1.3	Renforcement du rôle de la DINEPA comme régulateur-supervision PPP	Rapport	P		0		0
			P(a)		16		175,000
			A		0		0
1.4	Campagnes de communication et de marketing pour améliorer la connectivité au réseau d'eau potable, l'accès à l'assainissement et l'hygiène dans les zones urbaines du projet.	Contrat	P		0		0
			P(a)		4		310,000
			A		0		0
1.5	Renforcement de l'OREPA OUEST : Unité de Supervision et Exécution et CTE	Rapport	P		0		0
			P(a)		8		711,595.6
			A		0		0
1.6	Renforcement de l'ORD OREPA OUEST - Prendre en charge les APD et la supervision technique et sociale des travaux ruraux	Contrat	P		0		0
			P(a)		8		400,000
			A		0		0
1.7	Coût de fonctionnement OREPA (URDs et TEPAC) et DINEPA	Rapport	P		0		0
			P(a)		8		1,040,000
			A		0		0

## Component Nbr. 2 Composante II : Appui au fonctionnement du CTE-RMPP et à l'entretien

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2022	2018	EOP 2022
2.1	Paiement EDH	Accord	P		0		0
			P(a)		2		950,000
			A		0		0
2.2	Contrat d'approvisionnement en combustible	Contrat	P		0		0
			P(a)		1		750,000
			A		0		0
2.3	Salaire CTE	Contrat	P		0		0
			P(a)		3		400,000
			A		0		0
2.4	Aménagement et amélioration des agences	Rapport	P		0		0
			P(a)		3		250,000
			A		0		0
2.5	Petits travaux et amélioration du service	Rapport	P		0		0
			P(a)		4		750,000
			A		0		0

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Composante III : Investissements dans des travaux relatifs à l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2022	2018	EOP 2022
3.1	Adductions pour l'amélioration et l'extension de la distribution d'eau dans la zone de Carrefour et au Centre-Ville. Renforcement Ossature Ouest : Marché A / Conduites structurantes. (4 Lots) et Refoulement Duvivier - Cité Soleil	m	P		0		0
			P(a)		4		12,500,000
			A		0		0
3.2	Construction et Réhabilitation de reservoirs ( Marché D Bolosse, R236 Vivy Mitchel, Cité Soleil)	Réservoir	P		0		0
			P(a)		4		3,315,252.16
			A		0		0
3.3	Extension conduites de distribution secteur Mariani. Marché B (B1 à B5) et Extension conduites de distribution Vivy Michell. (3 Lots)	m	P		0		0
			P(a)		4		10,100,000
			A		0		0
3.4	Réseau basique de distribution et installation des reseaux condominaux à Mariani Ouest et à Gérald Bataille. Marche H et Reseau de distribution basique et station de pompage desserte Haute Martissant a partir de la source Leclerc. Marche N (Projet pilot condominial 1, 2 et 3)	Nombre de Réseaux condominaux	P		0		0
			P(a)		3		6,000,000
			A		0		0
3.5	Installation des branchements et des compteurs au niveau des ménages pour les Agences (Carrefour, Delmas, Port-au-Prince et Tabarre)	Connexion	P		0		0
			P(a)		4		1,320,000
			A		0		0
3.6	Travaux de Réhabilitation des armoires électriques et automatisme Lot 3- Forage D, Cité Soleil	Nombre d'armoires électriques	P		0		0
			P(a)		2		220,000
			A		0		0
3.7	Construction et réhabilitation de kiosques pour le CTE de Port au Prince - 70 nouveaux kiosques et 25 réhabilitations	Kiosque	P		0		0
			P(a)		3		630,000
			A		0		0
3.8	Assistance technique, sociale et opérationnelle pour l'amélioration de la desserte en eau dans les quartiers dévavorisés de la RMPP (condominial et kiosques) et Supervision directe des travaux correspondant à i) le reservoir de Bolosse, Mariani et R236 2) les extensions des canalisations pour l'amélioration de la distribution à Carrefour 3) Conduite de refoulement Cité Soleil 4) Finalisation de la supervision de Port au Prince II et coordination et formation de l'unité de supervision	Contrat	P		0		0
			P(a)		6		1,850,000
			A		0		0
3.9	Matériels pour les installations de raccordement pour les maisons - Matériaux hydrauliques correspondant à 17,000 raccordements sans compteur, 17,000 raccordements avec compteur et 4,000 compteurs dans les raccordements existants. (3 Lots) et 400 mini-réseaux condominaux d'eau potable et 30 d'assainissement.	Contrat	P		0		0
			P(a)		4		4,500,000
			A		0		0
3.10	Construction du Bâtiment du CTE de Ouanaminthe	Contrat	P		0		0
			P(a)		2		250,000
			A		0		0
3.11	Etudes pour réalisation de petits travaux d'amélioration de SAEP (Opération Nord)	Nombre d'études	P		0		0
			P(a)		2		300,000
			A		0		0



## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 4 Composante IV : Investissements dans les domaines de l'eau, assainissement et hygiène dans des zones rurales de l'OREPA OUEST

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2022	2018	EOP 2022
4.1	Campagne de communication et de marketing pour améliorer l'hygiène menstruelle dans la zone du projet	Campagne	P		0		0
			P(a)		4		100,000
			A		0		0
4.2	Développement d'un outil de planification rural au niveau de l'OREPA OUEST	Système	P		0		0
			P(a)		4		100,000
			A		0		0
4.3	Développement de campagnes d'assainissement et d'hygiène dans 8 sections communales de l'OREPA OUEST	Campagne	P		0		0
			P(a)		4		250,000
			A		0		0
4.4	Construction et réhabilitation de petits réseaux dans les sections communales (4 lots)	Système	P		0		0
			P(a)		4		3,840,000
			A		0		0
4.5	Construction et réhabilitation de Points d'eau	Nombre de Points d'eau	P		0		0
			P(a)		3		960,000
			A		0		0

#### Component Nbr. 5 Composante V : Administration du Projet

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2022	2018	EOP 2022
5.1	Renforcement de l'unité d'exécution	Rapport	P		0		0
			P(a)		4		105,000
			A		0		0
5.2	Salaire du personnel de l'unité d'exécution	Contrat	P		0		0
			P(a)		0		2,058,152.24
			A		0		0
5.3	Frais de fonctionnement de l'unité d'exécution	Rapport	P		0		0
			P(a)		4		530,000
			A		0		0
5.4	Coûts directs associés	Rapport	P		0		0
			P(a)		4		950,000
			A		0		0

#### Total Cost

	Total Cost	P					0
		P(a)					64,740,000
		A					0

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section
