

PMR Operational Report

Operation Number	AR-L1198	Chief of Operations Validation Date	04/16/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	04/26/19
Last Update	04/16/19	Country Representative Validation Date	04/30/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Provincial Agricultural Services Program - PROSAP IV	Loan Number	3806/OC-AR
Executing Agency	Ministerio de Agroindustria	Sector/Subsector	AG-AGB - AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-AGRIBUSINESS
Team Leader	MILEWSKI, JOSEPH CHRISTOFER	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	ARGENTINA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Republica Argentina		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1198	100,000,000	100,000,000	31,426,000	0	131,426,000	100,000,000	23,000,000	23.00%	77,000,000
Aggregated	100,000,000	100,000,000	31,426,000	0	131,426,000	100,000,000	23,000,000	23.00%	77,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

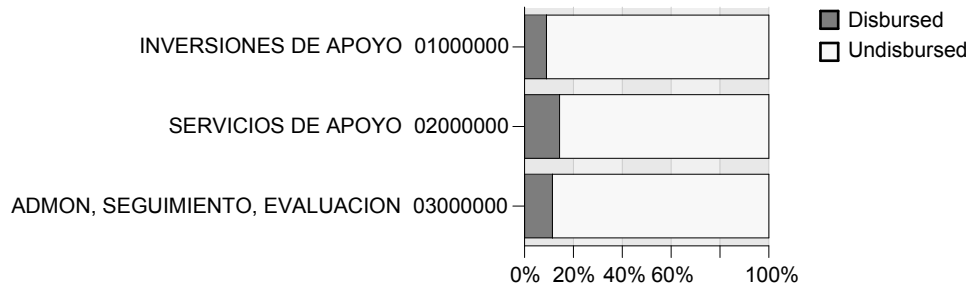

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Contribuir a la competitividad y el desarrollo de las economías rurales regionales.

Observation: Objetivo específico: Mejorar la productividad, el incremento de las ventas y agregado de valor de pequeños y medianos productores, con un enfoque de fortalecimiento de la resiliencia al cambio climático.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
0.0	Mayor Valor Bruto de la Producción (VBP) agropecuaria anual por agricultor en el área de influencia de los proyectos seleccionados	USD/Finca	23,083.00	2016	P	75,561.00	75,561.00
					P(a)	26,842.00	26,842.00
					A		

Details

Means of verification: Documentos de diseño de infraestructura; encuestas de línea de base y final programa

Observations: Informes de diseño de obras mayores y obras menores; ANR; meta refleja el grupo objetivo. Los valores de Línea de Base y Meta representan a un promedio de los proyectos de Canal Benavidez y Caminos Corrientes.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
0.1	Disminución de pérdidas productivas asociadas a sequías	% sobre la producción total / finca / año	20.50	2016	P	15.00	15.00
					P(a)	15.00	15.00
					A		

Details

Means of verification: Documentos de diseño de infraestructura; encuestas de línea de base y final programa

Observations: Sistemas de riego seleccionados para evaluación de impacto (San Juan y Salta). El cambio climático es la principal causa del incremento en la sequía en el área de intervención del programa. Debido a un cambio en la cartera de obras mayores a ejecutar, sólo se considerará el proyecto de San Juan en la estimación del indicador (el proyecto de Salta se dio de baja en 2018).

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: 1. Productividad mejorada de los productores atendidos por los sistemas de riego financiados

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
0.0	Incremento promedio de la productividad de la tierra (incluye productores agrícolas y pecuarios)	US\$ / Ha	4,528.00	2016	P	6,866.00	6,866.00
					P(a)	5,049.00	5,049.00
					A		
Details							
Means of verification: Informes de Seguimiento y Evaluación del Programa; Encuestas de relevamiento de líneas de base; Evaluaciones ex post							
Observations: La valoración de la productividad física por Ha, tomando el precio del producto en el momento base por proyecto. Los valores de Línea de Base y Meta representan un promedio de los dos proyectos de riego, Canal Cacique Guaymallén y Canal Benavidez, que siguen vigentes (reemplazando los proyectos de riego originalmente planificados que no se implementarán).							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Outcome Nbr. 1: 2. Mayor eficiencia en la utilización de agua para riego en los sistemas rehabilitados

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.0	Volumen de agua entregado en las fincas / Volumen de agua que ingresa al sistema	%	66.00	2016	P	90.00	90.00
					P(a)	90.00	90.00
					A		
Details							
Means of verification: Informes de finalización de proyectos individuales; evaluación final; evaluación de impacto							
Observations: Incluye los cuatro sistemas de riego							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.1	Volumen de agua que efectivamente queda almacenado en el suelo y disponible para el cultivo / Volumen de agua que ingresa al sistema	%	39.30	2016	P		
					P(a)	51.80	51.80
					A		
Details							
Means of verification: Informe técnico de finalización de proyectos individuales; evaluación final; evaluación de impacto							
Observations: Se agregó un nuevo indicador que puede medir, de manera más específica y relevante, la eficiencia del sistema en términos de agua que queda almacenado en el suelo, en vez de solamente llegar a la finca. Los valores de línea de base y meta se miden para los dos proyectos que siguen vigentes. Se miden las pérdidas de agua que se producen entre el volumen que efectivamente queda almacenado en el suelo y disponible para el cultivo, respecto al volumen ingresado al sistema cuando se riega.							

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 2: 3. Accesibilidad rural mejorada en la Ruta 13 de la provincia de Corrientes

Observation: Debido a un cambio en la cartera de las obras múltiples, el objetivo específico debería incluir no sólo la Ruta 13 en Corrientes, sino también una obra adicional en Entre Ríos (Bovril-EI Solar) que se agregó en el 2019 y contribuirá al mismo objetivo.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
2.0	Días de intransitabilidad reducidos	días	94.00	2016	P	30.00	30.00
					P(a)	15.00	15.00
					A		

Details

Means of verification: Dirección Provincial de Vialidad. Documentos de diseño de infraestructura; encuestas de línea de base y final programa

Observations: Informe de la Dirección Provincial de Vialidad. Los valores de Línea de Base y Meta se basan en un promedio de dos proyectos de mejoramiento de caminos (Bovril-EI Solar en Entre Ríos y Ruta Provincial 13 de Corrientes), uno de los cuales recién se agregó a la cartera original para reemplazar a otra obra mayor que no se puede realizar.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 3: 4. Reducción de la superficie promedio anual afectada por incendio

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
3.0	Área afectada promedio por incendios en la provincia de Chubut	Ha	1,439.00	2016	P	720.00	720.00
					P(a)	720.00	720.00
					A		

Details

Means of verification: Servicio Provincial del Manejo del Fuego

Observations: No se realizará el proyecto relevante de manejo de incendio (en Chubut), por lo cual la meta de este objetivo específico no se alcanzará.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 4: 5. Diversificación de mercados y/o productos en regiones atendidas por el programa

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
4.0	Número de iniciativas de negocios que incrementan sus ventas en por lo menos 20%	%	0.00	2016	P	22.00	22.00
					P(a)	22.00	22.00
					A		

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Reportes de diagnóstico de clústeres; diseño de iniciativas productivas; encuestas de línea de base y final programa

Observations: Incluye las iniciativas financiadas por: (i) el fondo de modernización tecnológica; y (ii) iniciativas de desarrollo territorial

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
4.1	Iniciativas de Desarrollo Territorial atendidas que muestran innovación de productos y/o mercados	%	0.00	2016	P		
					P(a)	100.00	100.00
					A		

Details

Means of verification: Reportes de diagnóstico de clústeres; Informes de Cierre de PMC.

Observations: Se agregó un indicador adicional para facilitar la evaluación del objetivo específico. Una revisión del indicador original (número de iniciativas de negocios que incrementan sus ventas en por lo menos 20%) indicó que no parece muy factible cumplir con la meta propuesta, así que el nuevo indicador servirá para reforzar y demostrar la lógica vertical del programa en este objetivo al momento del cierre del programa. Se utiliza la Planilla de seguimiento de Indicadores IDT elaborado por la DIPROSE.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 5: 6. Usuarios que adoptan tecnologías de adaptación al cambio climático

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
5.0	Número de productores agrícolas y pecuarios que adoptan tecnologías de riego presurizado	Beneficiaries (#)	0.00	2016	P	1,600.00	1,600.00
					P(a)	1,600.00	1,600.00
					A		

Details

Means of verification: Informes de diseño de proyectos; Informe de evaluación final; reportes de la UCAR

Observations: Beneficiarios de obras de riego mayores con apoyo del Componente 2 u otra fuente de financiamiento para las inversiones intraprediales. Riego presurizado incluye: riego por goteo, micro aspersión, aspersión y manga

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
5.1	Número de propuestas que adoptan tecnologías de adaptación al cambio climático	Propuestas de inversión	0.00	2016	P		
					P(a)	300.00	300.00
					A		

Details

Means of verification: Reportes del sector originados en el sistema informático (SI)

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observations: Se agregó un indicador adicional para facilitar la evaluación del objetivo específico. El nuevo indicador se enfoca específicamente en la adopción de tecnologías que contribuyen a la adaptación al cambio climático y la mitigación de impactos negativos, mientras que el indicador original no captura adecuadamente esta dimensión climática y ambiental importante. Por lo tanto, el nuevo indicador servirá para reforzar y demostrar la lógica vertical del programa en este objetivo al momento del cierre del programa. Son tecnologías que le permiten al productor ya sea, enfrentar la mayor frecuencia y/o intensidad en la ocurrencia de eventos climáticos; o que le permiten al productor incorporar tecnología amigable con el medio ambiente Ejemplo: malla anti granizo / paneles solares que remplazan el combustible fósil.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 6: 7. Área cubierta con infraestructura de riego

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
6.0	Hectáreas cubiertas con infraestructura de riego mejorada (áreas con riego actual y áreas nuevas)	Ha	0.00	2016	P	31,638.00	31,638.00
					P(a)	23,228.00	23,228.00
					A		

Details

Means of verification: Informes de Cierre de Proyecto.

Observations: Los valores de Línea de Base y Meta se basan en un promedio de los dos proyectos de riego, Canal Cacique Guaymallén y Canal Benavidez, que siguen vigentes (reemplazando los proyectos de riego originalmente planificados que no se implementarán).

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 7: 8. Asistencia técnica brindada por el Programa

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
7.0	Usuarios que reciben asistencia del Programa	Beneficiaries (#)	0.00	2016	P	16,292.00	16,292.00
					P(a)	16,292.00	16,292.00
					A		

Details

Means of verification: Informes DIPROSE.

Observations: Este indicador se encontraba en la sección de productos del POD, y se traslado a la matriz de resultados.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 8: 9. Asistencia técnica brindada por el Programa

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
8.0	Usuarios que reciben asistencia del Programa	Beneficiaries (#)	0.00	2016	P	2,000.00	2,000.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

8.0	Usuarios que reciben asistencia del Programa	Beneficiaries (#)	0.00	2016	P(a)	2,000.00	2,000.00
					A		
Details							
Means of verification: Informes DIPROSE.							
Observations: Este indicador se encontraba en la sección de productos del POD y se trasladó a resultados considerando que el mismo mide diversas intervenciones del programa							
Pro-Gender	No				Pro-Ethnicity	No	

Outcome Nbr. 9: 10. Beneficiarios capacitados y asistidos técnicamente en agregado de valor

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
9.0	Pequeñas y medianas empresas (PyMEs) que aplican herramientas de gestión provistas por las escuelas de negocio	Micro / small / medium enterprises (#)	0.00	2016	P	120.00	120.00
					P(a)	120.00	120.00
					A		
Details							
Means of verification: Informes DIPROSE.							
Pro-Gender	No				Pro-Ethnicity	No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Inversiones de apoyo a la competitividad

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
1.1	Infraestructura de riego construida, Cacique Guaymallén 1° tramo (Mendoza)	Km canal rehabilitado	P	1.99	6.6	5,187,572	21,525,195
			P(a)	1.99	7	5,187,573	21,525,195
			A	3	3	3,698,419	5,276,351
1.2	Infraestructura de riego construida, CSR II (Salta)	Km canal rehabilitado	P	5.62	20	3,910,307	13,905,788
			P(a)	5.62	0	3,910,308	13,905,788
			A	0	0	0	0
1.3	Infraestructura de riego construida, Canal Benavidez (San Juan)	Km canal rehabilitado	P	12.32	47	3,445,471	15,326,829
			P(a)	12.32	47	3,445,471	15,326,829
			A	0	0	740,927	740,927
1.4	Infraestructura de riego construida, Sistema Río Tala (Tucumán)	Km canal rehabilitado	P	13.94	50	5,932,738	21,287,182
			P(a)	13.94	0	4,077,931	17,288,261
			A	0	0	0	0
1.5	Caminos rurales mejorados, Ruta Prov. N° 13 (Corrientes)	Km camino	P	14.1	44.71	2,492,958	10,387,326
			P(a)	14.1	64	2,492,958	10,387,326
			A	43	43	3,367,066	4,164,491
1.6	Infraestructura eléctrica instalada en áreas rurales productivas (Formosa)	Km tend elect	P	277.75	505	5,151,864	14,719,612
			P(a)	277.75	505	4,822,429	13,072,436
			A	47	47	1,852,219	1,852,219
1.7	Servicio Prevención del Fuego de Chubut, fortalecido	proyectos	P	0	13	0	6,146,165
			P(a)	0	0	0	6,146,165
			A	0	0	0	0
1.8	Obras menores construidas	Obras	P	2	10	2,520,000	7,200,000
			P(a)	2	10	1,808,053	7,200,000
			A	1	1	1,589,614	1,589,614
1.9	PyMEs agroalimentarias capacitadas en herramientas de gestión provistas por las escuelas de negocios	Empresas	P	100	400	415,104	1,660,415
			P(a)	100	400	456,000	1,824,000
			A	151	151	57,578	57,578

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente 2: Servicios de apoyo a la competitividad

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
2.1	Proyectos apoyados con el Fondo de Modernización Tecnológica	Proyectos	P	25	220	750,000	5,320,000
			P(a)	25	231	689,944	5,320,000
			A	62	109	620,611.5	1,056,639
2.2	Proyectos apoyados con el Fondo de Modernización Tecnológica asociados a operatorias de crédito	Proyectos	P	20	100	340,000	1,680,000
			P(a)	20	50	340,000	1,680,000
			A	7	7	237,084.5	673,112
2.3	Planes de Mejora y de Desarrollo Competitivo para Clústeres (PDMC) e Iniciativas de Desarrollo de Microregiones (IDEMI) implementados	Planes	P	7	21	627,693	6,100,000
			P(a)	5	18	427,197	8,000,000
			A	5	6	101,038	1,025,168
2.4	Técnicos y profesionales de instituciones provinciales adheridos al Programa capacitados	Personas	P	620	1,341	575,644	1,200,000
			P(a)	620	203	121,750	1,200,000
			A	58	203	0	179,581
2.5	Proyectos de inversión pública formulados	Proyectos	P	2	7	738,496	1,800,000
			P(a)	2	8	634,146	1,800,000
			A	8	8	346,545	526,126

Component Nbr. 3 Componente 3: Seguimiento y Evaluación

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
3.1	Planes de acción de género formulados e implementados	Planes	P	2	6	50,760	152,280
			P(a)	2	5	50,760	152,280
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Administración	P			2,123,750	6,267,375
		P(a)			1,805,556	6,227,663
		A			1,215,947	1,419,975
	Seguimiento y Evaluación	P			150,000	320,220
		P(a)			150,000	320,220
		A			0	0
	Auditorías	P			2,531	10,125
		P(a)			2,531	49,837
		A			19,584	19,584

Total Cost

	Total Cost	P			34,814,888	136,908,512
		P(a)			30,422,607	131,426,000
		A			13,846,633	18,581,365

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Impact	Disminución de pérdidas productivas asociadas a sequías	Sólo se considerará el proyecto de San Juan debido a que se desestimó el proyecto de Salta.	Modify Impact Indicator	Modify EOP P(a)	MAJAS	03/08/2019
	Mayor Valor Bruto de la Producción (VBP) agropecuaria anual por agricultor en el área de influencia de los proyectos seleccionados	Se ajustan los valores de Línea de Base y Meta en base a un promedio de los proyectos de Canal Benavidez y Caminos Corrientes. Esto se debe a que no se implementó el proyecto originalmente planificado de Río Colorado 2da Etapa - Colonia Santa Rosa.	Modify Impact Indicator	Modify EOP P(a)	MAJAS	03/08/2019
						03/15/2019
					MSGOMEZ	03/01/2019
				Modify Unit of Measure	MAJAS	03/08/2019
					MSGOMEZ	03/01/2019
				Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	MAJAS	03/08/2019
					MSGOMEZ	03/01/2019
Outcome	Días de intransitabilidad reducidos	Se eliminó el indicador por error y se reactivó para corregir el error. Además, se ajustaron los valores de Línea de Base y Meta en base a un promedio de dos proyectos de mejoramiento de caminos, uno de los cuales recién se agregó a la cartera original para reemplazar a otra obra mayor que no se puede realizar.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	MSGOMEZ	03/01/2019
				Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	MSGOMEZ	03/01/2019
	Hectáreas cubiertas con infraestructura de riego mejorada (áreas con riego actual y áreas nuevas)	Se eliminó el indicador por error y se reactivó para corregir el error. Además, se ajustaron los valores de Línea de Base y Meta en base a un promedio de los dos proyectos de riego, Canal Cacique Guaymallén y Canal Benavidez, que siguen vigentes (reemplazando los proyectos de riego originalmente planificados que no se implementarán).	Create Outcome Indicator	N/A	MAJAS	03/08/2019
			Delete Outcome Indicator	N/A	MAJAS	03/25/2019
			Modify Outcome	Inactivate Outcome	MSGOMEZ	03/06/2019
			Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	MAJAS	03/25/2019
				Modify Means of Verification	MAJAS	03/21/2019
						03/25/2019
	Incremento promedio de la productividad de la tierra (incluye productores agrícolas y pecuarios)	Se ajustaron los valores de Línea de Base y Meta en base a un promedio de los dos proyectos que siguen vigentes: Canal Cacique Guaymallén y Canal Benavidez. Canal Cacique Guaymallén tiene un valor de línea de base de USD/ha de 4.082 y una meta de USD/ha 4.462. Canal Benavidez tiene un valor de línea de base de USD/ha de 4.973 y una meta de USD/ha 5.636.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	MSGOMEZ	03/01/2019
				Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	MSGOMEZ	03/01/2019
	Iniciativas de Desarrollo Territorial atendidas que muestran innovación de productos y/o mercados	Se agrega un indicador adicional para facilitar la evaluación del objetivo específico. Una revisión del indicador original (número de iniciativas de negocios que incrementan sus ventas en por lo menos 20%) indicó que no parece muy factible cumplir con la meta propuesta, así que el nuevo indicador servirá para reforzar y demostrar la lógica vertical del programa en este objetivo al momento del cierre del programa.	Create Outcome Indicator	N/A	MAJAS	03/08/2019
			Modify Outcome	Modify EOP P(a)	MSGOMEZ	03/01/2019

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Outcome	Iniciativas de Desarrollo Territorial atendidas que muestran innovación de productos y/o mercados	Se agrega un indicador adicional para facilitar la evaluación del objetivo específico. Una revisión del indicador original (número de iniciativas de negocios que incrementan sus ventas en por lo menos 20%) indicó que no parece muy factible cumplir con la meta propuesta, así que el nuevo indicador servirá para reforzar y demostrar la lógica vertical del programa en este objetivo al momento del cierre del programa.	Indicator	Modify Indicator name	MSGOMEZ	03/01/2019
				Modify Means of Verification	MAJAS	03/21/2019
				Modify Unit of Measure	MSGOMEZ	03/01/2019
	Número de iniciativas de negocios que incrementan sus ventas en por lo menos 20%	El indicador se eliminó por error, y se reactivó para corregir este error. Se mantiene el indicador original, y se agrega un indicador adicional ("Iniciativas de Desarrollo Territorial atendidas que muestran innovación de productos y/o mercados") para reforzar y demostrar la lógica vertical del programa al momento del cierre de la operación.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	MAJAS	03/08/2019
				Modify Indicator name	MAJAS	03/08/2019
	Número de productores agrícolas y pecuarios que adoptan tecnologías de riego presurizado	El indicador se eliminó por error, y se reactivó para corregir este error. Se mantiene el indicador original, y se agrega un indicador adicional ("Número de propuestas que adoptan tecnologías de adaptación al cambio climático") para reforzar y demostrar la lógica vertical del programa al momento del cierre de la operación.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	MAJAS	03/08/2019
				Modify Indicator name	MAJAS	03/08/2019
	Número de propuestas que adoptan tecnologías de adaptación al cambio climático	Se agrega un indicador adicional para facilitar la evaluación del objetivo específico. El nuevo indicador se enfoca específicamente en la adopción de tecnologías que contribuyen a la adaptación al cambio climático y la mitigación de impactos negativos, mientras que el indicador original no captura adecuadamente esta dimensión climática y ambiental importante. Por lo tanto, el nuevo indicador servirá para reforzar y demostrar la lógica vertical del programa en este objetivo al momento del cierre del programa.	Create Outcome Indicator	N/A	MAJAS	03/08/2019
			Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	MSGOMEZ	03/01/2019
				Modify Indicator name	MSGOMEZ	03/01/2019
				Modify Means of Verification	MAJAS	03/21/2019
	Pequeñas y medianas empresas (PyMEs) que aplican herramientas de gestión provistas por las escuelas de negocio	El indicador se eliminó por error, y se reactivó para corregir este error.	Create Outcome Indicator	N/A	MAJAS	03/08/2019
			Delete Outcome Indicator	N/A	MAJAS	03/25/2019
			Modify Outcome	Inactivate Outcome	MSGOMEZ	03/06/2019
			Modify Outcome Indicator	Modify Means of Verification	MAJAS	03/21/2019
						03/25/2019
	Usuarios que reciben asistencia del Programa	El indicador se eliminó por error, y se reactivó para corregir este error.	Create Outcome Indicator	N/A	MAJAS	03/08/2019
			Delete Outcome Indicator	N/A	MAJAS	03/25/2019
			Modify Outcome	Inactivate Outcome	MSGOMEZ	03/06/2019
			Modify Outcome	Modify Means of Verification	MAJAS	03/21/2019

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Outcome	Usuarios que reciben asistencia del Programa	El indicador se eliminó por error, y se reactivó para corregir este error.	Indicator	Modify Means of Verification	MAJAS	03/21/2019
						03/25/2019
						03/25/2019
	Volumen de agua entregado en las fincas / Volumen de agua que ingresa al sistema	El indicador se eliminó por error, y se reactivó para corregir este error. Se mantiene el indicador original, y se agrega un indicador adicional ("Volumen de agua entregado en las fincas/volumen de agua que ingresa al sistema") para reforzar y demostrar la lógica vertical del programa al momento del cierre de la operación.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	MAJAS	03/08/2019
				Modify Indicator name	MAJAS	03/08/2019
				Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	MAJAS	03/08/2019
	Volumen de agua que efectivamente queda almacenado en el suelo y disponible para el cultivo / Volumen de agua que ingresa al Sistema		Modify Outcome Indicator	Modify Indicator name	MSGOMEZ	03/01/2019
	Volumen de agua que efectivamente queda almacenado en el suelo y disponible para el cultivo / Volumen de agua que ingresa al sistema	Se agrega un nuevo indicador que pueda medir, de manera más específica y relevante, la eficiencia del sistema en términos de agua que queda almacenado en el suelo, en vez de solamente llegar a la finca. Los valores de línea de base y meta se miden para los dos proyectos que siguen vigentes.	Create Outcome Indicator	N/A	MAJAS	03/08/2019
					MSGOMEZ	03/01/2019
			Delete Outcome Indicator	N/A	MAJAS	03/08/2019
			Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	MSGOMEZ	03/01/2019
				Modify Indicator name	MSGOMEZ	03/01/2019
						03/06/2019
				Modify Means of Verification	MAJAS	03/21/2019
				Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	MSGOMEZ	03/01/2019
						03/01/2019
	Área afectada promedio por incendios en la provincia de Chubut	Se eliminó por error el indicador, y se reactivó para corregir el error. Cabe destacar que este indicador no se cambiará dado que la obra relacionada se dio de baja del portafolio, aunque se mantiene para poder dar seguimiento al momento del cierre de la operación.	Create Outcome Indicator	N/A	MAJAS	03/08/2019
			Delete Outcome Indicator	N/A	MAJAS	03/25/2019
			Modify Outcome	Inactivate Outcome	MSGOMEZ	03/01/2019
			Modify Outcome Indicator	Modify Means of Verification	MAJAS	03/21/2019
						03/25/2019

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Outcome	Área afectada promedio por incendios en la provincia de Chubut	Se eliminó por error el indicador, y se reactivó para corregir el error. Cabe destacar que este indicador no se cambiará dado que la obra relacionada se dio de baja del portafolio, aunque se mantiene para poder dar seguimiento al momento del cierre de la operación.	Modify Outcome Indicator	Modify Means of Verification	MAJAS	03/25/2019
Output	Caminos rurales mejorados, Ruta Prov. N° 13 (Corrientes)	La obra superó la meta prevista para el 2do semestre. Además, el proyecto posee una extensión de 19 km de caminos rurales. Motivo por el cual el plan vigente se ve incrementado. En el año 2020 se va a requerir ejecución financiera de los productos entregados en el año 2019. Con respecto a la planificación financiera en el año 2021, se espera que una vez finalizada la obra, si posee un saldo, se distribuya en nuevas operatorias (Por ese motivo aún no se modificó el plan vigente de la obra).	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MSGOMEZ	04/12/2019
				Modify Physical P(a) value	MSGOMEZ	04/12/2019
						04/12/2019
	Infraestructura de riego construida, CSR II (Salta)	La obra ha sido desestimada. La planificación entre la matriz financiera y de productos, no tiene correlación debido a que la obra no va a ser ejecutada, pero la matriz financiera vigente del préstamo aún no ha sido modificada, ya que no hay certeza de las obras que reemplazarán a esta. Las posibles operatorias que demandarán los saldos de las obras que no se ejecutarán son las siguientes: • Corrientes: Caminos Rurales para el Iberá. US\$ 4,5 millones (76% End. Prov y 24% Aporte local prov) Estado: No objeción otorgada por el BID. Inicio estimado en julio de 2019. • Entre Ríos: Caminos Zona VIII – Bovril. US\$ 16,9 millones (79% End. Prov. Y 21% Aporte Local Prov) Estado: No objeción otorgada por el BID. Inicio estimado en agosto de 2019. • Neuquén: Electrificación Rural Zona Sur. US\$ 17,3 millones (80% End. Prov. Y 20% Aporte local Prov) Estado: No objeción otorgada por el BID. Inicio estimado en septiembre de 2019.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MSGOMEZ	04/12/2019
						04/16/2019
				Modify Physical P(a) value	MSGOMEZ	04/12/2019
						04/12/2019
	Infraestructura de riego construida, Cacique Guaymallén 1° tramo (Mendoza)	Se cumplió con la meta establecida con menos recursos financieros debido a la devaluación.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MSGOMEZ	04/12/2019
				Modify Physical P(a) value	MSGOMEZ	04/12/2019
						04/12/2019
	Infraestructura de riego construida, Canal Benavidez (San Juan)	El desvío se debe a demoras en la adjudicación del proceso licitatorio y en la firma del acta de inicio. La obra ya se encuentra en ejecución y cuenta con un plan de trabajo adecuado para la corrección de los desvíos, pero hasta el momento no presenta avances físicos en km. La ejecución financiera corresponde al Anticipo Financiero de la obra y la puesta en marcha de la misma.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MSGOMEZ	04/12/2019
						04/16/2019
				Modify Physical P(a) value	MSGOMEZ	04/12/2019
	Infraestructura de riego construida, Sistema Río Tala (Tucumán)	La obra ha sido desestimada. La planificación entre la matriz financiera y de productos, no tiene correlación debido a que la obra no va a ser ejecutada, pero la matriz financiera vigente del préstamo aún no ha sido modificada, ya que no hay certeza de las obras que reemplazarán a esta. Las posibles operatorias que demandarán los saldos de las obras que no se ejecutarán son las siguientes: • Corrientes: Caminos Rurales para el Iberá. US\$ 4,5 millones (76% End. Prov y 24% Aporte local prov) Estado: No objeción otorgada por el BID. Inicio estimado en julio de 2019. • Entre Ríos: Caminos Zona VIII – Bovril. US\$ 16,9 millones (79% End. Prov. Y 21% Aporte Local Prov) Estado: No objeción otorgada por el BID. Inicio estimado en agosto de 2019. • Neuquén: Electrificación Rural Zona Sur. US\$ 17,3 millones (80% End. Prov. Y 20% Aporte local Prov) Estado: No objeción otorgada por el BID. Inicio estimado en septiembre de 2019.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MSGOMEZ	04/12/2019
						04/16/2019
				Modify Physical P(a) value	MSGOMEZ	04/12/2019
						04/12/2019
	Infraestructura eléctrica instalada en áreas rurales productivas (Formosa)	El desvío se debe a problemas de ingeniería de la empresa contratista. La devaluación sufrida en agosto en el país también afectó a la obra, ya que dificultó la adquisición de materiales. También hubo demoras en el avance de la obra, producto de precipitaciones que dificultaron el acceso a caminos rurales en la zona de trabajo.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MSGOMEZ	04/12/2019
				Modify Physical P(a) value	MSGOMEZ	04/12/2019
	Obras menores construidas	El desvío se debe a suspensión de trabajos por veda climática en la obra de Muelles Ushuaia-Almanza. La obra se encuentra próxima a su finalización.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MSGOMEZ	04/12/2019
				Modify Physical P(a) value	MSGOMEZ	04/12/2019
	Planes de Mejora y de Desarrollo Competitivo para Clústeres (PDMC) e Iniciativas de Desarrollo de	Se cumplió con la meta establecida. No hubo avance en la ejecución financiera en el semestre debido que la registración de los costos se generó en los 2 semestres pasados, y la implementación de estos se realizó en el semestre actual.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MSGOMEZ	04/12/2019
				Modify Physical	MSGOMEZ	04/12/2019

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Microregiones (IDEMI) implementados	Se cumplió con la meta establecida. No hubo avance en la ejecución financiera en el semestre debido que la registración de los costos se generó en los 2 semestres pasados, y la implementación de estos se realizó en el semestre actual.	Modify Output	P(a) value	MSGOMEZ	04/12/2019
	Planes de acción de género formulados e implementados	Se retrasó la etapa de formulación. Si bien al 31/12/2018 los planes previstos para el año 2018 se encuentran formulados, estos no han sido implementados aún.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MSGOMEZ	04/12/2019
				Modify Physical P(a) value		04/12/2019
				Modify Financial P(a) value	MSGOMEZ	04/12/2019
				Modify Physical P(a) value		04/12/2019
	Proyectos apoyados con el Fondo de Modernización Tecnológica	El desvío positivo se debe a que con la devaluación del dólar, se financiaron una mayor cantidad de proyectos.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MSGOMEZ	04/12/2019
				Modify Physical P(a) value		04/12/2019
				Modify Financial P(a) value	MSGOMEZ	04/12/2019
				Modify Physical P(a) value		04/12/2019
	Proyectos apoyados con el Fondo de Modernización Tecnológica asociados a operatorias de crédito	El desvío se explica por las altas tasas que cobran los bancos para otorgar crédito lo cual desincentiva la solicitud de los mismos.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MSGOMEZ	04/12/2019
				Modify Physical P(a) value		04/12/2019
				Modify Financial P(a) value	MSGOMEZ	04/12/2019
				Modify Physical P(a) value		04/12/2019
	Proyectos de inversión pública formulados	El equipo logró superar la meta planificada con menor cantidad de recursos de los planificado, debido al cambio monetario.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MSGOMEZ	04/12/2019
				Modify Physical P(a) value		04/12/2019
	PyMEs agroalimentarias capacitadas en herramientas de gestión provistas por las escuelas de negocios	Se superó la meta prevista para el 2do semestre. Los dictados del curso tuvieron amplia convocatoria. Asimismo, debido a la devaluación se utilizaron menos recursos de los que se habían planificado, debiéndose planificar para los próximos años, los recursos no ejecutados.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MSGOMEZ	04/12/2019
				Modify Physical P(a) value		04/12/2019
	Servicio Prevención del Fuego de Chubut, fortalecido	La obra ha sido desestimada. La planificación entre la matriz financiera y de productos, no tiene correlación debido a que la obra no va a ser ejecutada, pero la matriz financiera vigente del préstamo aún no ha sido modificada, ya que no hay certeza de las obras que reemplazarán a esta. Las posibles operatorias que demandarán los saldos de las obras que no se ejecutarán son las siguientes: • Corrientes: Caminos Rurales para el Iberá. US\$ 4,5 millones (76% End. Prov y 24% Aporte local prov) Estado: No objeción otorgada por el BID. Inicio estimado en julio de 2019. • Entre Ríos: Caminos Zona VIII – Bovril. US\$ 16,9 millones (79% End. Prov. Y 21% Aporte Local Prov) Estado: No objeción otorgada por el BID. Inicio estimado en agosto de 2019. • Neuquén: Electrificación Rural Zona Sur. US\$ 17,3 millones (80% End. Prov. Y 20% Aporte local Prov) Estado: No objeción otorgada por el BID. Inicio estimado en septiembre de 2019.	Modify Output	Modify Physical P(a) value	MSGOMEZ	04/12/2019
	Técnicos y profesionales de instituciones provinciales adheridos al Programa capacitados	El desvío se debe a que los recursos asignados en 2018 fueron escasos y los fondos fueron habilitados de forma tardía.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MSGOMEZ	04/12/2019
				Modify Physical P(a) value		04/12/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Project Monitoring & Evaluation
