

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	UR-L1005	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/12/19
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2018	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/15/19
<b>Last Update</b>	03/26/19	<b>Country Representative Validation Date</b>	05/02/19
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Montevideo Sanitation Program (PSU IV)	<b>Loan Number</b>	1819/OC-UR
<b>Executing Agency</b>	INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO	<b>Sector/Subsector</b>	AS - WATER AND SANITATION
<b>Team Leader</b>	BASANI, MARCELLO	<b>Overall Stage</b>	Closed
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	URUGUAY
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	UR-L1063
<b>Borrower</b>	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B(R)	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>	Partially Satisfactory	<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>	Partially Satisfactory		

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
UR-L1005	118,600,000	118,600,000	20,900,000	0	139,500,000	118,600,000	118,600,000	100.00%	0
UR-L1063	42,800,000	42,800,000	7,550,000	0	50,350,000	42,800,000	40,610,338.88	94.88%	2,189,661.12
<b>Aggregated</b>	<b>161,400,000</b>	<b>161,400,000</b>	<b>28,450,000</b>	<b>0</b>	<b>189,850,000</b>	<b>161,400,000</b>	<b>159,210,338.88</b>	<b>98.64%</b>	<b>2,189,661.12</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

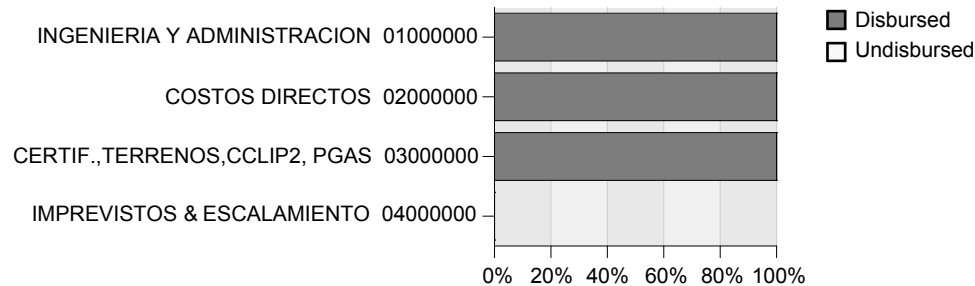

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Mejorar las condiciones de vida de la población del departamento de Montevideo, disminuyendo la contaminación en la bahía de Montevideo y playas aledañas

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
1.1	Carga orgánica vertida en tiempo seco a la bahía por descargas del Sistema de Saneamiento	Ton DBO/día	47.00	2010	P		16.00
					P(a)		16.00
					A		
Details							
Means of verification: Laboratorio de Calidad Ambiental y Unidad de Efluentes Industriales, Departamento de Desarrollo Ambiental, IM							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 2:** Cobertura de servicio de saneamiento incrementada

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
2.1	Incremento del caudal medio de aguas servidas con disposición final adecuada	m3/s	2.30	2006	P											3.90
					P(a)									3.90	3.90	3.90
					A									0.00		

#### Details

**Means of verification:** Registros de la planta

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
2.2	Hogares con conexiones sanitarias nuevas	Households (#)	0.00	2010	P	1,046.00	3,735.00	10,516.00	11,703.00	11,700.00	11,300.00					50,400.00
					P(a)	1,046.00	3,735.00	10,516.00	11,703.00	1,931.00	1,951.00	976.00	975.00	455.00	133.00	25,757.00
					A	2,344.00	5,964.00	5,964.00	5,964.00	1,619.00	1,951.00	488.00	738.00	592.00		

#### Details

**Means of verification:** numero de unidades facturadas

**Observations:** Las unidades facturadas se refieren al numero de conexiones registradas por la IM. En la matriz original del POD del UR-L1005 figuraba la meta 428.000. Dado que no se cargó la línea de base (378.000) y los avances no se cargaron nunca como acumulados, solicitamos cambiar el valor del EOP a 50.400 que corresponde al incremento real en el período

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

	Afro-descendant				P											
					P(a)											
					A											
	Indigenous				P											
					P(a)											
					A											

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
2.2	Hogares con aguas residuales tratadas	Households (#)	0.00	2014	P											
					P(a)							122,000.00		122,000.00	122,000.00	122,000.00
					A							0.00		0.00		

#### Details

**Means of verification:** sistema de disposicion final oeste en funcionamiento

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 3:** Sostenibilidad del servicio de saneamiento y drenaje pluvial incrementada

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
3.1	Indice de cobertura de costos con ingresos propios.	%	65.00	2007	P	85.00	90.00	95.00	95.00	95.00	95.00					95.00
					P(a)	85.00	90.00	95.00	95.00	125.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
					A	96.10	116.18	125.30	147.90	123.98	154.00	127.00		0.00		

#### Details

**Means of verification:** Informe de cumplimiento de compromiso de gestión (presentado por la División saneamiento)

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Obras de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
1.1	Sistema de redes de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial construido	sistemas	P		1		36,220,000
			P(a)		1		36,220,000
			A		1		35,761,000

## Component Nbr. 2 Sistema de disposición final de líquidos cloacales Oeste

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
2.1	Planta de Pretratamiento Oeste y estaciones de bombeo construidas	sistema	P		1		29,213,000
			P(a)	0	1	7,500,000	30,920,444.54
			A	0	0	8,487,529.92	24,401,623.54
2.2	Emisario subfluvial a Punta Yeguas construido	emisarios	P		1		34,821,000
			P(a)		1	88,914.84	40,419,298.66
			A		1	205,542.23	40,535,926.05
2.3	Tuberías de impulsión construidas	Km	P		16		27,121,000
			P(a)		14.4		31,093,393.93
			A		14.4		31,114,436.38

## Component Nbr. 3 Reasentamiento de familias

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
3.1	Familias reasentadas.	familias	P		341		12,916,000
			P(a)		341		12,916,000
			A		341		13,035,000

## Component Nbr. 4 Mejora de la Gestión de la División Saneamiento de la Intendencia de Montevideo

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
4.1	Fondo de conexiones intra-domiciliarias implementado	fondos	P		1		1,730,000
			P(a)		1	130,000	1,142,801.71
			A		1	39,863.09	1,052,664.8
4.2	Plan Director de Saneamiento actualizado y consensuado	planes	P		1		3,815,000
			P(a)	1	1	1,397,881.06	3,889,236.81
			A	1	1	1,372,493.52	3,863,849.27
4.3	Proyectos ejecutivos para las obras del segundo tramo del CLIPP elaborados	proyectos	P		1		3,000,000
			P(a)		1	27,390.92	421,244.54
			A		1	1,009.35	394,862.97
4.4	Proyectos de Mejora de la Gestión comercial de la División Saneamiento implementados	proyectos	P		7		2,692,000
			P(a)		7	0	3,057,642.48
			A		7	0	3,026,972.48

## Component Nbr. 5 Gastos Financieros y Administrativos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
5.			P		
			P(a)		
			A		

Other Cost

	Gastos Financieros y Administrativos	P				37,972,000
		P(a)			1,558,394.89	46,437,319.17
		A			1,532,214.68	45,414,319.17

Total Cost

	Total Cost	P				189,500,000
		P(a)			10,702,581.71	206,517,381.84
		A			11,638,652.79	198,600,654.66

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Planta de Pretratamiento Oeste y estaciones de bombeo construidas	Se ajustó la meta financiera para 2019 en función de la información presentada por la Unidad Ejecutora en el Informe semestral	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FBACHINO	03/20/2019
	Proyectos de Mejora de la Gestión comercial de la División Saneamiento implementados	Se ajustó el valor de avance de costos 2017 del Producto 4.4 (USD 10741,72) de acuerdo al informe semestral presentado por la Unidad Ejecutora, ya que el año pasado no había sido reportado	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	FBACHINO	03/20/2019
				Modify Financial P(a) value	FBACHINO	03/20/2019

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Technical-Sectorial Dimensions
Project Design
