

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	BR-L1402	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/04/19
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2019	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/02/19	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Santo Andre Sustainable Urban Mobility Program	<b>Loan Number</b>	3708/OC-BR
<b>Executing Agency</b>	Secretaría de Movilidad Urbana, Obras y Servicios Públicos	<b>Sector/Subsector</b>	TR-UIIN - TRANSPORT-URBAN TRANSPORT INFRASTRUCTURE
<b>Team Leader</b>	RUBINSTEIN DA SILVA, ELIAS	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	BRAZIL
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	Municipio de Santo André		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1402	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	50,000,000	25,000,000	892,933.54	3.57%	24,107,066.46
Aggregated	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	50,000,000	25,000,000	892,933.54	3.57%	24,107,066.46

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

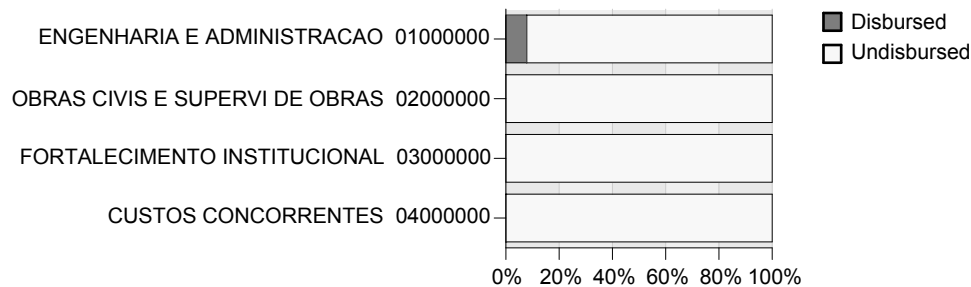

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Severidade de Acidentes de Trânsito no corredor Santos Dumont – ISA reduzida

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.0	Índice de Severidade de Acidentes de Trânsito no corredor Santos Dumont – ISA	UPS/milhões de veículos x km x ano	288.80	2013	P		181.80
					P(a)		181.80
					A		
Details							
<b>Means of verification:</b> Os dados de acidentes de trânsito (número de vítimas, gravidade, localização exata, características dos acidentados, entre outros dados) são regularmente monitorados pelo DET da Secretaria de Mobilidade Urbana, Obras e Serviços Públicos (SMUOSP) do MSA.							
<b>Observations:</b> O índice representa o número de acidentes relacionados a sua severidade, divididos pela longitude de cada corredor e o volume de tráfego em cada um. A redução do número e da severidade dos acidentes se dará através das ações do programa, assim como ações específicas de segurança viária. A meta de 181,8 é a média do Índice de Severidade de Acidentes de trânsito para todo o município.							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Velocidade Média na Avenida Prestes Maia e na Avenida dos Estados no horário de pico da manhã aumentada

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.0	Velocidade Média dos caminhões na Avenida Prestes Maia e na Avenida dos Estados no horário de pico da manhã	km/h	22.90	2015	P		26.30
					P(a)		26.30
					A		

#### Details

**Means of verification:** Pesquisa de velocidade dos caminhões realizada pelo Departamento de Engenharia de Trânsito (DET).

**Observations:** Representa o aumento da velocidade média de caminhões no trecho que conecta a região central de São Paulo a duas importantes rodovias de conexão regional (Rodoanel e Rodovia Anchieta).

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.1	Velocidade Média de todos os veículos na interseção da Avenida Prestes Maia com a Avenida dos Estados no horário de pico da manhã	km/h	19.00	2015	P		28.00
					P(a)		28.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Contagem de veículos classificados por tipo e simulações de tráfego realizada pelo DET.

**Observations:** Representa o aumento da velocidade média de veículos privados, caminhões e ônibus que passam por um viaduto de conexão norte-sul do Município (intercessão da Avenida Prestes Maia com a Avenida dos Estados).

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 1:** Emissão de gases tóxicos (EGT) dos ônibus no corredor Santos Dumont reduzida

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.0	Emissão de CO dos ônibus no corredor Santos Dumont	ton/ano	57.95	2015	P		35.80
					P(a)		35.80
					A		

#### Details

**Means of verification:** Simulações realizadas ao final do programa.

**Observations:** A redução da emissão de gases de dará através do aumento da velocidade média dos ônibus, quantificada nos estudos de tráfego. O indicador mais importante será o dióxido de carbono (CO2), o principal gás do efeito estufa.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.1	Emissão de HC dos ônibus no corredor Santos Dumont	ton/ano	13.22	2015	P	5.99
					P(a)	5.99
					A	

#### Details

**Means of verification:** Simulações realizadas ao final do programa.

**Observations:** A redução da emissão de gases de dará através do aumento da velocidade média dos ônibus, quantificada nos estudos de tráfego. O indicador mais importante será o dióxido de carbono (CO2), o principal gás do efeito estufa.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.2	Emissão de NOx dos ônibus no corredor Santos Dumont	ton/ano	59.35	2015	P	40.34
					P(a)	40.34
					A	

#### Details

**Means of verification:** Simulações realizadas ao final do programa.

**Observations:** A redução da emissão de gases de dará através do aumento da velocidade média dos ônibus, quantificada nos estudos de tráfego. O indicador mais importante será o dióxido de carbono (CO2), o principal gás do efeito estufa.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.3	Emissão de SOx dos ônibus no corredor Santos Dumont	ton/ano	3.12	2015	P	1.52
					P(a)	1.52
					A	

#### Details

**Means of verification:** Simulações realizadas ao final do programa.

**Observations:** A redução da emissão de gases de dará através do aumento da velocidade média dos ônibus, quantificada nos estudos de tráfego. O indicador mais importante será o dióxido de carbono (CO2), o principal gás do efeito estufa.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	----------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

1.4	Emissão de Partículas em suspensão dos ônibus no corredor Santos Dumont	ton/ano	2.64	2015	P		1.75
					P(a)		1.75
					A		

#### Details

**Means of verification:** Simulações realizadas ao final do programa.

**Observations:** A redução da emissão de gases de dará através do aumento da velocidade média dos ônibus, quantificada nos estudos de tráfego. O indicador mais importante será o dióxido de carbono (CO2), o principal gás do efeito estufa.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.5	Emissão de CO2 dos ônibus no corredor Santos Dumont	ton/ano	4,317.00	2015	P		2,782.00
					P(a)		2,782.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Simulações realizadas ao final do programa.

**Observations:** A redução da emissão de gases de dará através do aumento da velocidade média dos ônibus, quantificada nos estudos de tráfego. O indicador mais importante será o dióxido de carbono (CO2), o principal gás do efeito estufa.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 2:** Satisfação do usuário do sistema de transportes públicos municipais aumentada

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
2.0	Índice de satisfação do usuário do sistema de transportes públicos municipais (ISU)	%	34.00	2011	P		50.00
					P(a)		50.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Pesquisa de Satisfação do Sistema de Transporte Coletivo (STCO) realizada pela Santo André Transportes (SA-Trans).

**Observations:** Representa a parte dos usuários que avalia o serviço de transportes provido pela SA-Trans como "excelente" e "bom".

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 3:** Tempo médio de viagem em transporte público no horário de pico da manhã no corredor Santos Dumont reduzido

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	----------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

3.0	Tempo médio de viagem em transporte público no horário de pico da manhã no corredor Santos Dumont	minutos	15.70	2015	P		9.30
					P(a)		9.30
					A		
Details							
Means of verification: Dados do sistema da SA-Trans de monitoramento dos ônibus por GPS.							
Observations: Representa a diminuição do tempo de viagem de usuários de transporte público nos corredores do programa.							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

**Outcome Nbr. 4:** Custo médio de operação dos serviços de transporte (COT) do município de Santo André reduzido

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
4.0	Custo médio de operação dos serviços de transporte (COT) do município de Santo André	US\$ milhões/ano	143.10	2015	P		139.80
					P(a)		139.80
					A		
Details							
Means of verification: Estudos de tráfego e planilhas de reajuste tarifário das subconcessionárias da SA-Trans.							
Observations: Representa a redução do custo relacionada a uma maior velocidade operacional e maior racionalidade da programação da oferta (redução de: mão de obra, número de veículos, combustível e manutenção).							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

**Outcome Nbr. 5:** Percentual de mulheres contratadas para conduzir ônibus aumentado

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
5.0	Percentual de mulheres contratadas para conduzir ônibus	%	3.10	2015	P		6.00
					P(a)		6.00
					A		
Details							
Means of verification: Informação gerada pelas empresas de transporte coletivo de ônibus.							
Observations: Representa o aumento do número de mulheres contratadas para conduzir ônibus.							
Pro-Gender		Yes			Pro-Ethnicity		No

**Outcome Nbr. 6:** Número de pessoas com acesso a Transporte Público com Baixas Emissões de Carbono (PBEC) aumentado

**Observation:**

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
6.0	Número de pessoas com acesso a Transporte Público com Baixas Emissões de Carbono (PBEC)	Pessoas	0.00	2015	P		311,860.00
					P(a)		311,860.00
					A		
Details							
Means of verification: Relatório semestral de progresso e visitas técnicas de inspeção do BID.							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Componente 2 - Obras civis e supervisão

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
1.1	Corredores construídos - Grupo I	Roads (km)	P		1.1		3,130,000
			P(a)		1.1		3,130,000
			A	0	0	0	0
1.2	Corredores construídos - Grupo II	Roads (km)	P		3.2		9,270,000
			P(a)		3.2		9,270,000
			A	0	0	0	0
1.3	Obras viárias (viadutos melhorados) - Grupo I	Viaduto	P		1	1,013,140.9	4,767,429.71
			P(a)		1	1,013,140.9	4,767,229.71
			A	0	0	0	0
1.4	Obras viárias (viadutos melhorados) - Grupo II	Viaduto	P		1		18,457,770.29
			P(a)		1		18,457,770.29
			A	0	0	0	0
1.5	Plano Estratégico Municipal de Segurança Viária elaborado	Plano	P		1		625,000
			P(a)		1		625,000
			A	0	0	0	0
1.6	Supervisão de Obras contratada	Contrato	P	1	1	369,565.22	4,250,000
			P(a)	1	1	369,565.22	4,250,000
			A	1	1	0	0

## Component Nbr. 2 Componente 3 - Fortalecimento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
2.1	Técnicos da PSA envolvidos direta e indiretamente na execução do Programa capacitados	Técnico	P		25		325,000
			P(a)		25		325,000
			A	0	0		0
2.2	Mulheres para atuação na operação no sistema de transporte capacitadas	Mulher	P		50		50,000
			P(a)		50		50,000
			A	0	0	0	0
2.3	Contrato de apoio às unidades operacionais assinados	Contrato	P		4	98,684.21	2,700,000
			P(a)		4	98,684.21	2,700,000
			A	0	0	0	0
2.4	Equipamentos e software de informática adquiridos	Equipamento	P		20		250,000
			P(a)		20		250,000
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 3 Componente 4 - Compensação ambiental e expropriação

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
3.			P		
			P(a)		
			A		

## Other Cost

	Estudos e desenhos de engenharia	P			237,500	1,250,000
		P(a)			237,500	1,250,000



RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Estudos e desenhos de engenharia	A			0	0
	Contrato de empresa de gestão de apoio a execução do programa	P			731,337.63	3,625,000
		P(a)			731,337.63	3,624,646.24
		A			278,904.23	373,121.25
	Contrato de empresa para auditorias	P				125,000
		P(a)				125,000
		A			0	0
	Compensação ambiental e expropriação	P				875,000
		P(a)				875,000
		A			0	0
	Fortalecimento Institucional	P				300,000
		P(a)				300,000
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			2,450,227.96	50,000,200
		P(a)			2,450,227.96	49,999,646.24
		A			278,904.23	373,121.25

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Consultoria para elaboração do estudo de gestão financeira do sistema de transporte contratada	Atualização conforme realizado no período (até junho/2019).	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	LEANDRON	09/09/2019
	Contrato de apoio às unidades operacionais assinados	Atualização conforme realizado no período (até junho/2019).	Modify Output	Modify Physical Historical Actual	LEANDRON	09/09/2019
	Corredores construídos - Grupo I	Atualização conforme realizado no período (até junho/2019).	Modify Output	Modify Physical Historical Actual	LEANDRON	09/09/2019
	Corredores construídos - Grupo II	Atualização conforme realizado no período (até junho/2019).	Modify Output	Modify Physical Historical Actual	LEANDRON	09/09/2019
	Equipamentos e software de informática adquiridos	Atualização conforme realizado no período (até junho/2019).	Modify Output	Modify Physical Historical Actual	LEANDRON	09/09/2019
	Estudo do Uso do Solo contratado	Atualização conforme realizado no período (até junho/2019).	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	LEANDRON	09/09/2019
	Mulheres para atuação na operação no sistema de transporte capacitadas	Atualização conforme realizado no período (até junho/2019).	Modify Output	Modify Physical Historical Actual	LEANDRON	09/09/2019
	Obras viárias (viadutos melhorados) - Grupo I	Atualização conforme realizado no período (até junho/2019).	Modify Output	Modify Physical Historical Actual	LEANDRON	09/09/2019
	Obras viárias (viadutos melhorados) - Grupo II	Atualização conforme realizado no período (até junho/2019).	Modify Output	Modify Physical Historical Actual	LEANDRON	09/09/2019
	Plano Estratégico Municipal de Segurança Viária elaborado	Atualização conforme realizado no período (até junho/2019).	Modify Output	Modify Physical Historical Actual	LEANDRON	09/09/2019
	Plano de mobilidade contratado	Atualização conforme realizado no período (até junho/2019).	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	LEANDRON	09/09/2019
	Sistema de Monitoramento de mobilidade urbana contratado	Atualização conforme realizado no período (até junho/2019).	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	LEANDRON	09/09/2019
	Supervisão de Obras contratada	Atualização conforme realizado no período (até junho/2019).	Modify Output	Modify Physical Historical Actual	LEANDRON	09/09/2019
	Técnicos da PSA envolvidos direta e indiretamente na execução do Programa capacitados	Atualização conforme realizado no período (até junho/2019).	Modify Output	Modify Physical Historical Actual	LEANDRON	09/09/2019

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

### Lesson Learned - Categories

Acquisitions and Procurement - Bidding Stage
