

PMR Operational Report

Operation Number	CO-L1105	Chief of Operations Validation Date	04/03/20
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2019	Division Chief Validation Date	04/06/20
Last Update	03/25/20	Country Representative Validation Date	04/23/20
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Rural Water Supply and Wastewater Management Program	Loan Number	2732/OC-CO
Executing Agency	Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial	Sector/Subsector	AS-AGR - WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY RURAL AND PERI-URBAN
Team Leader	ORELLANA AREVALO, EDGAR R.	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Colombia
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE COLOMBIA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Todas las acciones de los dos proyectos visitando en 2019 (Zetaquira y Manaure) se cumplen materialmente. Se identifico desviaciones menores en el uso de equipo de proteccion personal en las obras y de conexiones de tanques septicos en unidades sanitarias individuales que no han tenido como resultado ni plantean ningún riesgo de tener como resultado impactos materiales negativos adversos que podrían constituir un incumplimiento de las Políticas de Salvaguardia del BID. La operación de las pilas publicas en el terreno Wayuu (Manaure) es culturalmente adecuada y facilita la integracion y participacion continua de las comunidades indigenas beneficiarias.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CO-L1105	60,000,000	30,000,000	0	0	60,000,000	30,000,000	22,824,854	76.08%	7,175,146
Aggregated	60,000,000	30,000,000	0	0	60,000,000	30,000,000	22,824,854	76.08%	7,175,146

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

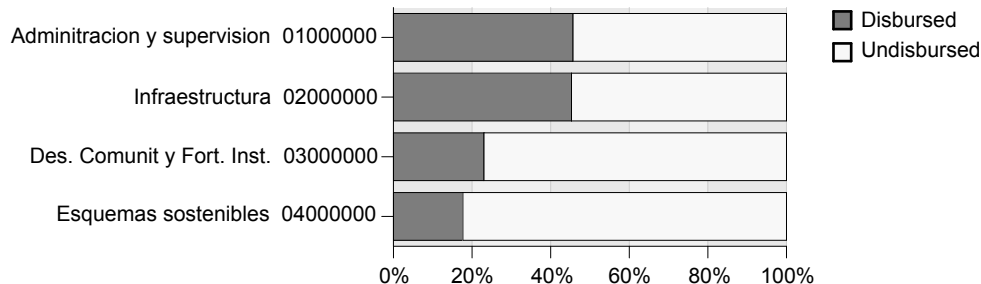

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional Local

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
1.1	Sistemas de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales administrados por una organización creada o fortalecida	Sistemas	0.00	2013	P	0.00	2.00	8.00	31.00				41.00
					P(a)		0.00	3.00	3.00	0.00	2.00	8.00	12.00
					A	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00		4.00
Details													
Means of verification: Informes de seguimiento semestrales presentados por el Ejecutor / MVCT													
Observations: El resultado se medirá una vez finalizada la etapa de construcción de infraestructura. Terminadas las obras, se espera que la organización creada o fortalecida está en capacidad de operar los sistemas construidos de manera sostenible. Sistemas operando d													
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity					No					

Outcome Nbr. 2: Infraestructura de abastecimiento de aguas y manejo de aguas residuales en la zona rural

Observation: El indicador 2.4 responde a requerimientos internos del Banco.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
2.1	Hogares con acceso domiciliar a agua potable a través de nuevos sistemas o sistemas ampliados	Households (#)	0.00	2013	P	1,348.00	1,761.00	3,232.00	2,159.00				8,500.00
					P(a)	1,348.00	0.00	565.00	1,024.00	1,375.00	3,189.00	2,771.00	7,046.00
					A	0.00	0.00	0.00	1,047.00	0.00	3,228.00		4,275.00
Details													
Means of verification: Informe ejecutor / VAS - MVCT / Incluido en proyecto / cargo al programa / semestral													
Observations: Se asume que 1 hogar equivale a 1 vivienda													
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No								
	Afro-descendant				P								
					P(a)								0.00
					A			0.00					
	Indigenous				P								
					P(a)								0.00
					A			0.00					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
2.2	Hogares con nueva solución de saneamiento	Households	0.00	2013	P	1,770.00	2,011.00	3,232.00	3,187.00				10,200.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.2	adecuada	(#)	0.00	2013	P(a)	1,770.00	0.00	935.00	1,116.00	1,600.00	600.00	5,100.00	7,366.00
					A	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	641.00		2,266.00

Details

Means of verification: Informe ejecutor / VAS - MVCT/ Incluido en proyecto / cargo al programa / semestral

Observations: Se asume que 1 hogar equivale a 1 vivienda

Solución adecuada: Solución que impide de forma higiénica el contacto de las personas con excrementos humanos (sistema de alcantarillado por red, sifón con descarga a fosa séptica o letrina de pozo, letrina de p

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity				No							
	Afro-descendant				P								
					P(a)							0.00	
					A			0.00					
	Indigenous				P								
					P(a)							0.00	
					A			0.00					

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
2.3	Establecimientos educativos con condiciones mejoradas de abastecimiento de agua y/o saneamiento básico	Escuelas	0.00	2013	P		2.00	8.00	31.00				41.00
					P(a)		0.00	3.00	3.00	4.00	30.00	16.00	41.00
					A	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00		25.00

Details

Means of verification: Informe ejecutor / VAS - MVCT / Incluido en proyecto / cargo al programa / semestral

Observations: Corresponde a instituciones educativas oficiales. La mejora corresponde a sistemas de abastecimiento de agua y/o saneamiento nuevos, mejorados o ampliados, colectivos o individuales.

Se asume que existe un establecimiento educativo por cada localidad be

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity					No					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
2.4	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Households (#)	0.00	2013	P	800.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00				4,800.00
					P(a)	800.00	0.00	1,500.00	576.00	1,600.00	662.00	5,100.00	7,366.00
					A	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	641.00		2,266.00

Details

Means of verification: Informe de proyectos

Observations: Equivale a los hogares rurales beneficiados con solución individual o por red, siempre que esta última contemple, simultáneamente, el tratamiento de las aguas residuales previo a su

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

descarga

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 3: Esquemas sostenibles para la prestación de los servicios de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en las zonas rurales

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
3.1	Modelos implementados de apoyo post-construcción a organizaciones comunitarias operadores de sistemas de agua y saneamiento	Modelos	0.00	2013	P	0.00			1.00				1.00
					P(a)		0.00	0.00		1.00	0.00	1.00	2.00
					A	0.00	0.00	0.00		0.00	1.00		1.00

Details

Means of verification: Informe ejecutor / VAS - MVCT

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Desarrollo comunitario y Fortalecimiento Institucional Local

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
1.1	Organizaciones comunitarias para la prestación de los servicios de agua y/o saneamiento creadas o fortalecidas	Organizaciones	P		41		864,400
			P(a)	2	11	285,000	497,975
			A	1	4	97,975	97,975
1.2	Material de apoyo para la gestión técnica, operativa y administrativa para las organizaciones comunitarias elaborado	Set de Cartillas	P		3		135,590
			P(a)	0	1	0	402,248
			A	0	0	0	29,764

Component Nbr. 2 Ingeniería e Infraestructura

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
2.1	Diseños de proyectos de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales elaborados	Diseños	P		17		1,791,100
			P(a)	3	19	835,057	1,207,589
			A	3	17	96,747	1,052,790
2.2	Sistemas de abastecimiento de agua y/o manejo de aguas residuales construidos, ampliados y/o optimizados	Sistemas	P		41		47,146,910
			P(a)	2	13	4,286,000	21,504,275
			A	3	6	1,692,342	9,880,974
2.3	Escuelas con soluciones de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales, mejoradas o construidas	Escuelas	P		41		620,000
			P(a)	2	35	0	85,387
			A	20	25	36,326	56,326

Component Nbr. 3 Esquemas sostenibles para la prestación de los servicios

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
3.1	Modelos de apoyo post-construcción a organizaciones comunitarias operadores de sistemas de agua y saneamiento, diseñados.	Modelos	P		1		1,000,000
			P(a)	0	2	0	249,666
			A	1	1	97,975	97,975

Component Nbr. 4 Administración y Supervisión

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
4.			P		
			P(a)		
			A		

Component Nbr. 5 Auditoría y Seguimiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
5.			P		
			P(a)		
			A		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 6 Sin asignación específica - Imprevistos

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP	EOP
6.			P		
			P(a)		
			A		

Other Cost

	Administración del programa	P				3,474,000
		P(a)			689,000	3,532,317
		A			689,707	2,264,163
	Inspección y supervisión del Programa	P				3,408,000
		P(a)			0	1,271,238
		A			281,824	845,634
	Auditoría y Seguimiento	P				600,000
		P(a)			97,000	394,087
		A			73,720	253,212
	Sin asignación específica e imprevistos	P				960,000
		P(a)			0	855,218
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P				60,000,000
		P(a)			6,192,057	30,000,000
		A			3,066,616	14,578,813

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Outcome	Hogares con acceso domiciliar a agua potable a través de nuevos sistemas o sistemas ampliados	Se analizó la solicitud presentada por el MVCT al Ministerio de Hacienda y el concepto favorable de este, y en base a la documentación de sustento, considera procedente la Renuncia Parcial, en correspondencia con el Artículo 4.12. de las Normas Generales del contrato de Préstamo, que indica "Renuncia a parte del Préstamo. El Prestatario, de acuerdo con el Garante, si lo hubiere, mediante aviso por escrito enviado al Banco, podrá renunciar a su derecho de utilizar cualquier parte del Préstamo que no haya sido desembolsada antes del recibo del aviso, siempre que no se trate de las cantidades previstas en el Artículo 6.04 de estas Normas Generales.". En este sentido, bajo las consideraciones antes expuestas, se recomienda al Representante del País de Colombia autorizar la renuncia parcial del préstamo por un monto de USD\$30,000,000. No obstante, la cancelación en la mitad del monto del préstamo, la mayoría de las metas propuesta para los resultados del programa serán alcanzados.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JLALBA	02/28/2020
	Hogares con nueva solución de saneamiento adecuada	Se analizó la solicitud presentada por el MVCT al Ministerio de Hacienda y el concepto favorable de este, y en base a la documentación de sustento, considera procedente la Renuncia Parcial, en correspondencia con el Artículo 4.12. de las Normas Generales del contrato de Préstamo, que indica "Renuncia a parte del Préstamo. El Prestatario, de acuerdo con el Garante, si lo hubiere, mediante aviso por escrito enviado al Banco, podrá renunciar a su derecho de utilizar cualquier parte del Préstamo que no haya sido desembolsada antes del recibo del aviso, siempre que no se trate de las cantidades previstas en el Artículo 6.04 de estas Normas Generales.". En este sentido, bajo las consideraciones antes expuestas, se recomienda al Representante del País de Colombia autorizar la renuncia parcial del préstamo por un monto de USD\$30,000,000. No obstante, la cancelación en la mitad del monto del préstamo, la mayoría de las metas propuesta para los resultados del programa serán alcanzados.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JLALBA	02/28/2020
	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Se analizó la solicitud presentada por el MVCT al Ministerio de Hacienda y el concepto favorable de este, y en base a la documentación de sustento, considera procedente la Renuncia Parcial, en correspondencia con el Artículo 4.12. de las Normas Generales del contrato de Préstamo, que indica "Renuncia a parte del Préstamo. El Prestatario, de acuerdo con el Garante, si lo hubiere, mediante aviso por escrito enviado al Banco, podrá renunciar a su derecho de utilizar cualquier parte del Préstamo que no haya sido desembolsada antes del recibo del aviso, siempre que no se trate de las cantidades previstas en el Artículo 6.04 de estas Normas Generales.". En este sentido, bajo las consideraciones antes expuestas, se recomienda al Representante del País de Colombia autorizar la renuncia parcial del préstamo por un monto de USD\$30,000,000. No obstante, la cancelación en la mitad del monto del préstamo, la mayoría de las metas propuesta para los resultados del programa serán alcanzados.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JLALBA	02/28/2020
	Modelos implementados de apoyo post-construcción a organizaciones comunitarias operadores de sistemas de agua y saneamiento	Se analizó la solicitud presentada por el MVCT al Ministerio de Hacienda y el concepto favorable de este, y en base a la documentación de sustento, considera procedente la Renuncia Parcial, en correspondencia con el Artículo 4.12. de las Normas Generales del contrato de Préstamo, que indica "Renuncia a parte del Préstamo. El Prestatario, de acuerdo con el Garante, si lo hubiere, mediante aviso por escrito enviado al Banco, podrá renunciar a su derecho de utilizar cualquier parte del Préstamo que no haya sido desembolsada antes del recibo del aviso, siempre que no se trate de las cantidades previstas en el Artículo 6.04 de estas Normas Generales.". En este sentido, bajo las consideraciones antes expuestas, se recomienda al Representante del País de Colombia autorizar la renuncia parcial del préstamo por un monto de USD\$30,000,000. No obstante, la cancelación en la mitad del monto del préstamo, la mayoría de las metas propuesta para los resultados del programa serán alcanzados.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JLALBA	02/28/2020
	Sistemas de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales administrados por una organización creada o fortalecida	Se analizó la solicitud presentada por el MVCT al Ministerio de Hacienda y el concepto favorable de este, y en base a la documentación de sustento, considera procedente la Renuncia Parcial, en correspondencia con el Artículo 4.12. de las Normas Generales del contrato de Préstamo, que indica "Renuncia a parte del Préstamo. El Prestatario, de acuerdo con el Garante, si lo hubiere, mediante aviso por escrito enviado al Banco, podrá renunciar a su derecho de utilizar cualquier parte del Préstamo que no haya sido desembolsada antes del recibo del aviso, siempre que no se trate de las cantidades previstas en el Artículo 6.04 de estas Normas Generales.". En este sentido, bajo las consideraciones antes expuestas, se recomienda al Representante del País de Colombia autorizar la renuncia parcial del préstamo por un monto de USD\$30,000,000. No obstante, la cancelación en la mitad del monto del préstamo, la mayoría de las metas propuesta para los resultados del programa serán alcanzados. Rta. 2020. Alpujarra, Coyaima, Sabanalarga, Caloto, Trujillo, Aracataca, Segunda fase Puerto Caicedo y Riofrío	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JLALBA	02/28/2020
Output	Diseños de proyectos de abastecimiento de agua y manejo de	Se analizó la solicitud presentada por el MVCT al Ministerio de Hacienda y el concepto favorable de este, y en base a la documentación de sustento, considera procedente la Renuncia Parcial, en correspondencia con el Artículo 4.12. de las Normas Generales del contrato de Préstamo, que indica "Renuncia a parte del Préstamo. El Prestatario, de acuerdo con el Garante, si lo hubiere, mediante aviso por escrito enviado al Banco, podrá renunciar a su derecho de utilizar cualquier parte del Préstamo que no haya sido desembolsada antes del recibo del aviso, siempre que no se trate de las cantidades previstas en el Artículo 6.04 de estas Normas Generales.". En este sentido, bajo las	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value -	JLALBA	03/11/2020

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	aguas residuales elaborados	consideraciones antes expuestas, se recomienda al Representante del País de Colombia autorizar la renuncia parcial del préstamo por un monto de USD\$30,000,000. No obstante, la cancelación en la mitad del monto del préstamo, la mayoría de las metas propuesta para los resultados del programa serán alcanzados.	Modify Output	caused by a change in the Financial P(a).		
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	JLALBA	02/28/2020
	Escuelas con soluciones de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales, mejoradas o construidas	Se analizó la solicitud presentada por el MVCT al Ministerio de Hacienda y el concepto favorable de este, y en base a la documentación de sustento, considera procedente la Renuncia Parcial, en correspondencia con el Artículo 4.12. de las Normas Generales del contrato de Préstamo, que indica "Renuncia a parte del Préstamo. El Prestatario, de acuerdo con el Garante, si lo hubiere, mediante aviso por escrito enviado al Banco, podrá renunciar a su derecho de utilizar cualquier parte del Préstamo que no haya sido desembolsada antes del recibo del aviso, siempre que no se trate de las cantidades previstas en el Artículo 6.04 de estas Normas Generales.". En este sentido, bajo las consideraciones antes expuestas, se recomienda al Representante del País de Colombia autorizar la renuncia parcial del préstamo por un monto de USD\$30,000,000. No obstante, la cancelación en la mitad del monto del préstamo, la mayoría de las metas propuesta para los resultados del programa serán alcanzados. Rta. 2019. ARROYO LIMÓN; CENTRO ETNOEDUCATIVO ANOUI - Escuela rural comunidad Turunao (2); ATAPU: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL ASHAJAA WAKUAIPA - Escuela Cousharapu (1); CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL ASHAJAA WAKUAIPA - Sede Principal - Comunidad Wakuaipa-JAMUCHENCHON (2); CENTRO ETNOEDUCATIVO URIYUNAKAT -Sede poloshi (1); CENTRO ETNOEDUCATIVO ANOUI - Sede Walashi (1);CENTRO ETNOEDUCATIVO URIYUNAKAT -Sede Principal - Comunidad Uriyunakat (2); CASA AZUL: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL DE ISHACHIMANA - Sede Amalishamana (1); CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL DE ISHACHIMANA - Sede Ishachimana (1); CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL SAN LORENZO DE SHIRURIA - Escuela Cexculumana (1) CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL DE NAZARET - Sede Maishirutshi (1) PORKY:CENTRO EDUCATIVO PORKY (1); SANTA ROSA CENTRO ETNOEDUCATIVO KANAAN (2) CENTRO ETNOEDUCATIVO KANAAN - Sede Orrosco (1) CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL DE NAZARET - Comunidad Santa Rosa (1) CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL DE NAZARET - Santa rosa 1 - Aula Satelite (1) CENTRO ETNOEDUCATIVO KANAAN - Sede Mulamana (1) Cada unidad sanitaria en Manaure construida en una institución educativa tuvo un valor promedio de \$5,866,649 pesos para un total de US\$36326 en el año 2019. Para el año 2020 se plantea construir 16 soluciones de manejo de aguas residuales en 16 escuelas, para lo cual si utilizamos el mismo costo tendremos un valor de \$93.866.384 lo que equivale a US\$29,061	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	03/11/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	JLALBA	03/12/2020
	Material de apoyo para la gestión técnica, operativa y administrativa para las organizaciones comunitarias elaborado	Se analizó la solicitud presentada por el MVCT al Ministerio de Hacienda y el concepto favorable de este, y en base a la documentación de sustento, considera procedente la Renuncia Parcial, en correspondencia con el Artículo 4.12. de las Normas Generales del contrato de Préstamo, que indica "Renuncia a parte del Préstamo. El Prestatario, de acuerdo con el Garante, si lo hubiere, mediante aviso por escrito enviado al Banco, podrá renunciar a su derecho de utilizar cualquier parte del Préstamo que no haya sido desembolsada antes del recibo del aviso, siempre que no se trate de las cantidades previstas en el Artículo 6.04 de estas Normas Generales.". En este sentido, bajo las consideraciones antes expuestas, se recomienda al Representante del País de Colombia autorizar la renuncia parcial del préstamo por un monto de USD\$30,000,000. No obstante, la cancelación en la mitad del monto del préstamo, la mayoría de las metas propuesta para los resultados del programa serán alcanzados.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	02/28/2020
				Modify Physical EOP P(a) value -	JLALBA	02/28/2020

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Material de apoyo para la gestión técnica, operativa y administrativa para las organizaciones comunitarias elaborado	Se analizó la solicitud presentada por el MVCT al Ministerio de Hacienda y el concepto favorable de este, y en base a la documentación de sustento, considera procedente la Renuncia Parcial, en correspondencia con el Artículo 4.12. de las Normas Generales del contrato de Préstamo, que indica "Renuncia a parte del Préstamo. El Prestatario, de acuerdo con el Garante, si lo hubiere, mediante aviso por escrito enviado al Banco, podrá renunciar a su derecho de utilizar cualquier parte del Préstamo que no haya sido desembolsada antes del recibo del aviso, siempre que no se trate de las cantidades previstas en el Artículo 6.04 de estas Normas Generales.". En este sentido, bajo las consideraciones antes expuestas, se recomienda al Representante del País de Colombia autorizar la renuncia parcial del préstamo por un monto de USD\$30,000,000. No obstante, la cancelación en la mitad del monto del préstamo, la mayoría de las metas propuesta para los resultados del programa serán alcanzados.	Modify Output	caused by a change in the Physical P(a).		
	Modelos de apoyo post-construcción a organizaciones comunitarias operadores de sistemas de agua y saneamiento, diseñados.	Se analizó la solicitud presentada por el MVCT al Ministerio de Hacienda y el concepto favorable de este, y en base a la documentación de sustento, considera procedente la Renuncia Parcial, en correspondencia con el Artículo 4.12. de las Normas Generales del contrato de Préstamo, que indica "Renuncia a parte del Préstamo. El Prestatario, de acuerdo con el Garante, si lo hubiere, mediante aviso por escrito enviado al Banco, podrá renunciar a su derecho de utilizar cualquier parte del Préstamo que no haya sido desembolsada antes del recibo del aviso, siempre que no se trate de las cantidades previstas en el Artículo 6.04 de estas Normas Generales.". En este sentido, bajo las consideraciones antes expuestas, se recomienda al Representante del País de Colombia autorizar la renuncia parcial del préstamo por un monto de USD\$30,000,000. No obstante, la cancelación en la mitad del monto del préstamo, la mayoría de las metas propuesta para los resultados del programa serán alcanzados.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	02/28/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	JLALBA	02/28/2020
	Organizaciones comunitarias para la prestación de los servicios de agua y/o saneamiento creadas o fortalecidas	Se analizó la solicitud presentada por el MVCT al Ministerio de Hacienda y el concepto favorable de este, y en base a la documentación de sustento, considera procedente la Renuncia Parcial, en correspondencia con el Artículo 4.12. de las Normas Generales del contrato de Préstamo, que indica "Renuncia a parte del Préstamo. El Prestatario, de acuerdo con el Garante, si lo hubiere, mediante aviso por escrito enviado al Banco, podrá renunciar a su derecho de utilizar cualquier parte del Préstamo que no haya sido desembolsada antes del recibo del aviso, siempre que no se trate de las cantidades previstas en el Artículo 6.04 de estas Normas Generales.". En este sentido, bajo las consideraciones antes expuestas, se recomienda al Representante del País de Colombia autorizar la renuncia parcial del préstamo por un monto de USD\$30,000,000. No obstante, la cancelación en la mitad del monto del préstamo, la mayoría de las metas propuesta para los resultados del programa serán alcanzados.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	02/28/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	JLALBA	03/12/2020
	Sistemas de abastecimiento de agua y/o	Se analizó la solicitud presentada por el MVCT al Ministerio de Hacienda y el concepto favorable de este, y en base a la documentación de sustento, considera procedente la Renuncia Parcial, en correspondencia con el Artículo 4.12. de las Normas Generales del contrato de Préstamo, que indica "Renuncia a parte del Préstamo. El Prestatario, de acuerdo con el Garante, si lo hubiere, mediante aviso por escrito	Modify Output	Modify Financial EOP	JLALBA	02/28/2020

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	manejo de aguas residuales construidos, ampliados y/o optimizados	<p>enviado al Banco, podrá renunciar a su derecho de utilizar cualquier parte del Préstamo que no haya sido desembolsada antes del recibo del aviso, siempre que no se trate de las cantidades previstas en el Artículo 6.04 de estas Normas Generales.". En este sentido, bajo las consideraciones antes expuestas, se recomienda al Representante del País de Colombia autorizar la renuncia parcial del préstamo por un monto de USD\$30,000,000.</p> <p>No obstante, la cancelación en la mitad del monto del préstamo, la mayoría de las metas propuesta para los resultados del programa serán alcanzados.</p>	Modify Output	P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).		
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	JLALBA	03/12/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Legal aspects and public processes
Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors
Project Design
Project Management Capacity
