

PMR Operational Report

Operation Number	PE-L1226	Chief of Operations Validation Date	03/26/20
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2019	Division Chief Validation Date	03/26/20
Last Update	03/23/20	Country Representative Validation Date	05/02/20
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Comprehensive Rural Water and Sanitation Program (PIASAR)	Loan Number	4442/OC-PE
Executing Agency	MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Sector/Subsector	AS - WATER AND SANITATION
Team Leader	PAEZ RUBIO, TANIA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Peru
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DEL PERU		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PE-L1226	100,000,000	100,000,000	26,000,000	0	126,000,000	100,000,000	15,110,556	15.11%	84,889,444
Aggregated	100,000,000	100,000,000	26,000,000	0	126,000,000	100,000,000	15,110,556	15.11%	84,889,444

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

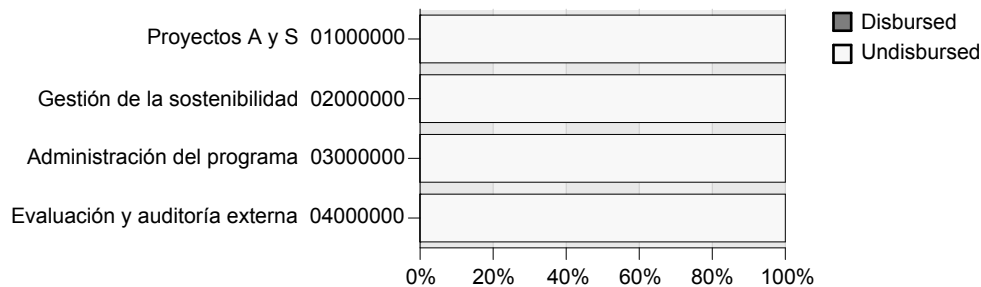

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Resultado 1. Mayor acceso a agua segura en centros poblados rurales

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
0.0	Hogares en centros poblados rurales con acceso a agua segura	Hogar	2017	P	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00
				P(a)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00
				A	0.00	0.00				0.00

Details

Means of verification: Informe de firma consultora para el fortalecimiento de la sostenibilidad a partir de encuestas a las JASS

Observations: Se incluyen sólo los hogares de los centros poblados del programa

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 1: Resultado 2. Mayor acceso a saneamiento seguro en centros poblados rurales

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.0	Hogares en centros poblados rurales con acceso a saneamiento seguro	Hogar	2017	P	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00
				P(a)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00
				A	0.00	0.00				0.00

Details

Means of verification: Informe de firma consultora para el fortalecimiento de la sostenibilidad a partir de encuestas a las JASS

Observations: Se incluyen sólo los hogares de los centros poblados del programa

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.1	Hogares en centros poblados rurales que utilizan las UBS construidas por el programa	%	2017	P	0.00	0.00	0.00	60.00	80.00	80.00
				P(a)	0.00	0.00	0.00	60.00	80.00	80.00
				A	0.00	0.00				

Details

Means of verification: Informe de firma consultora para el fortalecimiento de la sostenibilidad a partir de encuestas a una muestra de población beneficiaria

Observations: Se incluyen sólo los hogares de los centros poblados del programa

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: Resultado 3. Prestadores e Instituciones del sector AyS fortalecidas para la gestión sostenible de los sistemas de AyS

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.0	Sistemas de agua funcionando según especificaciones técnicas de diseño	%	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00
					A	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Informe de firma consultora para el fortalecimiento de la sostenibilidad a partir del reporte de operación de las JASS

Observations: Se incluyen sólo los sistemas del Programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.1	JASS cuyos ingresos operativos cubren los costos de AOM	%	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	70.00	90.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	70.00	90.00
					A	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Informes financieros de las JASS

Observations: Sobre el total de JASS del Programa.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.2	Sistemas rurales construidos por el programa con seguimiento anual de indicadores de prestación por parte del MVCS	%	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
					A	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Cuestionario sobre abastecimiento de AyS en el ámbito rural e Informe final del MVCS

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.3	JASS con al menos dos mujeres en su Consejo Directivo	%	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
					A	0.00	28.00			

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details											
Means of verification: Actas de conformación de las JASS											
Observations: Sobre el total de las JASS que se conformen durante la ejecución del Programa.											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.4	Núcleos Ejecutores con al menos una mujer en su estructura organizativa	%	0.00	2017	P	0.00	25.00	60.00			60.00
					P(a)	0.00	25.00	60.00			60.00
					A	0.00	18.00				
Details											
Means of verification: Actas de conformación de los Núcleos Ejecutores											
Observations: Sobre el total de los Núcleos Ejecutores del Programa.											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I: Proyectos de Agua Potable y Saneamiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2022	2019	EOP 2022
1.1	Estudios definitivos de proyectos de AyS actualizados	Estudios	P	80	100	179,373.6	1,596,808
			P(a)	80	100	179,373.6	1,596,807.23
			A	63	63	29,916.23	29,916.23
1.2	Sistemas de agua potable en entros poblados rurales construidos o mejorados	Sistemas	P	25	100	7,728,618.6	43,204,617
			P(a)	25	100	7,728,618.6	43,204,617.6
			A	22	22	6,213,203.63	6,213,203.63
1.3	Unidades Básicas Sanitarias (UBS) en centros poblados rurales construidas	UBS	P	1,825	10,000	10,942,296.6	61,924,291.8
			P(a)	1,825	10,000	10,942,296.6	61,924,291.88
			A	1,349	1,349	9,305,470.63	9,305,470.63
1.4	JASS capacitadas para administrar, operar y mantener los servicios de AyS durante la operación asistida en la gestión del servicio	JAAS	P	20	100	254,166	1,510,386
			P(a)	20	100	254,166	1,510,386
			A	20	20	86,039.71	86,039.71
1.5	ATM capacitadas para brindar asistencia técnica a las JASS durante la operación asistida en la gestión del servicio	ATM	P	20	62	173,904	1,006,924
			P(a)	20	62	173,904	1,006,924
			A	19	19	51,623.82	51,623.82
1.6	Personas capacitadas en educación sanitaria y ambiental y uso de los servicios de AyS	Personas	P	3,000	15,000	300,000	4,776,757
			P(a)	3,000	15,000	300,000	4,776,757
			A	2,108	2,108	258,119.12	258,119.12
1.7	Núcleos Ejecutores capacitados en gestión y administración de proyectos	Núcleos Ejecutores	P	14	30	80,262.6	455,801
			P(a)	14	30	80,262.6	455,801.09
			A	12	12	50,961.09	50,961.09

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente II: Gestión de la Sostenibilidad de los Servicios y Fortalecimiento de las Entidades del Sector

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2022	2019	EOP 2022
2.1	JASS equipadas para la adecuada AOM	JASS	P	0	100	38,813.6	492,691
			P(a)	0	100	38,813.6	492,691
			A	0	0	0	0
2.2	ATMs fortalecidas para brindar asistencia técnica a las JASS	ATM	P	0	62	115,409.6	1,454,300
			P(a)	0	62	115,409.6	1,454,300
			A	0	0	0	0
2.3	DRVCS fortalecidas para brindar asistencia técnica a las ATMs	Institución	P	0	9	12,895.2	350,858.2
			P(a)	0	9	12,895.2	350,858.2
			A	0	0	0	0
2.4	PNSR fortalecido para brindar asistencia técnica a las DRVCS y ATMs	Institución	P	0	1	0	303,660
			P(a)	0	1	0	303,660
			A	0	0	0	0
2.5	Personal del PNSR capacitado para brindar asistencia técnica a las ATMs y las DRVCS	Personas	P	0	85	0	539,839
			P(a)	0	85	0	539,839
			A	0	0	0	0
2.6	Sistemas de agua potable con operación técnica asistida concluida	Sistemas	P	0	100	27,860	788,319
			P(a)	0	100	27,860	788,319
			A	0	0	0	0
2.7	Sistemas de agua potable con reforzamiento de la AOM post construcción	Sistemas	P	0	80	57,336	2,000,000
			P(a)	0	80	57,336	2,000,000
			A	0	0	0	0
2.8	Diseño e implementación del plan de comunicación del programa	Plan	P	0	1	14,817.6	345,076
			P(a)	0	1	14,817.6	345,076
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Seguimiento, Evaluación, Auditoria	P			39,969	627,797
		P(a)			39,969	627,797
		A			0	0
	Administración del Programa	P			1,246,876	4,621,875
		P(a)			1,246,876	4,621,875
		A			1,212,606.77	1,292,909.77

Total Cost

	Total Cost	P			21,212,598.4	126,000,000
		P(a)			21,212,598.4	126,000,000
		A			17,207,941	17,288,244

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Outcome	Hogares en centros poblados rurales con acceso a agua segura	Se registro el medio de verificación para este indicador, debido a que no se habia ingresado anteriormente.	Modify Outcome Indicator	Modify Means of Verification	ANAROSAC	03/20/2020
	Hogares en centros poblados rurales con acceso a saneamiento seguro	Se registro el medio de verificación para este indicador, debido a que no se habia ingresado anteriormente.	Modify Outcome Indicator	Modify Means of Verification	ANAROSAC	03/20/2020
	Hogares en centros poblados rurales que utilizan las UBS construidas por el programa	Se registro el medio de verificación para este indicador, debido a que no se habia ingresado anteriormente.	Modify Outcome Indicator	Modify Means of Verification	ANAROSAC	03/20/2020
	Sistemas rurales construidos por el programa con seguimiento anual de indicadores de prestación por parte del MVCS	Se registro el medio de verificación para este indicador, debido a que no se habia ingresado anteriormente.	Modify Outcome Indicator	Modify Means of Verification	ANAROSAC	03/20/2020
Output	Estudios definitivos de proyectos de AyS actualizados	Se presento una ligera variación en la planificación financiera, como producto natural de la actualización de la planificación. Cabe señalar que esto no implicó variación en las metas físicas, ni cambio en el monto total de la operación.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAROSAC	03/17/2020
	Núcleos Ejecutores capacitados en gestión y administración de proyectos	Se presento una ligera variación en la planificación financiera, como producto natural de la actualización de la planificación. Cabe señalar que esto no implicó variación en las metas físicas, ni cambio en el monto total de la operación.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAROSAC	03/19/2020
	Sistemas de agua potable en entros poblados rurales construidos o mejorados	Se presento una ligera variación en la planificación financiera, como producto natural de la actualización de la planificación. Cabe señalar que esto no implicó variación en las metas físicas, ni cambio en el monto total de la operación.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAROSAC	03/17/2020
	Unidades Básicas Sanitarias (UBS) en centros poblados rurales construidas	Se presento una ligera variación en la planificación financiera, como producto natural de la actualización de la planificación. Cabe señalar que esto no implicó variación en las metas físicas, ni cambio en el monto total de la operación.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAROSAC	03/19/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
