

PMR Operational Report

Operation Number	NI-G1006	Chief of Operations Validation Date	10/19/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/09/20	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Geothermal Exploration Program and Improved Power Transmission in the framework of Nicaragua's Investment Plan - CTF Funding.	Loan Number	GRT/TC-15743-NI
Executing Agency	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	Sector/Subsector	ENERGY-NEW POWER DISTRIBUTION & TRANSMISSION PROJECTS
Team Leader	JACOME MONTENEGRO, CARLOS ALBERTO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Investment Grants	Country	Nicaragua
Lending Instrument		Convergence related Operation(s)	NI-L1094, NI-G1007
Borrower			

Environmental and Social Safeguards


Impacts Category	A	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	<p>Se está elaborando el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Proyecto "Exploración Geotérmica en la Reserva Natural Volcán Cosigüina". La Agencia Ejecutora (AE) ha documentado apropiadamente las acciones requeridas, según la OP-102, con los moradores que potencialmente serán afectados por los trabajos de rehabilitación del camino, es importante destacar que no habrá desplazamiento físico, ni afectaciones de modos de vida significativos.</p> <p>Para el proyecto de la Línea de Transmisión Eléctrica (LTE) El Sauce – Villa Nueva se tiene un avance 98% del pago de las compensaciones por el uso de las tierras en la servidumbre de la LTE. ENATREL ha continuado con la ejecución de la política de equidad de género para promover la participación de las mujeres (ver Presentación electrificando a toda Nicaragua, energía y Género, 2020). Se observo importantes avances en la implementación de las actividades de higiene y seguridad de los trabajadores. Se puede concluir que AE tiene una adecuada ejecución del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS).</p> <p>ENATREL debe realizar las tareas previstas en los tiempos que se establecen en el Plan de Acción Ambiental y social (PAAS) y en los planes de gestión y mitigación. El cumplimiento de este requerimiento tiene un retraso en la entrega de esta programación de 10 meses.</p>		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
NI-G1006	9,524,000	9,524,000	0	0	9,524,000	9,524,000	0	0.00%	9,524,000
NI-G1007	6,750,000	6,750,000	0	0	6,750,000	6,750,000	0	0.00%	6,750,000
NI-L1094	76,370,000	76,370,000	10,009,000	17,024,000	103,403,000	76,370,000	18,090,925.3	23.69%	58,279,074.7
Aggregated	92,644,000	92,644,000	10,009,000	17,024,000	119,677,000	92,644,000	18,090,925.3	19.53%	74,553,074.7

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

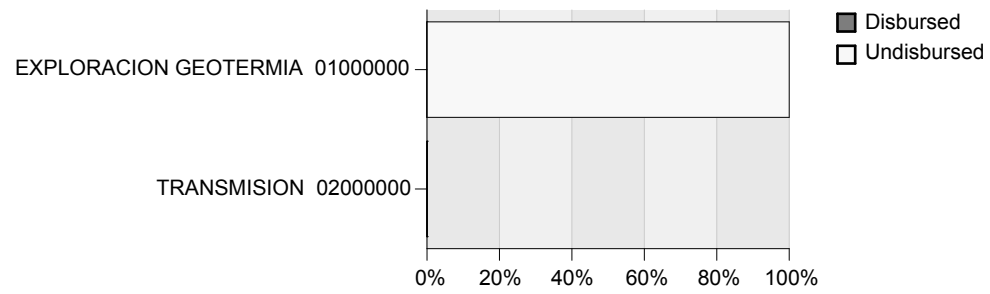

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Desarrollo del potencial geotérmico de Nicaragua de forma ambiental y financieramente sostenible.

Observation: Medios de verificación: (1.1) Estudio de factibilidad del campo Cosigüina aprobado por el MEM y ENEL; (1.2) Contrato de concesión entre el MEM y un inversionista privado o público-privado firmado por ambas partes

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.0	Potencial geotérmico para generación eléctrica explorado a nivel de factibilidad en el Campo Cosigüina	MW	0.00	2016	P					40.00	40.00
					P(a)						
					A	0.00	0.00				

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.1	Concesiones de explotación geotérmica otorgadas	Unidad	0.00	2016	P					1.00	1.00
					P(a)						
					A	0.00	0.00				

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 1: Asegurar el suministro de energía eléctrica continua, confiable, accesible y costo efectiva en las zonas beneficiadas por la ampliación de la infraestructura eléctrica del programa

Observation: Medios de verificación: (2.1) Informes estadísticos y técnicos del Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC)

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.0	Energía no servida en las zonas de influencia del programa	GWh	1.18	2016	P					0.08	0.08
					P(a)						
					A	2.59	0.50	0.33			

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 2: Optimizar la capacidad de carga de energía del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) en los tramos ubicados en Nicaragua

Observation: Medios de verificación: (3.1) y (3.2) La meta asume que además de los refuerzos incluidos bajo el presente programa, se construyen todos los refuerzos previstos para el SIN. Informe del Ente Operador Regional (EOR). La capacidad de transferencia será verificada mediante informes estadísticos y técnicos del EOR.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
2.0	Máxima Capacidad de Transferencia Regional tramo Nicaragua-Honduras N-S aumentada	MW	120.00	2016	P					300.00	300.00
					P(a)						

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.0	Máxima Capacidad de Transferencia Regional tramo Nicaragua-Honduras N-S aumentada	MW	120.00	2016	A	180.00	180.00	140.00			
Details											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
2.1	Máxima Capacidad de Transferencia Regional tramo Nicaragua-Costa Rica S-N aumentada	MW	100.00	2016	P					300.00	300.00
					P(a)						
					A	50.00	90.00	260.00			
Details											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Desarrollo geotérmico

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
1.1	Estudio de campo previo a la fase de factibilidad del campo Cosigüina	#de estudios	P		1		3,425,450
			P(a)	0	1	950,000	950,000
			A	0	1	0	0
1.2	Pozos exploratorios de diámetro comercial perforados	# de pozos	P	2	5	13,200,000	33,000,000
			P(a)	0	4	0	22,234,673
			A	0	0	0	0
1.3	Estudio de factibilidad para la explotación del campo Cosigüina	# de estudios	P		1	300,000	750,000
			P(a)	0	1	0	750,000
			A	0	0	0	0
1.4	Estudio de mitigación de riesgos de exploración geotérmica diseñado	# de estudios	P		1	200,000	500,000
			P(a)	0	1	0	500,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Componente 2. Mejoras en la infraestructura eléctrica de transmisión

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
2.1	Subestaciones Villa Nueva y El Sauce construidas y en operación	# de subestaciones	P		2	3,304,000	6,608,900
			P(a)	0	2	2,340,000	4,775,101.31
			A	0	0	686,127.28	747,040.59
2.2	Línea de transmisión en 138 kV El Sauce – Villanueva construida y en operación	km	P		38	3,831,000	7,662,600
			P(a)	0	41	2,484,470	5,001,618.23
			A	0	0	1,025,558.27	1,025,558.27
2.3	Subestación Sebaco ampliada y en operación	# de subestaciones	P	1	1	1,659,600	8,294,600
			P(a)	0	1	3,688,000	5,710,840.69
			A	0	0	749,072.34	749,072.34
2.4	Subestaciones San Benito, Catarina, Diriamba, Acahualinca y Ticuantepe II construidas y en operación	# de subestaciones	P	5	5	1,696,400	8,480,400
			P(a)	0	5	1,349,399.31	6,690,361.29
			A	0	5	2,314,396.12	7,655,358.1
2.5	Subestación Ticuantepe I construida y en operación	# de subestaciones	P		1	2,510,000	5,020,500
			P(a)	0	1	19,700	1,871,367
			A	0	0	3,034.77	3,034.77
2.6	Línea de transmisión conexa a la subestación Ticuantepe I construida	km	P		2	382,000	764,200
			P(a)	0	2	0	1,953,023
			A	0	0	0	0
2.7	Transformador móvil de 40 MVA adquirido	# de transformadores	P		1		1,000,000
			P(a)	0	0	700,000	795,609.6
			A	0	0	143,153.72	238,763.32
2.8	Línea de transmisión de 230 kV con capacidad de transmisión incrementada mediante el replazo de conductores en los tramos Leon – Frontera Honduras y Amayo – Frontera Costa Rica, en operación.	km	P	97	97	1,479,600	7,394,600
			P(a)	80	97	1,178,500	3,496,157.31
			A	40	57	372,322.49	2,689,979.8
2.9	Línea de transmisión de 230 kV con capacidad de transmisión incrementada mediante levantamiento LIDAR y retesado de conductor, en operación.	km	P		213	2,090,000	4,180,000
			P(a)	0	213	581,354	6,458,564.94
			A	0	0	581,354.42	1,291,898.73

Other Cost

	Ingeniería, Supervisión y Administración - C1	P			1,000,000	3,505,000
		P(a)			50,608	3,097,152
		A			37,608	74,976
	Gastos financieros - C1	P			470,000	1,474,400
		P(a)			50,000	1,078,499
		A			7,461	8,761
	Gastos imprevistos - C1	P			1,700,000	3,425,450
		P(a)			5,785,515	5,785,515
		A			0	0
	Ingeniería, Supervisión y Administración - C2	P			610,000	2,131,300
		P(a)			55,000	718,788.66
		A			89,172.27	663,788.66
	Gastos financieros - C2	P			680,000	2,124,700
		P(a)			706,516	1,948,516
		A			0	0
	Gastos imprevistos - C2	P			1,800,000	3,660,000
		P(a)			0	1,440,773
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			36,912,600	103,402,100
		P(a)			19,939,062.31	75,256,560.03
		A			6,009,260.68	15,148,231.58

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Estudio de campo previo a la fase de factibilidad del campo Cosigüina	Se ha ajustado el Pa como consecuencias de los retrasos causados por la pandemia Covid19 en la ejecución el proyecto.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MERODRIGUEZ	10/06/2020
	Linea de transmisión de 230 kV con capacidad de transmisión incrementada mediante el remplazo de conductores en los tramos Leon – Frontera Honduras y Amayo – Frontera Costa Rica, en operación.	Se ha ajustado el Pa como consecuencias de los retrasos causados por la pandemia Covid19 en la ejecución el proyecto	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MERODRIGUEZ	10/06/2020
				Modify Physical Historical Actual	SAMARR	09/22/2020
	Linea de transmisión de 230 kV con capacidad de transmisión incrementada mediante levantamiento LIDAR y retesado de conductor, en operación.	Se ha ajustado el Pa como consecuencias de los retrasos causados por la pandemia Covid19 en la ejecución el proyecto.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MERODRIGUEZ	10/06/2020
	Línea de transmisión conexa a la subestación Ticuantepe I construida	Actualización a las metas financieras en base al cronograma actualizado del Programa	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SANTIAGOED	10/07/2020
	Línea de transmisión en 138 kV El Sauce – Villanueva construida y en operación	Se ha ajustado el Pa como consecuencias de los retrasos causados por la pandemia Covid19 en la ejecución el proyecto.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MERODRIGUEZ	10/06/2020
	Pozos exploratorios de diámetro comercial perforados	Se ha ajustado el Pa como consecuencias de los retrasos causados por la pandemia Covid19 en la ejecución el proyecto.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SANTIAGOED	10/07/2020
	Subestaciones San Benito, Catarina, Diriamba, Acahualinca y Ticuantepe II construidas y en operación	Se ha ajustado el Pa como consecuencias de los retrasos causados por la pandemia Covid19 en la ejecución el proyecto.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	SANTIAGOED	10/07/2020
	Subestaciones Villa Nueva y El Sauce construidas y en operación	Se ha ajustado el Pa como consecuencias de los retrasos causados por la pandemia Covid19 en la ejecución el proyecto.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MERODRIGUEZ	10/06/2020
	Subestación Sebaco ampliada y en operación	Se ha ajustado el Pa como consecuencias de los retrasos causados por la pandemia Covid19 en la ejecución el proyecto.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MERODRIGUEZ	10/06/2020
	Subestación Ticuantepe I construida y en operación	Se ha ajustado el Pa como consecuencias de los retrasos causados por la pandemia Covid19 en la ejecución el proyecto.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MERODRIGUEZ	10/06/2020
	Transformador móvil de 40 MVA adquirido	Se ha ajustado el Pa como consecuencias de los retrasos causados por la pandemia Covid19 en la ejecución el proyecto.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MERODRIGUEZ	10/06/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	SANTIAGOED	10/07/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Others - Technical-Sectorial Dimensions
