

# PMR Public Report

<b>Operation Number</b>	PE-L1226	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/12/21
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2020	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/15/21
<b>Last Update</b>	04/12/21	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/16/21
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Comprehensive Rural Water and Sanitation Program (PIASAR)	<b>Loan Number</b>	4442/OC-PE
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	<b>Sector/Subsector</b>	WATER AND SANITATION
<b>Team Leader</b>	PAEZ RUBIO, TANIA	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Peru
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DEL PERU		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PE-L1226	100,000,000	100,000,000	26,000,000	0	126,000,000	100,000,000	34,892,469.3	34.89%	65,107,530.7
Aggregated	100,000,000	100,000,000	26,000,000	0	126,000,000	100,000,000	34,892,469.3	34.89%	65,107,530.7

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

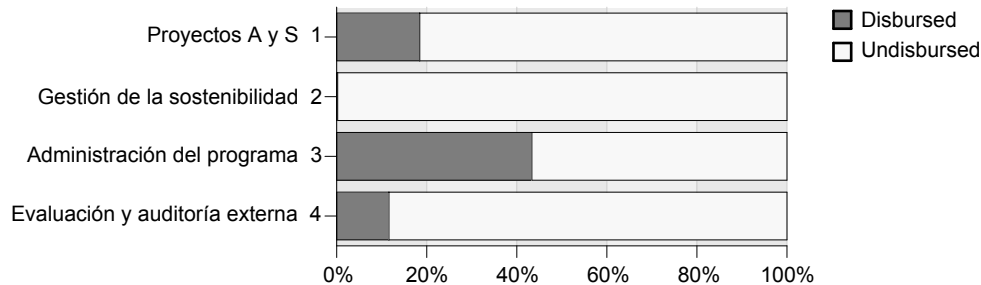

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

No information available for this section

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Specific Development Objectives Nbr. 0:** Resultado 1. Mayor acceso a agua segura en centros poblados rurales

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
0.0	Hogares en centros poblados rurales con acceso a agua segura	# of households	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00
					A	0.00	0.00				0.00
Details											
Means of verification: Informe de firma consultora para el fortalecimiento de la sostenibilidad a partir de encuestas a las JASS											
Observations: Se incluyen sólo los hogares de los centros poblados del programa											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			
	Resiliency measures included in design (# households)				P						
					A						

**Specific Development Objectives Nbr. 1:** Resultado 2. Mayor acceso a saneamiento seguro en centros poblados rurales

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.0	Hogares en centros poblados rurales con acceso a saneamiento seguro	# of households	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00
					A	0.00	0.00				0.00
Details											
Means of verification: Informe de firma consultora para el fortalecimiento de la sostenibilidad a partir de encuestas a las JASS											
Observations: Se incluyen sólo los hogares de los centros poblados del programa											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			
	Resiliency measures included in design (# households)					P					
						A					

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.1	Hogares en centros poblados rurales que utilizan las UBS construidas por el programa	%	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	60.00	80.00	80.00
					A	0.00	0.00				
Details											
Means of verification: Informe de firma consultora para el fortalecimiento de la sostenibilidad a partir de encuestas a una muestra de población beneficiaria											
Observations: Se incluyen sólo los hogares de los centros poblados del programa											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Specific Development Objectives Nbr. 2:** Resultado 3. Prestadores e Instituciones del sector AyS fortalecidas para la gestión sostenible de los sistemas de AyS

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.0	Sistemas de agua funcionando según especificaciones técnicas de diseño	%	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00
					A	0.00	0.00			

#### Details

**Means of verification:** Informe de firma consultora para el fortalecimiento de la sostenibilidad a partir del reporte de operación de las JASS

**Observations:** Se incluyen sólo los sistemas del Programa

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.1	JASS cuyos ingresos operativos cubren los costos de AOM	%	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	70.00	90.00
					A	0.00	0.00			

#### Details

**Means of verification:** Informes financieros de las JASS

**Observations:** Sobre el total de JASS del Programa.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.2	Sistemas rurales construidos por el programa con seguimiento anual de indicadores de prestación por parte del MVCS	%	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
					A	0.00	0.00			

#### Details

**Means of verification:** Cuestionario sobre abastecimiento de AyS en el ámbito rural e Informe final del MVCS

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.3	JASS con al menos dos mujeres en su Consejo Directivo	%	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
					A	0.00	28.00			

#### Details

**Means of verification:** Actas de conformación de las JASS

**Observations:** Sobre el total de las JASS que se conformen durante la ejecución del Programa.

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.4	Núcleos Ejecutores con al menos una mujer en su estructura organizativa	%	0.00	2017	P	0.00	25.00	60.00			60.00
					A	0.00	18.00				
Details											
Means of verification: Actas de conformación de los Núcleos Ejecutores											
Observations: Sobre el total de los Núcleos Ejecutores del Programa.											
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No					

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Componente I: Proyectos de Agua Potable y Saneamiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
1.1	Estudios definitivos de proyectos de AyS actualizados	Estudios	P	20	100	1,297,852	1,596,808
			P(a)	19	100	14,500	1,617,740
			A	15	78	7,762	37,678
1.2	Sistemas de agua potable en entros poblados rurales construidos o mejorados	Sistemas	P	55	100	18,363,978	43,204,617
			P(a)	12	100	10,362,361	42,299,997.19
			A	20	42	9,811,299.69	16,024,503.19
1.3	Unidades Básicas Sanitarias (UBS) en centros poblados rurales construidas	UBS	P	5,000	10,000	24,767,586	61,924,291.8
			P(a)	1,500	10,000	15,212,491	61,924,291.8
			A	2,022	3,371	14,487,865.35	23,793,335.98
1.4	JASS capacitadas para administrar, operar y mantener los servicios de AyS durante la operación asistida en la gestión del servicio	JAAS	P	60	100	464,192	1,510,386
			P(a)	3	100	129,528	1,510,385.78
			A	30	47	148,339.82	234,379.53
1.5	ATM capacitadas para brindar asistencia técnica a las JASS durante la operación asistida en la gestión del servicio	ATM	P	22	62	302,028	1,006,924
			P(a)	0	62	62,163	1,006,923.63
			A	17	35	123,616.6	175,240.42
1.6	Personas capacitadas en educación sanitaria y ambiental y uso de los servicios de AyS	Personas	P	3,000	15,000	2,252,003	4,776,757
			P(a)	3,000	15,000	67,143	4,776,757.09
			A	1,897	4,062	202,731.22	460,850.34
1.7	Núcleos Ejecutores capacitados en gestión y administración de proyectos	Núcleos Ejecutores	P	11	30	96,977	455,801
			P(a)	12	32	64,674	455,800.57
			A	4	27	37,084.92	88,046.01

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente II: Gestión de la Sostenibilidad de los Servicios y Fortalecimiento de las Entidades del Sector

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
2.1	JASS equipadas para la adecuada AOM	JASS	P	20	100	164,231	492,691
			P(a)	4	100	76,717	492,691.44
			A	14	14	49,611.07	49,611.07
2.2	ATMs fortalecidas para brindar asistencia técnica a las JASS	ATM	P	20	62	718,918	1,454,300
			P(a)	4	62	61,751	1,454,299.63
			A	12	12	44,871.34	44,871.34
2.3	DRVCS fortalecidas para brindar asistencia técnica a las ATMs	Institución	P	0	9	111,580	350,858.2
			P(a)	0	9	0	350,858.2
			A	0	0	0	0
2.4	PNSR fortalecido para brindar asistencia técnica a las DRVCS y ATMs	Institución	P	0	1	153,816	303,660
			P(a)	0	1	141,041	303,660
			A	0	0	0	0
2.5	Personal del PNSR capacitado para brindar asistencia técnica a las ATMs y las DRVCS	Personas	P	25	85	158,776	539,839
			P(a)	25	600	68,853	539,838.56
			A	540	540	51,524.39	51,524.39
2.6	Sistemas de agua potable con operación técnica asistida concluida	Sistemas	P	21	100	262,773	788,319
			P(a)	0	100	0	788,319.34
			A	0	0	0	0
2.7	Sistemas de agua potable con reforzamiento de la AOM post construcción	Sistemas	P	40	80	928,330	2,000,000
			P(a)	0	80	0	1,999,999.68
			A	0	0	2,896.34	2,896.34
2.8	Diseño e implementación del plan de comunicación del programa	Plan	P	0	1	112,150	345,076
			P(a)	0	2	104,320	345,076.19
			A	2	2	67,233.39	67,233.39

## Other Cost

	Seguimiento, Evaluación, Auditoria	P			193,343.5	627,797
		P(a)			118,556	627,797
		A			120,144.15	120,144.15
	Administración del Programa	P			1,098,232	4,621,875
		P(a)			1,480,104	4,621,875
		A			1,509,269.23	2,802,179

## Total Cost

	Total Cost	P			51,446,765.5	126,000,000
		P(a)			27,964,202	125,116,311.1
		A			26,664,249.51	43,952,493.15

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	ATM capacitadas para brindar asistencia técnica a las JASS durante la operación asistida en la gestión del servicio	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	LORENAMIR	03/23/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	LORENAMIR	03/17/2021
			Modify Physical Historical Actual	LORENAMIR	03/22/2021
	ATMs fortalecidas para brindar asistencia técnica a las JASS	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	LORENAMIR	03/23/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	LORENAMIR	03/16/2021
	DRVCS fortalecidas para brindar asistencia técnica a las ATMs	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	LORENAMIR	03/23/2021
	Diseño e implementación del plan de comunicación del programa	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	LORENAMIR	03/23/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	LORENAMIR	03/16/2021
	Estudios definitivos de proyectos de AyS actualizados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	LORENAMIR	03/23/2021
			Modify Financial Historical Actual	LORENAMIR	03/23/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	LORENAMIR	03/17/2021
			Modify Physical Historical Actual	LORENAMIR	03/16/2021
	JASS capacitadas para administrar, operar y mantener los servicios de AyS durante la operación asistida en la gestión del servicio	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	LORENAMIR	03/23/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	LORENAMIR	03/17/2021
			Modify Physical Historical Actual	LORENAMIR	03/22/2021
	JASS equipadas para la adecuada AOM	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	LORENAMIR	03/23/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	LORENAMIR	03/16/2021
	Núcleos Ejecutores capacitados en gestión y administración de proyectos	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	LORENAMIR	03/23/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	LORENAMIR	03/17/2021
			Modify Physical Historical Actual	LORENAMIR	03/17/2021
	PNSR fortalecido para brindar asistencia técnica a las DRVCS y ATMs	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	LORENAMIR	03/16/2021
	Personal del PNSR capacitado para brindar asistencia técnica a las ATMs y las DRVCS	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	LORENAMIR	03/23/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	LORENAMIR	03/16/2021
	Personas capacitadas en educación sanitaria y ambiental y uso de los servicios de AyS	Modify	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in	LORENAMIR	03/23/2021



## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Personas capacitadas en educación sanitaria y ambiental y uso de los servicios de AyS	Output	the Financial P(a).		
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	LORENAMIR	03/17/2021
			Modify Physical Historical Actual	LORENAMIR	03/17/2021
	Sistemas de agua potable con operación técnica asistida concluida	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	LORENAMIR	03/23/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	LORENAMIR	03/16/2021
	Sistemas de agua potable con reforzamiento de la AOM post construcción	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	LORENAMIR	03/23/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	LORENAMIR	03/16/2021
	Sistemas de agua potable en entros poblados rurales construidos o mejorados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	TANIAP	04/09/2021
			Modify Financial Historical Actual	LORENAMIR	03/23/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	LORENAMIR	03/17/2021
			Modify Physical Historical Actual	LORENAMIR	03/16/2021
	Unidades Básicas Sanitarias (UBS) en centros poblados rurales construidas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	LORENAMIR	03/23/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	LORENAMIR	03/17/2021
			Modify Physical Historical Actual	LORENAMIR	03/16/2021

# PMR Public Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

### Lesson Learned - Categories

Cost and Budgetary Aspects
