

PMR Public Report

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---|----------|
| Operation Number | UR-L1149 | Chief of Operations Validation Date | 04/08/21 |
| Year- PMR Cycle | Second period Jan-Dec 2020 | Division Chief Validation Date | 04/08/21 |
| Last Update | 03/30/21 | Country Representative Validation Date | 04/09/21 |
| PMR Validation Stage | Validated by Representative | | |

Basic Data

Operation Profile

| | | | |
|---------------------------|--|---|---|
| Operation Name | Ciudad del Plata Sanitation Program, Stage I | Loan Number | 4642/OC-UR |
| Executing Agency | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | Sector/Subsector | WATER AND SANITATION-SANITATION URBAN |
| Team Leader | BASANI, MARCELLO | Overall Stage | Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed) |
| Operation Type | Loan Operation | Country | Uruguay |
| Lending Instrument | Investment Loan | Convergence related Operation(s) | |
| Borrower | REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY | | |


Environmental and Social Safeguards

| | | | |
|---|--|--|----|
| Impacts Category | B | Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? | NO |
| Safeguard Performance Rating | Partially Satisfactory | Date of approval | |
| Safeguard Performance Rating - Rationale | <p>La operación no presenta una capacidad adecuada de gestión para los asuntos socioambientales, lo cual además se vislumbra en deficientes reportes de gestión de estos aspectos.</p> <p>Además, el Programa no cuenta con un programa de involucramiento de partes interesadas que contemple la gestión de quejas y reclamos.</p> <p>Esto a su vez se ve dificultado por un inminente cambio de ejecutor que supondrá dificultades para una adecuada implementación de las políticas socioambientales del Banco.</p> | | |

Financial Data

| Item | Total Cost and Source | | | | | Available Funds (US\$) | | | |
|------------|-----------------------|-------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|--------|--------------------|
| | Original IDB | Current IDB | Local Counterpart | Co-Financing / Country | Total Original Cost | Current IDB | Disb. Amount to Date | % Disb | Undisbursed Amount |
| UR-L1149 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 2,550,000 | 12.75% | 17,450,000 |
| Aggregated | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 2,550,000 | 12.75% | 17,450,000 |

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

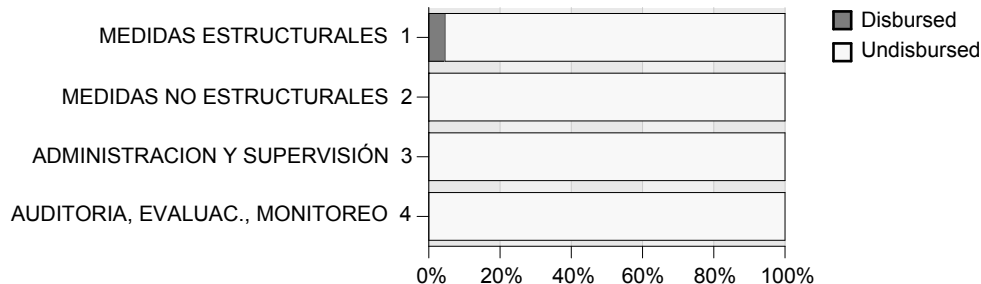

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

No information available for this section

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Hogares con aguas residuales tratadas en el área de influencia del proyecto

Observation:

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | EOP 2024 |
|------------|---|-------------------|----------|---------------|---|------|------|--------|--------|--------|------|----------|
| 1.1 | Nuevos hogares cuyas aguas residuales son tratadas en la Planta de ciudad del Plata en el área de intervención del proyecto | Número de hogares | 0.00 | 2018 | P | | | 348.00 | 697.00 | 738.00 | | 1,783.00 |
| | | | | | A | | | | | | | |
| Details | | | | | | | | | | | | |
| Pro-Gender | | No | | Pro-Ethnicity | | No | | | | | | |

Specific Development Objectives Nbr. 2: Hogares con conexión habilitada a redes de saneamiento en el área de influencia del proyecto

Observation:

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | EOP 2024 |
|------------|--|-----------------|----------|---------------|---------------|------|------|-------|-------|-------|------|----------|
| 2.1 | Porcentaje de hogares con conexión habilitada a redes de saneamiento en el área de intervención del proyecto | % de hogares | 0.00 | 2018 | P | | | 29.00 | 33.00 | 38.00 | | 60.00 |
| | | | | | A | | | | | | | |
| Details | | | | | | | | | | | | |
| Pro-Gender | | No | | | Pro-Ethnicity | | No | | | | | |

Specific Development Objectives Nbr. 3: Hogares con acceso a redes de saneamiento en el área de influencia del proyecto

Observation:

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | EOP 2024 |
|------------|---|-----------------|----------|---------------|---|------|--------|--------|----------|--------|------|----------|
| 3.1 | Nuevos hogares con acceso a la red de saneamiento en el área de intervención del proyecto | # of households | 0.00 | 2018 | P | | 600.00 | 390.00 | 1,500.00 | 500.00 | | 2,990.00 |
| | | | | | A | | | | | | | |
| Details | | | | | | | | | | | | |
| Pro-Gender | | No | | Pro-Ethnicity | | No | | | | | | |

Specific Development Objectives Nbr. 4: Mejora en la capacidad de tratamiento de la planta de aguas residuales de Ciudad del Plata

Observation:

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | EOP 2024 |
|------------|---|-----------------|----------|---------------|---|------|------|------|------|--------|------|----------|
| 4.1 | DBO5 removido en la planta de tratamiento de Ciudad del Plata | KgDBO /día | 82.00 | 2018 | P | | | | | 337.00 | | 337.00 |
| | | | | | A | | | | | | | |
| Details | | | | | | | | | | | | |
| Pro-Gender | | No | | Pro-Ethnicity | | No | | | | | | |

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 5: Mejora de las familias con jefas de hogar al acceso a los servicios de saneamiento

Observation:

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | EOP 2024 |
|------------|---|-----------------|----------|---------------|---|------|------|-------|-------|-------|------|----------|
| 5.1 | Porcentaje de subsidios entregados a jefas de hogar | % | 0.00 | 2018 | P | | | 15.00 | 15.00 | 20.00 | | 50.00 |
| | | | | | A | | | | | | | |
| Details | | | | | | | | | | | | |
| Pro-Gender | | No | | Pro-Ethnicity | | No | | | | | | |

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I. Medidas estructurales

| | Output | Unit of Measure | | PHYSICAL PROGRESS | | FINANCIAL PROGRESS | |
|-----|--|----------------------|------|-------------------|----------|--------------------|------------|
| | | | | 2020 | EOP 2024 | 2020 | EOP 2024 |
| 1.1 | Proyectos ejecutivos finalizados | Proyectos ejecutivos | P | 1 | 2 | 250,000 | 500,000 |
| | | | P(a) | 0 | 2 | 300,000 | 500,000 |
| | | | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Sistema de saneamiento construido y operando | Sistema | P | 0 | 1 | 5,115,938 | 16,200,000 |
| | | | P(a) | 0 | 1 | 2,000,000 | 16,195,692 |
| | | | A | 0 | 0 | 1,604,666 | 2,008,342 |

Component Nbr. 2 Componente II. Medidas no estructurales

| | Output | Unit of Measure | | PHYSICAL PROGRESS | | FINANCIAL PROGRESS | |
|-----|------------------------------|-----------------|------|-------------------|----------|--------------------|-----------|
| | | | | 2020 | EOP 2024 | 2020 | EOP 2024 |
| 2.1 | Plan de conexiones ejecutado | Plan | P | 0 | 1 | 161,839 | 2,000,000 |
| | | | P(a) | 0 | 1 | 50,000 | 1,950,000 |
| | | | A | 0 | 0 | 0 | 0 |

Other Cost

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|------|--|--|---------|---------|
| | Administración del Programa | P | | | 239,613 | 724,840 |
| | | P(a) | | | 329,519 | 395,321 |
| | | A | | | 0 | 0 |
| | Supervisión de obras | P | | | 35,032 | 175,160 |
| | | P(a) | | | 70,064 | 105,096 |
| | | A | | | 0 | 0 |
| | Auditoría externa | P | | | 5,000 | 25,000 |
| | | P(a) | | | 5,000 | 20,000 |
| | | A | | | 0 | 0 |
| | Evaluación y monitoreo | P | | | | 375,000 |
| | | P(a) | | | | 375,000 |
| | | A | | | 0 | 0 |

Total Cost

| | | | | | | |
|--|------------|------|--|--|-----------|------------|
| | Total Cost | P | | | 5,807,422 | 20,000,000 |
| | | P(a) | | | 2,754,583 | 19,541,109 |
| | | A | | | 1,604,666 | 2,008,342 |

PMR Public Report

CHANGES TO THE MATRIX

| Section | Name | Type of Change | Subtype | Modified By | Entered in the System |
|---------|--|----------------|---|-------------|-----------------------|
| Output | Proyectos ejecutivos finalizados | Modify Output | Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a). | KARINABA | 03/24/2021 |
| | Sistema de saneamiento construido y operando | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | KARINABA | 03/24/2021 |

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Intra/Inter Coordination
