


PMR Public Report

Operation Number	CO-L1242	Chief of Operations Validation Date	04/07/22
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	04/08/22
Last Update	04/01/22	Country Representative Validation Date	04/11/22
PMR Validation Stage	Validated by Representative		
Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Program of Drinking Water and Sanitation for the Department of La Guajira	Loan Number	5193/OC-CO
Executing Agency	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	Sector/Subsector	WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY URBAN
Team Leader	NAVIA DIAZ, MARIA DEL ROSARIO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Colombia
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	CO-G1017, CO-J0009
Borrower	REPUBLICA DE COLOMBIA		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	El proyecto todavía no ha iniciado ejecución de actividades en terreno. El primer desembolso se realizará en diciembre de 2021.		

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
CO-G1017	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	250,000	5.00%	4,750,000
CO-J0009	7,750,000	7,750,000	0	0	7,750,000	7,750,000	100,750	1.30%	7,649,250
CO-L1242	104,567,331	52,072,626	0	0	52,072,626	52,072,626	676,944.14	1.30%	51,395,681.63
Aggregated	117,317,331	64,822,626	0	0	64,822,626	64,822,626	1,027,694.14	1.59%	63,794,931.63

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

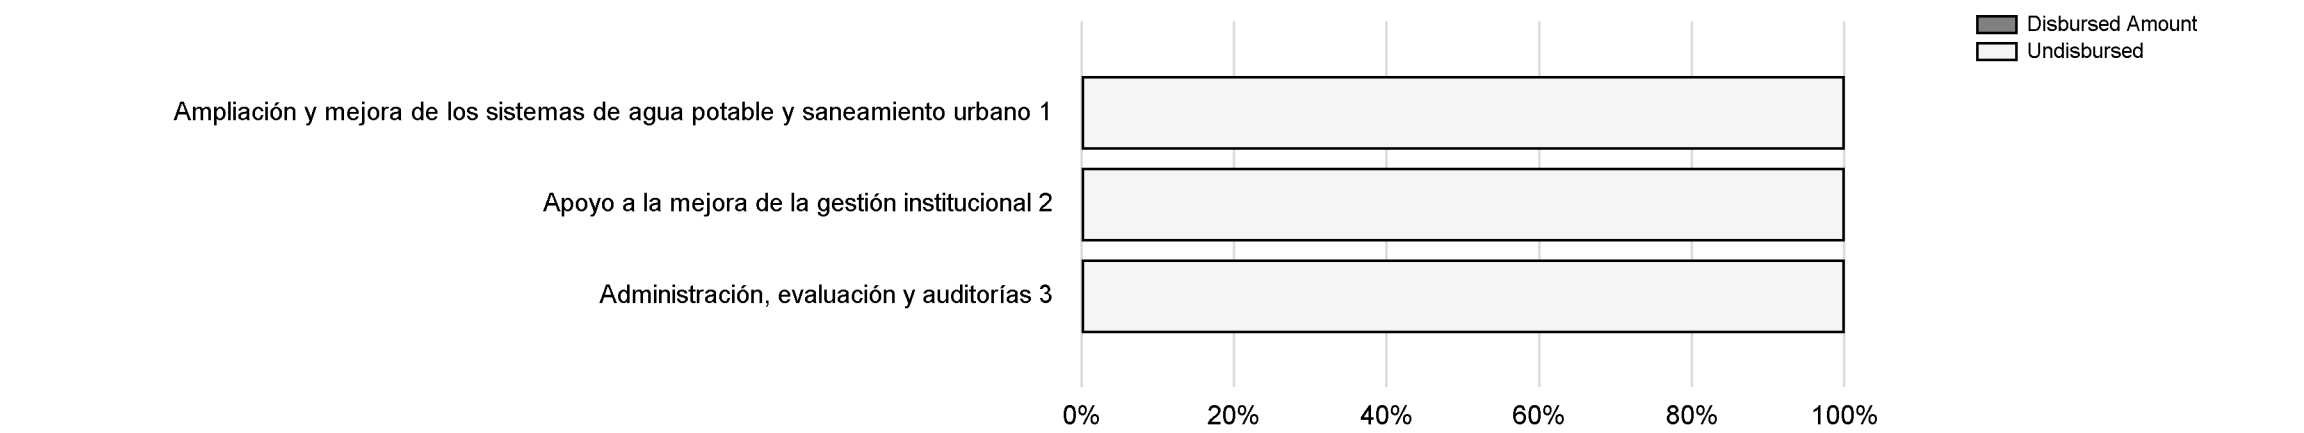

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Contribuir al cumplimiento de los objetivos del Programa Guajira Azul del Gobierno Nacional, de incrementar la población atendida con agua apta para el consumo humano, con continuidad y adecuado saneamiento.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2025	
1.0	Cobertura de AP en el área urbana del departamento de La Guajira	%	20	2019	2025	P	38
						A	-

Details

Means of Verification: Informe de evaluación final en base a datos del MVCT

Observations: Se considera cobertura de AP el acceso domiciliario con una continuidad mínima de 8 h/día y calidad de acuerdo con la norma nacional.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2025	
1.1	Cobertura de saneamiento en el área urbana del departamento de La Guajira			%	25	2019	2025	P	27
								A	-
Details									

Means of Verification: Informe de evaluación final en base a datos del MVCT

Observations: Se considera cobertura de saneamiento al acceso domiciliar a redes de alcantarillado con el correspondiente tratamiento de aguas residuales oa solucionesindividuales queden un adecuado tratamiento a los lodos.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX												
Specific Development Objectives												
Specific Development Objectives Nbr. 0: Incrementar el acceso y calidad de los servicios de Agua Potable (AP) y saneamiento, en poblaciones urbanas del Departamento de La Guajira, y en particular en aquellas más afectadas por los recientes flujos migratorios												
Observation:												
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
0.0	Hogares con acceso nuevo o mejorado al sistema de AP (Fonseca)	# of households	0	2019	P	-	-	-	-	-	9,463	9,463
					A	-	-	-	-	-	-	-
Details												
Means of Verification: Informe Semestral de Progreso												
Observations: Se considera que el acceso es mejorado cuando la continuidad del servicio es de al menos 12 h/día.												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.4.a Households with improved access to water (#) (C)							
Disaggregation		Hogares con presencia de migrantes que cuentan con acceso nuevo o mejorado al sistema de AP			P	-	-	-	-	-	500	500
					A	-	-	-	-	-	-	-
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
0.1	Continuidad promedio del servicio de AP en áreas de intervención del Programa (Fonseca)	Horas/día	8	2019	P	-	-	-	-	-	16	16
					A	-	-	-	-	-	-	-
Details												
Means of Verification: Reporte del prestador												
Observations: La continuidad se refiere a la suma del número de horas con disponibilidad de agua/día.												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
0.2	Hogares con acceso nuevo o mejorado a servicios de alcantarillado en el barrio El Carmen (Fonseca)	# of households	0	2019	P	-	-	-	-	-	680	680
					A	-	-	-	-	-	-	-
Details												
Means of Verification: Informe Semestral de Progreso												
Observations:												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.4.a Households with improved access to water (#) (C)							
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
0.3	Hogares protegidos de riesgo de inundación para el período de retorno de 25 años (Fonseca)	# of households	0	2019	P	-	-	-	-	-	680	680
					A	-	-	-	-	-	-	-
Details												
Means of Verification: Informe Semestral de Progreso												
Observations:												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.20.b Households with enhanced disaster and climate change resilience (# households) (C)							

Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
0.4	Hogares con acceso nuevo o mejorado al sistema de AP (Urumita)	# of households	0	2019	P	-	-	-	-	-	2,550	2,550	
					A	-	-	-	-	-	-	-	
Details													
Means of Verification: Informe Semestral de Progreso													
Observations: Se considera que el acceso es mejorado cuando la continuidad del servicio es de al menos 8 horas por día.													
Evaluation Methodology: -													
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.4.a Households with improved access to water (#) (C)								
Disaggregation			Hogares con presencia de migrantes que cuentan con acceso mejorado al sistema de AP (Urumita)			P	-	-	-	-	-	50	50
						A	-	-	-	-	-	-	-
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025	
0.5	Continuidad promedio del servicio de AP (Urumita)	Horas/día	2	2019	P	-	-	-	-	-	8	12	
					A	-	-	-	-	-	-	-	
Details													
Means of Verification: Reporte del prestador													
Observations: La continuidad se refiere a la suma del número de horas con disponibilidad de agua por día.													
Evaluation Methodology: -													
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator									
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025	
0.6	Hogares con acceso nuevo o mejorado al sistema de AP (Riohacha)	# of households	0	2019	P	-	-	-	-	-	46,160	46,160	
					A	-	-	-	-	-	-	-	
Details													
Means of Verification: Informe Semestral de Progreso													
Observations: Se considera que el acceso es mejorado cuando la continuidad del servicio es de al menos 11 horas por día													
Evaluation Methodology: -													
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.4.a Households with improved access to water (#) (C)								
Disaggregation			Hogares con presencia de migrantes que cuentan con acceso nuevo o mejorado al sistema de AP (Riohacha)			P	-	-	-	-	-	1,500	1,500
						A	-	-	-	-	-	-	-
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025	
0.7	Continuidad promedio del servicio de AP (Riohacha)	Horas/día	6.8	2019	P	-	-	-	-	-	11	11	
					A	-	-	-	-	-	-	-	
Details													
Means of Verification: Informe Semestral de Progreso													
Observations:													
Evaluation Methodology: -													
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator									
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025	
0.9	Hogares con acceso nuevo o mejorado al sistema de AP (Fuera de la muestra)	# of households	0	2021	P	-	-	-	-	-	6,000	6,000	
					A	-	-	-	-	-	-	-	

Details													
Means of Verification: Informe Semestral de Progreso													
Observations: La meta será definida una vez seleccionados los proyectos a financiar con el Programa													
Evaluation Methodology: -													
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.4.a Households with improved access to water (#) (C)								
Disaggregation			Hogares con presencia de migrantes que cuentan con acceso nuevo o mejorado al sistema de AP (Fuera de la muestra)		P	-	-	-	-	-	600	600	
					A	-	-	-	-	-	-	-	
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
0.10	Incremento promedio en la continuidad del servicio de AP (fuera de la muestra)			Horas/día	0	2019	P	-	-	-	-	4	4
							A	-	-	-	-	-	-
Details													

Means of Verification: Reporte del prestador

Observations: La línea de base y la meta serán definidas una vez seleccionados los proyectos a financiar con el Programa

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator									

Means of Verification: Informe Semestral de Progreso												
Observations: La meta será definida una vez seleccionados los proyectos a financiar con el Programa												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.4.b Households with improved access to sanitation (#) (C)							

Specific Development Objectives Nbr. 1: Mejorar la capacidad de gestión de los prestadores locales y apoyar el proceso de regionalización de estos.

Observation:												
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.0	Índice de recaudación (importe total cobrado / importe total facturado) (Urumita)	%	35	2020	P	-	-	-	-	-	60	60
					A	-	-	-	-	-	-	-
Details												

Means of Verification: Estados financieros anuales operador												
Observations: La meta se revisará cuando se haga el plan de aseguramiento de la prestación de Urumita.												
Evaluation Methodology: -												

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator									

Observations: https://www.cra.gov.co/documents/Resolucion_CRA_688_de_2014_Firmada.pdf

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.2	% de participantes mujeres en las campañas para la educación sanitaria, cultura de pago y uso eficiente del recurso	%	0	2019	P	-	-	-	50	50	50	50
					A	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informes/actas de las campañas

Observations: # de mujeres participantes en campañas/ # total de participantes en campañas

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.8	% de participantes mujeres en cursos de capacitación técnica en plomería y albañilería	%	0	2019	P	-	-	-	-	-	30	30
					A	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informes/actas de las campañas

Observations: # de mujeres participantes en cursos / # total de participantes en cursos

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.12	Análisis de calidad del agua realizados por la unidad móvil de asistencia técnica, en zonas de intervención del Programa (Fuera de la muestra)	Número de análisis/año	0	2019	P	-	-	-	-	25	25	50
					A	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informes empresa departamental de AyS de La Guajira

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Ampliación y mejora de los sistemas de agua potable y saneamiento urbano

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2025	2021	EOP 2025
1.01	Sistema de agua potable de Urumita mejorado	Sistema	P	-	1	-	2,314,115
			P (a)	-	1	-	2,314,040
			A	-	-	-	-
1.02	Sistema de agua potable de Fonseca ampliado y mejorado	Sistema	P	-	1	-	11,462,587
			P (a)	-	1	-	13,816,063
			A	-	-	-	-
1.03	Sistema de alcantarillado de Fonseca construido	Sistema	P	-	1	-	3,563,144
			P (a)	-	1	-	5,266,515
			A	-	-	-	-
1.04	Sistema de agua potable de Riohacha mejorado	Sistema	P	-	1	-	11,488,625
			P (a)	-	1	-	11,199,462
			A	-	-	-	-
1.05	Sistemas de agua potable mejorado o ampliados	Sistema	P	-	3	-	20,919,415
			P (a)	-	3	-	14,418,100
			A	-	-	-	-
1.06	Sistemas de alcantarillado mejorados o ampliados	Sistema	P	-	1	-	4,592,805
			P (a)	-	1	-	7,325,006
			A	-	-	-	-
1.07	Diseños de obras de agua potable y/o saneamiento elaborados	Diseño	P	-	4	-	736,974
			P (a)	-	4	-	736,960
			A	-	-	-	-
1.08	Cursos de capacitación técnica en plomería y albañilería	Curso	P	-	3	-	51,568
			P (a)	-	3	-	51,568
			A	-	-	-	-
1.09	Gerencia Integral del Programa (GIP)	Contrato	P	1	1	143,246	6,106,397
			P (a)	1	1	143,246	6,107,912
			A	1	-	145,859	145,859

Component Nbr. 2 Apoyo a la mejora de la gestión institucional

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2025	2021	EOP 2025
2.01	Sistema de gestión comercial del operador de Urumita mejorado	Sistema	P	-	1	-	204,312
			P (a)	-	1	-	204,312
			A	-	-	-	-
2.02	Unidad móvil de asistencia técnica para la empresa regional (departamental) adquirida	Und.	P	-	1	-	204,312
			P (a)	-	1	-	204,312
			A	-	-	-	-
2.03	Plan de Comunicación del Programa desarrollado e implementado	Plan	P	-	1	-	204,311
			P (a)	-	1	-	204,311
			A	-	-	-	-
2.04	Campañas con enfoque de género para la educación sanitaria, cultura de pago y uso eficiente del recurso desarrolladas e implementadas	campaña	P	-	3	-	306,468
			P (a)	-	3	-	306,468
			A	-	-	-	-
2.05	Kit de medición de calidad de agua para Corpo Guajira adquiridos	Kit	P	-	1	-	102,156
			P (a)	-	1	-	102,156
			A	-	-	-	-

Other Cost				
	Administración UCP	P	174,961	1,914,343.77
		P (a)	174,961	1,914,347.77
		A	125,483	125,483
	Evaluación	P		114,548
		P (a)		114,548
		A		0
	Auditorías	P	28,649	286,545
		P (a)	28,649	286,545
		A	13,773	13,773
	Comisión administración PSG (CO-G1017)	P	250,000	250,000
		P (a)	250,000	250,000
		A	250,000	250,000
Total Cost				
	Total Cost	P	596,856	64,822,625.77
		P (a)	596,856	64,822,625.77
		A	535,115	535,115

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	Aducción mejorada - El Molino	Create Milestone	N/A	JLALBA	3/22/2022
	Bypass para conducción de agua cruda construida - Distracción	Create Milestone	N/A	JLALBA	3/22/2022
	Captación mejorada	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	JLALBA	4/1/2022
	Captación mejorada - El Molino	Create Milestone	N/A	JLALBA	3/22/2022
	Captación mejorada - Villanueva	Create Milestone	N/A	JLALBA	3/22/2022
	Conexiones domiciliarias alcantarillado sanitario	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	JLALBA	4/1/2022
	Conexiones domiciliarias alcantarillado sanitario construidas y/o rehabilitadas - El Molino	Create Milestone	N/A	JLALBA	3/22/2022
	Conexiones domiciliarias alcantarillado sanitario construidas y/o rehabilitadas - Villanueva	Create Milestone	N/A	JLALBA	3/22/2022
	Conexiones domiciliarias construidas o rehabilitadas	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	JLALBA	4/1/2022
	Conexiones domiciliarias construidas y/o rehabilitadas - Distracción	Create Milestone	N/A	JLALBA	3/22/2022
	Conexiones domiciliarias construidas y/o rehabilitadas - El Molino	Create Milestone	N/A	JLALBA	3/22/2022
	Conexiones domiciliarias construidas y/o rehabilitadas - Villanueva	Create Milestone	N/A	JLALBA	3/22/2022
	Conexiones domiciliarias rehabilitadas	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	JLALBA	4/1/2022
					4/1/2022
	Derivaciones de la Línea de Pasoancho construidas - Distracción	Create Milestone	N/A	JLALBA	3/22/2022
	Desarenador ampliado - Villanueva	Create Milestone	N/A	JLALBA	3/22/2022
	Diseños de obras de agua potable y/o saneamiento elaborados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	3/14/2022
	Estaciones de macromedición construidas	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	JLALBA	4/1/2022
	Gerencia Integral del Programa (GIP)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	3/14/2022
	Líneas de acueducto construidas	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	JLALBA	4/1/2022
	Líneas de acueducto construidas o rehabilitadas	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	JLALBA	4/1/2022
	PTAP mejorada	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	JLALBA	4/1/2022
	PTAP mejorada - El Molino	Create Milestone	N/A	JLALBA	3/22/2022
	PTAP mejorada - Villanueva	Create Milestone	N/A	JLALBA	3/22/2022
	PTAR mejorada - El Molino	Create Milestone	N/A	JLALBA	3/22/2022
	PTAR mejorada - Villanueva	Create Milestone	N/A	JLALBA	3/22/2022
	Red de Conducción Metesusto - Fonseca y sistema de medición	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	JLALBA	4/1/2022
	Redes de alcantarillado pluvial construidas	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	JLALBA	4/1/2022
	Redes de alcantarillado pluvial construidas y/o rehabilitadas - El Molino	Create Milestone	N/A	JLALBA	3/22/2022
	Redes de alcantarillado pluvial construidas y/o rehabilitadas - Villanueva	Create Milestone	N/A	JLALBA	3/22/2022
	Redes de alcantarillado sanitario construidas	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	JLALBA	4/1/2022
	Redes de alcantarillado sanitario construidas y/o rehabilitadas - El Molino	Create Milestone	N/A	JLALBA	3/22/2022
	Redes de alcantarillado sanitario construidas y/o rehabilitadas - Villanueva	Create Milestone	N/A	JLALBA	3/22/2022
	Redes de distribución construidas o rehabilitadas	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	JLALBA	4/1/2022
	Redes de distribución construidas y/o rehabilitadas - Distracción	Create Milestone	N/A	JLALBA	3/22/2022
	Redes de distribución construidas y/o rehabilitadas - El Molino	Create Milestone	N/A	JLALBA	3/22/2022

Output	Redes de distribución construidas y/o rehabilitadas - Villanueva	Create Milestone	N/A	JLALBA	3/22/2022
	Redes de distribución rehabilitadas	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	JLALBA	4/1/2022
	Sistema automatizado de control de pérdidas para la línea de conducción	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	JLALBA	4/1/2022
	Sistema automatizado de control de pérdidas para la línea de conducción construido - Distracción	Create Milestone	N/A	JLALBA	3/22/2022
	Sistema de agua potable de Fonseca ampliado y mejorado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	3/14/2022
			Modify Output to measure progress using Milestones	CAMILOP	3/30/2022
	Sistema de agua potable de Riohacha mejorado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	3/14/2022
			Modify Output to measure progress using Milestones	CAMILOP	3/30/2022
	Sistema de agua potable de Urumita mejorado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	3/14/2022
			Modify Output to measure progress using Milestones	CAMILOP	3/30/2022
	Sistema de alcantarillado de Fonseca construido	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	3/14/2022
			Modify Output to measure progress using Milestones	CAMILOP	3/30/2022
	Sistema de manejo de lodos de la PTAP de Pasoancho construido - Distracción	Create Milestone	N/A	JLALBA	3/22/2022
	Sistemas de agua potable mejorado o ampliados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	3/22/2022
			Modify Output name	JLALBA	3/22/2022
			Modify Output to measure progress using Milestones	CAMILOP	3/30/2022
	Sistemas de alcantarillado mejorados o ampliados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	3/22/2022
			Modify Output to measure progress using Milestones	CAMILOP	3/30/2022
	Tanques de almacenamiento construidos	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	JLALBA	4/1/2022
	Tanques de almacenamiento construidos - Distracción	Create Milestone	N/A	JLALBA	3/22/2022
	Tanques de almacenamiento mejorados - El Molino	Create Milestone	N/A	JLALBA	3/22/2022
	Tanques de almacenamiento mejorados - Villanueva	Create Milestone	N/A	JLALBA	3/22/2022
	Tanques de almacenamiento rehabilitados	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	JLALBA	4/1/2022
	Tanques de almacenamiento rehabilitados y/o construidos	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	JLALBA	4/1/2022

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Inactive		Legal Environment
	Response Actions		
	2.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Legal aspects and public processes
Others - Fiduciary Dimensions
