


PMR Public Report

Operation Number	HA-L1103	Chief of Operations Validation Date	05/05/22
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	05/05/22
Last Update	05/05/22	Country Representative Validation Date	05/08/22
PMR Validation Stage	Validated by Representative		
Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Port-au-Prince Water and Sanitation Project III	Loan Number	4353/GR-HA
Executing Agency	DIRECTION NATIONALE DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT	Sector/Subsector	WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY URBAN
Team Leader	PEREZ MONFORTE, SERGIO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Grant Financing Product	Country	Haiti
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLIQUE D'HAITI		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	L'Unité d'Exécution du Projet de l'Agence d'Exécution (AE) continue la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du programme. Des consultations publiques additionnelles sont prévues pour les composantes du Programme qui vont se déroulées à Carrefour (Métropole de Port-au-Prince). Les projets en milieu semi ruraux et ruraux vont démarrer fin octobre 2021. Le contrat de la consultante internationale environnementale et sociale (E&S) est terminé et l'AE/DINEPA n'a pas encore recruté son remplaçant, pour l'instant il n'y a pas beaucoup de livrable à préparer, donc la spécialiste de l'équipe de l'AE continue seule comme responsable des aspects E&S. Des améliorations ont été apportées en ce qui concerne les consultations et la documentation. Pour les travaux achevés, Le PGES des travaux ont été correctement mis en œuvre en conformité avec leur contenu validé au préalable.		

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
HA-L1103	65,000,000	65,000,000	0	0	65,000,000	65,000,000	18,619,591.5	28.65%	46,380,408.5
Aggregated	65,000,000	65,000,000	0	0	65,000,000	65,000,000	18,619,591.5	28.65%	46,380,408.5
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

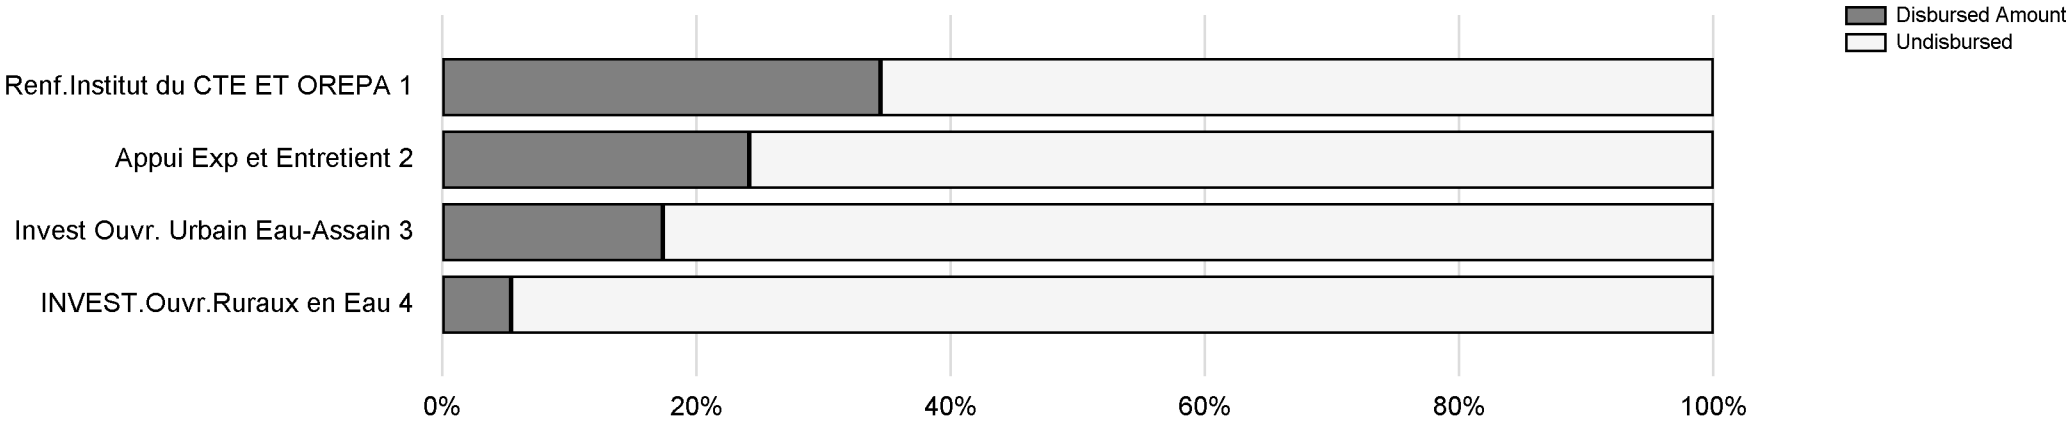

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX
General Development Objectives

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Résultat I : La DINEPA exerce une réglementation effective au niveau de la DINEPA centrale et la déconcentration au niveau de l'OREPA-Ouest.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
0.0	Nombre de CTEs de la DINEPA qui fonctionnent conformément au cadre institutionnel de régulation et de planification	CTE	0	2016	P	-	-	-	-	-	-	-	-
					A	-	-	9	27	-	-	-	10

Details

Means of Verification: Rapport annuel de la DINEPA

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
0.1	Nombre de structures de l'OREPA Ouest qui fonctionnent conformément au cadre institutionnel de regulation et de planification	Unité	0	2016	P	-	1	1	-	-	-	-	2
					A	-	1	1	1	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Rapport annuel de la DINEPA

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 1: Résultat II : Le CTE-RMPP améliore sa viabilité financière

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
1.1	Nombre de connexions domiciliaires et commerciales actives au CTE-RMPP	Connection active	46000	2016	P	46,000	48,250	54,740	61,640	68,200	-	-	68,200
					A	46,000	48,000	50,868	48,803	-	-	-	46,000

Details

Means of Verification: Rapport du CTE consolidé par la DINEPA

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
1.1	Production durable d'eau par le CTE-RMPP	m3/jour	103000	2016	P	103,000	159,000	169,000	183,000	183,000	-	-	183,000
					A	103,000	130,000	114,660	96,080	-	-	-	103,000

Details

Means of Verification: Rapport du CTE consolidé par la DINEPA

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
1.2	Indice de recouvrement du CTE-RMPP (% de paiement des factures)	%	54	2016	P	54	59	63	66	71	-	-	71
					A	54	51	46.74	40	-	-	-	54

Details

Means of Verification: Rapport du CTE consolidé par la DINEPA

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
1.3	Ratio d'exploitation du CTE-RMPP (ratio des revenus d'exploitation annuels contre dépenses d'exploitation annuelles	Ratio	0.67	2016	P	.67	.9	1.07	1.22	1.32	-	-	1.32
					A	.67	.8	.65	1.14	-	-	-	.67

Details

Means of Verification: Rapport du CTE consolidé par la DINEPA

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Résultat III : L'accès aux services d'eau et d'assainissement des ménages, la qualité du service des eaux et les pratiques d'hygiène se sont améliorés dans la RMPP

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
2.1	Pourcentage de foyer ayant accès à un service d'eau amélioré	%	44	2016	P	-	-	-	-	44	-	-	60
					A	-	-	-	-	-	-	-	60

Details

Means of Verification: Enquêtes aupres les foyers et inventaire des points d'eau

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
2.2	Nombre de foyers ayant acces a l'eau potable a domicile	Foyer	92000	2016	P	92,000	97,600	121,600	150,000	178,400	-	-	178,400
					A	92,000	96,000	83,868	50,034	-	-	-	92,000

Details

Means of Verification: Enquêtes aupres les foyers et inventaire des points d'eau

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
2.3	Pourcentage de ménages ayant accès à l'eau potable via un kiosque	%	4.5	2016	P	4.5	5	5.5	6	6	-	-	6
					A	4.5	5	6.7	5	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Enquêtes aupres les foyers et inventaire des points d’eau

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
2.4	Nombre d’heures par jour d’alimentation des ménages à partir d’une connexion du CTE-RMPP	Heure/Jour	3.3	2016	P	4	6	9	12	12	-	-	12
					A	3.3	5	-	10	-	-	-	3.3

Details

Means of Verification: Enquêtes aupres les foyers et inventaire des points d’eau

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
2.5	% de femmes qui travaillent dans des kiosques nouveaux ou réhabilités dans la zone de Carrefour et au Centre-Ville	%	13	2016	P	15	18	23	27	35	-	-	20
					A	13	14	18	35	-	-	-	13

Details

Means of Verification: Rapport du dép. Quartiers Défavorisés du CTE

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
2.6	% de ménages qui ont des installations pour le lavage des mains, y compris du savon	%	5	2016	P	5	15	30	25	20	-	-	20
					A	5	6	-	-	-	-	-	5

Details

Means of Verification: Enquêtes aupres les foyers et inventaire des points d’eau

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
2.7	% de femmes qui utilisent des serviettes hygiéniques pendant leur période de menstruation	%	75	2016	P	75	75	90	85	85	-	-	85
					A	75	75	-	-	-	-	-	75

Details

Means of Verification: Enquêtes aupres les foyers et inventaire des points d’eau

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 3: Résultat 4 : L'accès aux services d'eau et d'assainissement et à l'hygiène dans des zones rurales de l'OREPA-Ouest

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
3.1	Nombre de nouveaux foyers ayant accès à un service d'assainissement et de higiene amélioré	Foyer	0	2016	P	-	-	1,500	2,500	-	-	-	4,000
					A	-	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Enquêtes aupres les foyers et inventaire des points d’eau

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
3.1	Nombre de nouveaux foyers ayant accès à un service d'eau amélioré	Foyer	0	2016	P	-	500	3,500	4,000	-	-	-	8,000
					A	-	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Enquêtes aupres les foyers et inventaire des points d’eau

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Composante I : Renforcement institutionnel du CTE-RMPP et de la DINEPA

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
1.01	Contats par résultats signés (APP)	contract	P	-	1	3,200,000	9,000,000
			P (a)	1	1	100,000	5,283,894
			A	-	-	-	29,823
1.02	OREPA NORD dotée de matériel et de personnel pour acquérir l'élégibilité du projet HA-L1135	unité	P	-	1	-	125,000
			P (a)	-	1	-	70,365.24
			A	-	1	-	70,365.24
1.03	Contrats de consultations d'appui à la DINEPA pour la regulation et le suivi des APP signés	Contrat	P	-	2	52,500	175,000
			P (a)	1	2	25,000	175,000
			A	-	1	-	-
1.04	Campagnes de communication et de marketing dans les zones urbaines du projet pour améliorer la connectivité au réseau d'eau potable, l'access a l'assainissement et l'hygiène , executées	Campagne	P	1	2	240,000	510,000
			P (a)	1	1	90,000	68,233.49
			A	1	2	13,233	13,233
1.05	OREPA Ouest dotée de bâtiment et materiel roulant	unité	P	-	3	60,595.6	711,595.6
			P (a)	1	4	423,000	811,595.23
			A	1	5	427,987	607,705.23
1.06	Contrats d'appui à l'OREPA Ouest pour la supervision technique et APD travaux ruraux	unité	P	-	3	130,000	400,000
			P (a)	1	3	50,000	240,000
			A	1	1	-	-
1.07	La DINEPA et l'OREPA Ouest et ses esctructures dotées du materiel et de personel	unité	P	2	8	300,000	1,300,000
			P (a)	8	14	1,200,000	3,094,759.44
			A	2	12	1,176,574	2,144,759.44

Component Nbr. 2 Composante II : Appui au fonctionnement du CTE-RMPP et à l'entretien

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
2.01	Accords de subvention au CTE pour la facture de l’EdH singés	Accord	P	-	1	250,000	950,000
			P (a)	1	3	400,000	1,717,995.43
			A	1	2	468,755	1,117,995.43
2.02	Contrat d'approvisionnement en combustible signé	Contrat	P	-	1	250,000	750,000
			P (a)	1	3	50,000	1,425,732.53
			A	1	2	694,270	725,732.53
2.03	CTE-RMPP doté du personel	unité	P	1	4	100,000	400,000
			P (a)	1	4	20,000	600,000
			A	2	3	300,000	300,000
2.04	Agences du CTE-RMPP dotées de materiel et du personel	Agences	P	-	3	60,000	250,000
			P (a)	2	6	60,000	800,000
			A	5	5	400,000	400,000
2.05	Travaux d'amélioration du service réalisés par le CTE	unité	P	2	4	325,000	750,000
			P (a)	2	5	325,000	1,137,278
			A	3	3	537,278	537,278

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
3.01	Conduites structurantes et de refoulement installées	ml	P	8,000	17,000	3,865,000	12,500,000
			P (a)	4,000	19,126	3,865,000	12,500,000.09
			A	5,252	5,252	1,998,671	3,000,457.09
3.02	Réservoirs réhabilités ou construits	Réservoir	P	2	3	1,322,075.7	3,115,252.15
			P (a)	0.5	2	400,000	3,115,252.38
			A	0.5	1	847,603.83	2,072,124.38
3.03	Conduites de distribution installées	ml	P	5,000	9,500	3,535,000	10,100,000
			P (a)	5,000	10,541	3,983,827.64	10,900,000
			A	6,480	6,480	1,472,546	1,472,546
3.04	Mini réseau (30 ménages/mini réseau) condominaux installés	unité	P	140	400	2,525,000	7,150,000
			P (a)	4	400	100,000	7,150,000
			A	-	-	-	-
3.05	Connexions installés au niveau des ménages	Connexion	P	11,000	31,500	1,750,000	4,020,000
			P (a)	8,000	31,500	1,800,000	4,020,000
			A	-	-	-	-
3.06	Armoires électriques et d'automatismes rehaibilités	unité	P	2	2	220,000	220,000
			P (a)	2	2	220,000	220,000
			A	-	-	-	-
3.07	Kiosques construits ou réhaibilités	Kiosque	P	30	55	310,000	560,000
			P (a)	15	55	310,000	560,000
			A	-	-	-	-
3.08	Contrats d'assistance technique, sociale et opérationnelle pour l'amélioration de la desserte en eau dans les quartiers défavorisés de la RMPP signés	Contrat	P	-	5	460,000	1,219,600
			P (a)	2	8	425,000	1,219,600.76
			A	3	6	74,019	93,412.76
3.09	Contrat de supervision des grands travaux signé	Contrat	P	-	1	400,000	1,088,235
			P (a)	2	14	400,000	1,088,235.67
			A	5	9	199,716	257,360.67
3.10	Bâtiment du CTE de Ouanaminthe construit	unité	P	-	1	-	250,000
			P (a)	-	1	25,000	167,068.67
			A	-	1	38,609	180,677.67
3.11	Études pour réalisation de petits travaux d'amélioration des SAEF réalisées	unité	P	-	3	-	300,000
			P (a)	-	1	25,000	315,156.61
			A	-	1	-	15,156.61
3.12	Campagne de communication et de marketing pour améliorer l'hygiène menstruelle réalisée	Campagne	P	-	1	65,000	100,000
			P (a)	1	1	65,000	100,000
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 4 Composante IV : Investissements dans les domaines de l'eau, assainissement et hygiène dans des zones rurales de l'OREPA OUEST

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
4.01	Outil de planification rural developé	unité	P	1	1	50,000	100,000
			P (a)	1	1	30,000	100,000
			A	-	-	-	-
4.02	Campagnes d'assainissement et d'hygiène réalisées dans 8 Sections communales de l'OREPA Ouest réalisées	Campagne	P	4	8	236,765	511,765
			P (a)	4	8	236,765	511,765
			A	-	-	-	-
4.03	Réseau d'eau potable construites ou rehabilitées	unité	P	2	4	230,000	350,000
			P (a)	2	4	230,000	350,000
			A	-	-	-	-
4.04	Points d'eau construites ou rehabilités	unité	P	10	24	2,175,000	4,450,000
			P (a)	6	24	652,500	4,450,000
			A	4	4	78,665	78,665

Component Nbr. 5 Composante V : Administration du Projet

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
5.01	Formations et échanges avec opérateurs régionaux réalisées	unité	P	1	4	75,000	211,500.65
			P (a)	2	4	15,000	211,501
			A	1	2	9,514	71,260
5.02	Unité d’exécution dotée du personnel	unité	P	1	4	529,000	1,952,051.6
			P (a)	1	4	529,000	2,093,738.47
			A	1	3	813,617	1,253,738.47
5.03	Unité d'exécution dotée du materiel	unité	P	1	4	75,000	530,000
			P (a)	1	4	200,000	530,000.65
			A	1	3	177,372	365,895.65
5.04	Audits et supervisions réalisés	unité	P	1	4	280,000	950,000
			P (a)	2	4	110,000	255,827.34
			A	1	2	62,172	145,827.34

Component Nbr. 6 Composante VI : Mise en œuvre de mesures d'atténuation de la pandémie Covid 19

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
6.01	Points de lavage des mains (PLM) dans les sites critiques, construits et opérés	Nombre PLM	P	-	-	-	-
			P (a)	-	400	-	367,000
			A	-	1,000	-	1,146,375
6.02	Campagnes de divulgation concernant les mesures d'hygiène mises en œuvre	Campagnes	P	-	-	-	-
			P (a)	-	1	-	150,000
			A	-	1	6,804	102,453

Total Cost				
	Total Cost	P	23,070,936.3	65,000,000
		P (a)	16,365,092.64	65,800,000
		A	9,797,405.83	16,202,841.51

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	Accords de subvention au CTE pour la facture de l’EdH singés	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ELODIEC	3/27/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ELODIEC	3/25/2022
	Agences du CTE-RMPP dotées de materiel et du personel	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ELODIEC	3/25/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ELODIEC	3/25/2022
	Audits et supervisions réalisés	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ELODIEC	3/25/2022
	Campagnes de communication et de marketing dans les zones urbaines du projet pour améliorer la connectivité au réseau d'eau potable, l'access a l'assainissement et l'hygiène , executées	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ELODIEC	3/27/2022
	Conduites de distribution installées	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SPEREZ	5/5/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	SPEREZ	5/5/2022
	Conduites structurantes et de refoulement installées	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ELODIEC	3/25/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	SPEREZ	5/5/2022
	Connexions installés au niveau des ménages	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ELODIEC	3/25/2022
	Contats par résultats signés (APP)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ELODIEC	3/27/2022
	Contrat d'approvisionnement en combustible signé	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ELODIEC	3/25/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ELODIEC	3/25/2022
	Contrat de supervision des grands travaux signé	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ELODIEC	3/25/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ELODIEC	3/25/2022
	Contrats d'appui à l'OREPA Ouest pour la supervision technique et APD travaux ruraux	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ELODIEC	3/25/2022
	Contrats d'assistance technique, sociale et opérationnelle pour l'amélioration de la desserte en eau dans les quartiers dévaforisés de la RMPP signés	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ELODIEC	3/25/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ELODIEC	3/25/2022
	CTE-RMPP doté du personel	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ELODIEC	3/25/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ELODIEC	3/25/2022
	Études pour réalisation de petits travaux d'amélioration des SAEP réalisées	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ELODIEC	3/25/2022
	Formations et échanges avec opérateurs régionaux réalisées	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ELODIEC	3/25/2022
	Kiosques construits ou réhabilités	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ELODIEC	3/25/2022
	La DINEPA et l'OREPA Ouest et ses esctructures dotées du materiel et de personel	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ELODIEC	3/25/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ELODIEC	3/25/2022
	Mini réseau (30 ménages/mini réseau) condominaux installés	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ELODIEC	3/25/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ELODIEC	3/25/2022
	OREPA Ouest dotée de bâtiment et materiel roulant	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ELODIEC	3/25/2022

Output	Points d'eau construites ou rehabilités	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ELODIEC	3/25/2022
	Réservoirs réhabilités ou construits	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ELODIEC	3/25/2022
	Travaux d'amélioration du service réalisés par le CTE	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ELODIEC	3/25/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ELODIEC	3/25/2022
	Unité d'exécution dotée du personnel	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ELODIEC	3/25/2022
	Unité d'exécution dotée du materiel	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ELODIEC	3/25/2022

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
2	Active		Institutional Environment		
	Response Actions				
	2.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	
	2.2	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		COMPLETE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
4	Inactive		Institutional Environment		
	Response Actions				
	4.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		COMPLETE	
	4.2	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		INACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Inactive		Institutional Environment
	Response Actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Inactive		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	8.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE
	8.2	Management Strategy	Status
		ACCEPT	INACTIVE
	8.3	Management Strategy	Status
		AVOID	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
10	Active		Political Environment
	Response Actions		
	10.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	10.2	Management Strategy	Status
		AVOID	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
11	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	11.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Bidding Stage
Stakeholder Priorities
