

PMR Operational Report

Operation Number	EC-L1160	Chief of Operations Validation Date	03/31/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/12/17
Last Update	03/24/17	Country Representative Validation Date	04/18/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Investment Plan to Support the Transition of the Energy Matrix in Ecuador	Loan Number	3710/OC-EC, 3711/KI-EC
Executing Agency	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE	Sector/Subsector	EN-REH - ENERGY-ENERGY SECTOR REHABILITATION AND EFFICIENCY
Team Leader	TEJEDA RICARDEZ,JESUS ALBERTO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	ECUADOR
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE ECUADOR		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
EC-L1160	143,000,000	143,000,000	17,090,000	0	160,090,000	143,000,000	96,020,500	67.15%	46,979,500
Aggregated	143,000,000	143,000,000	17,090,000	0	160,090,000	143,000,000	96,020,500	67.15%	46,979,500

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

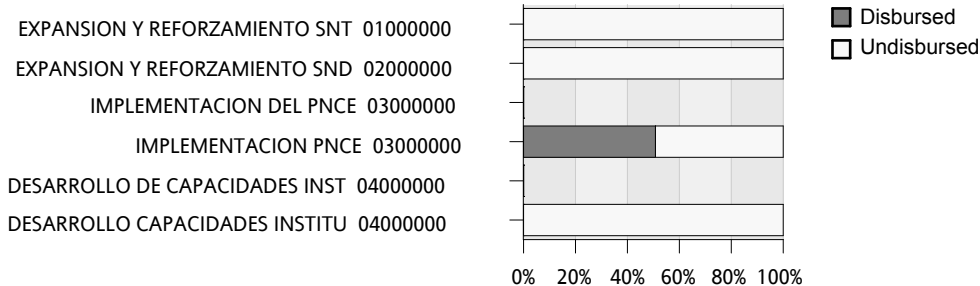

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Apoyar el avance del CME, mejorar los indicadores del sector y apoyar los planes de recuperación en las zonas afectadas por el sismo.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
0.0	Mejoramiento de la calidad del servicio en el SNT (disminución de la ENS por fallas y mantenimiento)	MWh/año	233662.0	2015	P		10,343.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Reporte de avance del Programa

Observations: CELEC EP-TRANSELECTRIC

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
0.1	Volúmen promedio anua de intercambios regionales de energía (Ecuador-Colombia-Perú)	GWh/año	496.0	2015	P		867.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Reporte de avance del Programa

Observations: CELEC EP-TRANSELECTRIC

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
0.2	Mejora de la continuidad del servicio de distribución eléctrica-Disminución de la ENS	MWh/año	15421.0	2015	P		14,650.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Reporte de avance del Programa

Observations: MEER

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
0.3	Mitigación cambio climático-Emissiones de CO2	kTonCO2	169.81	2015	P		30.25

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

0.3	anuales disminuídas por desplazamiento de GLP por electricidad (kt CO2 eq/año)	eq/año	169.81	2015	P(a)		
					A		
Details							
Means of verification: Reporte de avance del Programa							
Observations: MEER							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
0.4	Volúmen de GLP desplazado por el PNCE	BEP	434543.0	2015	P		82,559.00
					P(a)		
					A		
Details							
Means of verification: Reporte de avance del Programa							
Observations: MEER							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Componente I.Expansión y Reforzamiento del SNT

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2020
0.0	km de líneas de transmisión en 230kV incrementados	km	2166.4	2015	P	2,166.40	2,248.40
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Reporte de avance del Programa

Observations: MEER

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2020
0.1	Capacidad de transformación nueva instalada en el SNT	MVA	9343.0	2015	P	9,343.00	9,568.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Reporte de avance del Programa

Observations: MEER

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 1: Componente I.Expansión y Reforzamiento del SND

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2020
1.0	FMIk: Frecuencia media en interrupciones por KVA	veces/año	8.27	2015	P	7.01	7.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Reporte de avance del Programa

Observations: MEER

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of	Baseline	Baseline		2018	EOP 2020
-----------	---------	----------	----------	--	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

		Measure		Year			
1.1	TTIk: Tiempo total de interrupciones (horas)	horas/año	7.17	2015	P	6.85	6.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Reporte de avance del Programa

Observations: MEER

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2020
1.2	Viviendas sin servicio eléctrico y viviendas con servicio eléctrico mejorado, atendidas por el programa	número	0.0	2015	P	15,183.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Reporte de avance del Programa

Observations: MEER

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2020
1.3	Clientes afroecuatorianos e indígenas beneficiados por el programa	número	0.0	2015	P	8,718.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Reporte de avance del Programa

Observations: MEER

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 2: Componente III. Implementación del PNCE

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2020
2.0	Número de Cocinas Eléctricas de Inducción vendidas con el Fondo de Cocción Eficiente	número	270000.0	2015	P	348,746.00
					P(a)	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.0	Número de Cocinas Eléctricas de Inducción vendidas con el Fondo de Cocción Eficiente	número	270000.0	2015	A		
Details							
Means of verification: Reporte de avance del Programa							
Observations: MEER							
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No

Outcome Nbr. 3: Componente IV.Desarrollo de Capacidades Institucionales

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2020
3.0	Instituciones fortalecidas en integración energética regional	número de instituciones	0.0	2015	P	1.00
					P(a)	2.00
					A	

Details							
Means of verification: Reporte de avance del Programa							
Observations: MEER							
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2020
3.1	Empresas Eléctricas e instituciones capacitadas en gestión y monitoreo LOSPEE	número de entidades	0.0	2015	P	16.00
					P(a)	21.00
					A	

Details							
Means of verification: Reporte de avance del Programa							
Observations: MEER							
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2020
3.2	Mujeres capacitadas con el Programa	número de mujeres	0.0	2015	P	15.00
					P(a)	20.00
					A	

Details							
---------	--	--	--	--	--	--	--

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Reporte de avance del Programa

Observations: MEER

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I.Expansión y Reforzamiento del SNT

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
1.1	Construcción L/T Milagro-Babahoyo 230kV, 47km, doble circuito, 1200 ACAR	%	P	5	100		15,505,157
			P(a)	5	100		15,505,157
			A	5	5	0	0
1.2	S/E Milagro 138kV, ampliación	%	P	5	100		1,018,727.98
			P(a)	5	100		1,018,727.98
			A	5	5	0	0
1.3	S/E Babahoyo 138kV y 69kV, ampliación	%	P	5	100		3,525,224.84
			P(a)	5	100		3,525,224.84
			A	5	5	0	0
1.4	S/E Quevedo, ampliación 1 Bahía Línea 230kV	%	P	5	100		1,353,724.27
			P(a)	5	100		1,353,724.27
			A	5	5	0	0
1.5	S/E San Gregorio, ampliación patio 230kV, conexión Quevedo y San Juan de Manta	%	P	5	100		4,694,706.64
			P(a)	5	100		4,694,706.64
			A	5	5	0	0
1.6	Construcción L/T San Gregorio-San Juan de Manta 230kV, 35km, doble circuito 1200 ACAR (montaje de los dos circuitos)	%	P	5	100		14,677,022.83
			P(a)	5	100		14,677,022.83
			A	5	5	0	0
1.7	Construcción S/E San Juan de Manta 230/69kV, 225MVA	%	P	5	100		19,645,436.44
			P(a)	5	100		19,645,436.44
			A	5	5	0	0

Component Nbr. 2 Componente II.Expansión y Reforzamiento del SND

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
2.1	Proyectos de subtransmisión, fiscalizados y energizados	número de proyectos	P	0	6		4,299,066.13
			P(a)	0	6		4,299,066.14
			A	0	0	0	0
2.2	Proyectos de Distribución, fiscalizados y energizados	número de proyectos	P	0	47		6,461,933.87
			P(a)	0	47		6,461,933.88
			A	0	0	0	0
2.3	Proyectos de automatización de subestaciones fiscalizados y energizados	número de proyectos	P	0	11		720,000
			P(a)	0	11		720,000
			A	0	0	0	0
2.4	Proyectos de automatización de alimentadores fiscalizados y energizados	número de proyectos	P	0	40		5,472,000
			P(a)	0	40		5,472,000
			A	0	0	0	0
2.5	Proyectos de electrificación rural con extensión de red, fiscalizados y energizados	número de proyectos	P	0	389		26,375,000
			P(a)	0	389		26,375,000
			A	0	0	0	0
2.6	Proyectos de electrificación rural sin extensión de red, fiscalizados y energizados	número de proyectos	P	0	7		1,132,000
			P(a)	0	7		1,132,000
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente III. Implementación del Plan Nacional de Cocción Eficiente

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
3.1	Cocinas de inducción eléctricas financiadas con este programa	unidades vendidas	P	78,496	78,746	50,017,914.44	50,050,000
			P(a)	78,496	78,746	50,017,914.44	50,050,000
			A	78,400	78,400	49,846,625.65	49,846,625.65
3.2	Circuitos expresos instalados	número de circuitos	P	75,462	75,462	3,269,000	3,269,000
			P(a)	75,462	75,462	3,269,000	3,269,013.84
			A	75,462	75,462	3,269,013.84	3,269,013.84

Component Nbr. 4 Componente IV. Desarrollo de Capacidades Institucionales

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
4.1	Estudios para el apoyo al fortalecimiento institucional en el sector eléctrico en base a LOSPEE y para la integración eléctrica regional, realizados	número de estudios	P	0	8		829,000
			P(a)	0	8		829,000
			A	0	0	0	0
4.2	Taller de capacitación para el fortalecimiento de capacidades en gestión y monitoreo (empresas e instituciones) según lineamientos de la LOSPEE, realizados	número de talleres	P	0	25		57,000
			P(a)	0	25		57,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Auditorías externas	P				151,000
		P(a)				151,000
		A			0	0
	Evaluación intermedia y final	P				103,000
		P(a)				103,000
		A			0	0
	Monitoreo y seguimiento	P				151,000
		P(a)				151,000
		A			0	0
	Unidad de Gestión	P			24,000	600,000
		P(a)			24,000	600,000
		A			31,123.05	31,123.05

Total Cost

	Total Cost	P			53,310,914.44	160,090,000
		P(a)			53,310,914.44	160,090,013.86
		A			53,146,762.54	53,146,762.54

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Cocinas de inducción eléctricas financiadas con este programa	Modify Output	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/24/2017	12/14/2016
Output	S/E Babahoyo 138kV y 69kV, ampliación	Modify Output	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/24/2017	12/14/2016
Output	Taller de capacitación para el fortalecimiento de capacidades en gestión y monitoreo (empresas e instituciones) según lineamientos de la LOSPEE, realizados	Modify Output	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/24/2017	12/14/2016
Outcome	FMIk: Frecuencia media en interrupciones por KVA	Modify Outcome Indicator	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/15/2017	12/14/2016
Output	Proyectos de automatización de alimentadores fiscalizados y energizados	Modify Output	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/24/2017	12/14/2016
Output	Construcción S/E San Juan de Manta 230/69kV, 225MVA	Modify Output	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/24/2017	12/14/2016
Output	S/E Babahoyo 138kV y 69kV, ampliación	Modify Output	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/24/2017	12/14/2016
Output	S/E Milagro 138kV, ampliación	Modify Output	CAMBIOS EN LA MATRIZ INICIAL DE ACUERDO A LA AYUDA MEMORIA DEL TALLER DE ARRANQUE EZSHARE-1104385956-2	03/13/2017	03/13/2017
Output	Taller de capacitación para el fortalecimiento de capacidades en gestión y monitoreo (empresas e instituciones) según lineamientos de la LOSPEE, realizados	Modify Output	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/24/2017	12/14/2016
Outcome	Instituciones fortalecidas en integración energética regional	Modify Outcome Indicator	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/15/2017	12/14/2016
Output	Proyectos de automatización de subestaciones fiscalizados y energizados	Modify Output	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/24/2017	12/14/2016
Output	Construcción L/T Milagro-Babahoyo 230kV, 47km, doble circuito, 1200 ACAR	Modify Output	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/24/2017	12/14/2016
Output	Circuitos expresos instalados	Modify Output	CAMBIOS EN LA MATRIZ INICIAL DE ACUERDO A LA AYUDA MEMORIA DEL TALLER DE ARRANQUE EZSHARE-1104385956-2	03/13/2017	03/13/2017
Outcome	Mujeres capacitadas con el Programa	Modify Outcome Indicator	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/15/2017	12/14/2016
Output	Proyectos de electrificación rural sin extensión de red, fiscalizados y energizados	Modify Output	CAMBIOS EN LA MATRIZ INICIAL DE ACUERDO A LA AYUDA MEMORIA DEL TALLER DE ARRANQUE EZSHARE-1104385956-2	03/13/2017	03/13/2017
Output	Proyectos de electrificación rural con extensión de red, fiscalizados y energizados	Modify Output	CAMBIOS EN LA MATRIZ INICIAL DE ACUERDO A LA AYUDA MEMORIA DEL TALLER DE ARRANQUE EZSHARE-1104385956-2	03/13/2017	03/13/2017
Output	Construcción L/T Milagro-Babahoyo 230kV, 47km, doble circuito, 1200 ACAR	Modify Output	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/24/2017	12/14/2016
Output	Estudios para el apoyo al fortalecimiento institucional en el sector eléctrico en base a LOSPEE y para la integración eléctrica regional, realizados	Modify Output	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/24/2017	12/14/2016
Outcome	km de líneas de transmisión en 230kV incrementados	Modify Outcome Indicator	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/15/2017	12/14/2016

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Construcción L/T San Gregorio-San Juan de Manta 230kV, 35km, doble circuito 1200 ACAR (montaje de los dos circuitos)	Modify Output	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/24/2017	12/14/2016
Output	Construcción S/E San Juan de Manta 230/69kV, 225MVA	Modify Output	CAMBIOS EN LA MATRIZ INICIAL DE ACUERDO A LA AYUDA MEMORIA DEL TALLER DE ARRANQUE EZSHARE-1104385956-2	03/13/2017	03/13/2017
Output	S/E Milagro 138kV, ampliación	Modify Output	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/24/2017	12/14/2016
Output	Proyectos de automatización de alimentadores fiscalizados y energizados	Modify Output	CAMBIOS EN LA MATRIZ INICIAL DE ACUERDO A LA AYUDA MEMORIA DEL TALLER DE ARRANQUE EZSHARE-1104385956-2	03/13/2017	03/13/2017
Output	S/E Quevedo, ampliación 1 Bahía Línea 230kV	Modify Output	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/24/2017	12/14/2016
Output	Proyectos de electrificación rural con extensión de red, fiscalizados y energizados	Modify Output	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/24/2017	12/14/2016
Output	Proyectos de Distribución, fiscalizados y energizados	Modify Output	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/24/2017	12/14/2016
Output	Estudios para el apoyo al fortalecimiento institucional en el sector eléctrico en base a LOSPEE y para la integración eléctrica regional, realizados	Modify Output	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/24/2017	12/14/2016
Output	Cocinas de inducción eléctricas financiadas con este programa	Modify Output	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/24/2017	12/14/2016
Output	Proyectos de electrificación rural sin extensión de red, fiscalizados y energizados	Modify Output	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/24/2017	12/14/2016
Output	Proyectos de automatización de subestaciones fiscalizados y energizados	Modify Output	CAMBIOS EN LA MATRIZ INICIAL DE ACUERDO A LA AYUDA MEMORIA DEL TALLER DE ARRANQUE EZSHARE-1104385956-2	03/13/2017	03/13/2017
Outcome	Capacidad de transformación nueva instalada en el SNT	Modify Outcome Indicator	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/15/2017	12/14/2016
Output	Proyectos de subtransmisión, fiscalizados y energizados	Modify Output	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/24/2017	12/14/2016
Impact	Volúmen de GLP desplazado por el PNCE	Modify Impact Indicator	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/15/2017	12/14/2016
Output	Cocinas de inducción eléctricas financiadas con este programa	Modify Output	CAMBIOS EN LA MATRIZ INICIAL DE ACUERDO A LA AYUDA MEMORIA DEL TALLER DE ARRANQUE EZSHARE-1104385956-2	03/13/2017	03/13/2017
Outcome	Viviendas sin servicio eléctrico y viviendas con servicio eléctrico mejorado, atendidas por el programa	Modify Outcome Indicator	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/15/2017	12/14/2016
Output	Proyectos de electrificación rural con extensión de red, fiscalizados y energizados	Modify Output	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/24/2017	12/14/2016
Output	Construcción L/T Milagro-Babahoyo 230kV, 47km, doble circuito, 1200 ACAR	Modify Output	CAMBIOS EN LA MATRIZ INICIAL DE ACUERDO A LA AYUDA MEMORIA DEL TALLER DE ARRANQUE EZSHARE-1104385956-2	03/13/2017	03/13/2017
Output	Circuitos expresos instalados	Modify Output	Ajuste realizado por error en carga de plan inicial, el registro se corrigió utilizando como respaldo el documento de memoria de taller de arranque de la operación que presenta fecha: 14 de diciembre de 2016 (la fecha del ayuda memoria es previa a los 60 días posteriores a la elegibilidad) CAMBIOS EN LA MATRIZ INICIAL DE ACUERDO A LA AYUDA MEMORIA DEL TALLER DE ARRANQUE	03/10/2017	03/13/2017

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
			EZSHARE-1104385956-2		
Outcome	Clientes afroecuatorianos e indígenas beneficiados por el programa	Modify Outcome Indicator	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/15/2017	12/14/2016
Output	Proyectos de Distribución, fiscalizados y energizados	Modify Output	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/24/2017	12/14/2016
Output	S/E Quevedo, ampliación 1 Bahía Línea 230kV	Modify Output	CAMBIOS EN LA MATRIZ INICIAL DE ACUERDO A LA AYUDA MEMORIA DEL TALLER DE ARRANQUE EZSHARE-1104385956-2	03/13/2017	03/13/2017
Output	Proyectos de subtransmisión, fiscalizados y energizados	Modify Output	CAMBIOS EN LA MATRIZ INICIAL DE ACUERDO A LA AYUDA MEMORIA DEL TALLER DE ARRANQUE EZSHARE-1104385956-2	03/13/2017	03/13/2017
Output	Construcción L/T San Gregorio-San Juan de Manta 230kV, 35km, doble circuito 1200 ACAR (montaje de los dos circuitos)	Modify Output	CAMBIOS EN LA MATRIZ INICIAL DE ACUERDO A LA AYUDA MEMORIA DEL TALLER DE ARRANQUE EZSHARE-1104385956-2	03/13/2017	03/13/2017
Output	S/E Milagro 138kV, ampliación	Modify Output	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/24/2017	12/14/2016
Output	Construcción S/E San Juan de Manta 230/69kV, 225MVA	Modify Output	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/24/2017	12/14/2016
Output	Circuitos expresos instalados	Modify Output	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/24/2017	12/14/2016
Impact	Mitigación cambio climático-Emissiones de CO2 anuales disminuidas por desplazamiento de GLP por electricidad (kt CO2 eq/año)	Modify Impact Indicator	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/15/2017	12/14/2016
Output	Proyectos de Distribución, fiscalizados y energizados	Modify Output	CAMBIOS EN LA MATRIZ INICIAL DE ACUERDO A LA AYUDA MEMORIA DEL TALLER DE ARRANQUE EZSHARE-1104385956-2	03/13/2017	03/13/2017
Output	Proyectos de automatización de subestaciones fiscalizados y energizados	Modify Output	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/24/2017	12/14/2016
Output	Circuitos expresos instalados	Modify Output	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/24/2017	12/14/2016
Outcome	Empresas Eléctricas e instituciones capacitadas en gestión y monitoreo LOSPEE	Modify Outcome Indicator	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/15/2017	12/14/2016
Output	Construcción L/T Milagro-Babahoyo 230kV, 47km, doble circuito, 1200 ACAR	Modify Output	CAMBIOS EN LA MATRIZ INICIAL DE ACUERDO A LA AYUDA MEMORIA DEL TALLER DE ARRANQUE EZSHARE-1104385956-2	03/13/2017	03/13/2017
Output	S/E Babahoyo 138kV y 69kV, ampliación	Modify Output	CAMBIOS EN LA MATRIZ INICIAL DE ACUERDO A LA AYUDA MEMORIA DEL TALLER DE ARRANQUE EZSHARE-1104385956-2	03/13/2017	03/13/2017
Outcome	Número de Cocinas Eléctricas de Inducción vendidas con el Fondo de Cocción Eficiente	Modify Outcome Indicator	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/15/2017	12/14/2016
Output	Taller de capacitación para el fortalecimiento de capacidades en gestión y monitoreo (empresas e instituciones) según lineamientos de la LOSPEE, realizados	Modify Output	CAMBIOS EN LA MATRIZ INICIAL DE ACUERDO A LA AYUDA MEMORIA DEL TALLER DE ARRANQUE EZSHARE-1104385956-2	03/13/2017	03/13/2017
Output	S/E San Gregorio, ampliación patio 230kV, conexión Quevedo y San Juan de Manta	Modify Output	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/24/2017	12/14/2016
Output	S/E San Gregorio, ampliación patio 230kV, conexión	Modify	CAMBIOS EN LA MATRIZ INICIAL DE ACUERDO A LA AYUDA MEMORIA DEL TALLER DE ARRANQUE	03/13/2017	03/13/2017

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
	Quevedo y San Juan de Manta	Output	EZSHARE-1104385956-2		
Outcome	TTIk: Tiempo total de interrupciones (horas)	Modify Outcome Indicator	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/15/2017	12/14/2016
Output	Construcción L/T San Gregorio-San Juan de Manta 230kV, 35km, doble circuito 1200 ACAR (montaje de los dos circuitos)	Modify Output	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/24/2017	12/14/2016
Output	Estudios para el apoyo al fortalecimiento institucional en el sector eléctrico en base a LOSPEE y para la integración eléctrica regional, realizados	Modify Output	CAMBIOS EN LA MATRIZ INICIAL DE ACUERDO A LA AYUDA MEMORIA DEL TALLER DE ARRANQUE EZSHARE-1104385956-2	03/13/2017	03/13/2017
Output	Proyectos de subtransmisión, fiscalizados y energizados	Modify Output	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/24/2017	12/14/2016
Output	S/E San Gregorio, ampliación patio 230kV, conexión Quevedo y San Juan de Manta	Modify Output	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/24/2017	12/14/2016
Output	Proyectos de electrificación rural sin extensión de red, fiscalizados y energizados	Modify Output	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/24/2017	12/14/2016
Output	S/E Quevedo, ampliación 1 Bahía Línea 230kV	Modify Output	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/24/2017	12/14/2016
Output	Proyectos de automatización de alimentadores fiscalizados y energizados	Modify Output	Incorporación de Medio de Verificación según la Ayuda Memoria del Taller de Arranque de la operación.	03/24/2017	12/14/2016
